

**제2차 원주시 기후위기 적응대책
(2019~2023)**

**이행 점검 보고서
(제 5 차 , 2023년 도)**

제출일: 2024년 4월 30일




제2차 원주시 기후위기 적응대책
세부시행계획(2019~2023)

이행점검보고서
(5차, 2023년도)

목 차

제1장 이행점검 개요	1
1. 점검 배경 및 목적.....	3
2. 점검체계 및 방법.....	5
1) 이행점검 체계.....	5
2) 이행점검 방법.....	8
3. 추진경위.....	11
4. 점검대상.....	12
제2장 이행점검 결과	17
1. 총 평.....	19
2. 세부 점검결과 종합.....	20
1) 부문별 추진실적 점검결과.....	20
2) 이행점검 종합점수 결과.....	26
3) 세부이행과제별 점검등급.....	26
4) 미추진 사업.....	27
4) 당초 변경 및 신규 추가사업.....	27
3. 주요성과.....	29
1) 지역 리스크 및 재해 저감 노력.....	30
2) 지자체 선정 우수사례.....	32
4. 적응대책 추진기반 조성 및 이행력 제고.....	35
1) 조례 재정을 통한 제도적 기반 마련.....	35
2) 위원회 및 탄소중립지원센터 운영.....	39
3) 지역전문가·주민참여단 구성운영실적.....	42
4) 우수사례.....	43
제3장 조치 및 관리계획	45
1. 미흡 및 미추진 과제 등에 대한 전년도 조치결과.....	47
2. 미흡 및 미추진 과제 등에 대한 당해연도 조치계획.....	49

제4장 차년도 시행계획	51
1. 변경 주요내용.....	53
2. 차년도 변경 과제 목록.....	54
부 록	55
1. 제2차 기후위기적응대책 세부사업 목록.....	57
2. 부문별 세부사업 점검 결과.....	59



표목차

<표 1.1> 종합등급(기초지자체 점검등급)	8
<표 1.2> 이행점검 항목, 배점 및 내용	9
<표 1.3> 세부배점 적용기준	9
<표 1.4> 제2차 기후위기 적응대책 부문별 예산 및 사업 개수	12
<표 1.5> 제2차 기후변화적응대책 이행점검 세부사업 목록	13
<표 2.1> 부문별 추진실적 점검결과	21
<표 2.2> 부문별 세부이행과제 추진현황	21
<표 2.3> [건강 부문] 성과목표 달성결과	22
<표 2.4> [농업 부문] 성과목표 달성결과	23
<표 2.5> [물관리 부문] 성과목표 달성결과	24
<표 2.6> [재난/재해 부문] 성과목표 달성결과	24
<표 2.7> [산림/생태계 부문] 성과목표 달성결과	25
<표 2.8> [적응인프라 부문] 성과목표 달성결과	25
<표 2.9> 종합점수 결과	26
<표 2.10> 부문별 세부이행과제 점검등급 결과	26
<표 2.11> 부문별 미추진 사업 현황	27
<표 2.12> 당초 변경사업 및 신규 추가사업	28
<표 2.13> 지역 기후위기 리스크 위험 순위	30
<표 2.14> 리스크 저감을 위한 부문별 추진 세부이행과제	31
<표 2.15> 제2차 기후위기 적응대책 이행협의체 구성·운영	43
<표 3.1> 전년도 세부사업 조치결과	47
<표 3.2> 당해연도 자체점검결과 조치계획	49
<표 4.1> 차년도 추진세부사업 목록	54

<그림 1.1> 지자체 적응대책 이행점검 절차	6
<그림 1.2> 제2차 원주시 기후변화적응대책 적응협의체 구성·운영도	7
<그림 1.3> 원주시 기후변화적응대책 이행점검 및 모니터링 체계	7
<그림 1.4> 제2차 기후위기 적응대책 부문별 예산 및 이행과제 수	12
<그림 2.1> 원주시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례	36
<그림 2.2> 원주시 폭염 피해 예방 조례	37
<그림 2.3> 원주시 기후변화 홍보관 설치 및 운영 조례	38
<그림 2.4> 원주시 탄소중립지원센터 추진전략 및 조직도	40
<그림 2.5> 원주시 탄소중립지원센터 지정 알림(상지대학교)	41
<그림 2.6> 전문가 및 주민참여단 구성 절차 및 내용	42
<그림 3.1> 지자체 적응역량강화	117

제 1 장

이행점검 개요

- 제 1 절 점검배경 및 목적
- 제 2 절 점검체계 및 방법
- 제 3 절 추진경위
- 제 3 절 점검대상

제 1 장

이행점검 개요



1. 점검배경 및 목적

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제40조 및 같은 법 시행령 제43조에 의하여 시장·군수·구청장은 기후변화에 대한 영향 및 피해를 최소화 하기 위해 5년 단위의 기후변화적응대책 세부시행계획 수립을 의무화 하고 있음

탄소중립·녹색성장 기본법 제40조(지방 기후위기 적응대책의 수립·시행)

- ① 시·도지사, 시장·군수·구청장은 기후위기적응대책과 지역적 특성 등을 고려하여 관할 구역의 기후위기 적응에 관한 대책(이하 “지방기후위기적응대책”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다.
- ② 시·도지사, 시장·군수·구청장은 지방기후위기적응대책을 수립하거나 변경하는 경우에는 지방위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 심의를 생략할 수 있다.
- ③ 지방기후위기적응대책이 수립 또는 변경된 경우 시·도지사는 이를 환경부장관에게, 시장·군수·구청장은 이를 환경부장관 및 관할 시·도지사에게 각각 제출하여야 하며, 환경부장관은 제출받은 지방기후위기적응대책을 종합하여 위원회에 보고하여야 한다.
- ④ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 지방기후위기적응대책의 추진상황을 매년 점검하고 그 결과 보고서를 작성하여 지방위원회의 심의를 거쳐 시·도지사는 환경부장관에게, 시장·군수·구청장은 환경부장관 및 관할 시·도지사에게 각각 제출하여야 하며, 환경부장관은 이를 종합하여 위원회에 보고하여야 한다.

탄소중립·녹색성장 기본법 시행령 제43조(지방 기후위기 적응대책의 수립·시행)

- ① 법 제40조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우”란 같은 조 제1항에 따른 관할 구역의 기후위기 적응에 관한 대책(이하 “지방기후위기적응대책”이라 한다)의 본질적인 내용에 영향을 미치지 않는 사항으로서 지방기후위기적응대책의 세부 내용이나 주관 기관 또는 관련 기관 등에 관한 사항 중 일부를 변경하는 경우를 말한다.

- ② 시·도지사, 시장·군수·구청장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 지방위원회의 심의를 거치기 전에 환경부장관과 협의해야 한다.
 - 1. 법 제40조제1항 및 제2항에 따라 지방기후위기적응대책을 수립하거나 변경(같은 조 제2항 단서에 따른 경미한 사항의 변경은 제외한다)하는 경우
 - 2. 법 제40조제4항에 따른 결과 보고서를 작성하는 경우
- ③ 환경부장관은 제2항에 따라 협의를 할 때에는 법 제46조제1항에 따른 국가 기후위기 적응센터 등 관계 전문기관의 의견을 들을 수 있다.
- ④ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 법 제40조제4항에 따른 결과 보고서를 매년 4월 30일까지 시·도지사는 환경부장관에게, 시장·군수·구청장은 환경부장관과 관할 시·도지사에게 각각 제출해야 한다.
- ⑤ 법 제40조제4항에 따라 환경부장관은 제4항에 따라 제출된 결과 보고서를 종합하여 매년 5월 31일까지 위원회에 보고해야 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 지방기후위기적응대책의 수립·변경 및 이행점검 등에 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

- 원주시는 건강 외 5개 분야에 대한 55개 세부과제에 대해 「원주시 제2차 기후위기 적응대책 세부시행계획을 수립(2019)」 하고 이를 고시
 - 공간적 범위 : 원주시 1개읍, 8개 면, 16개 행정동(872.56km²)
 - 계획수립연도 : 2019 ~ 2023(5개년)
 - 수립기준연도 : 2019년
- 환경부 장관은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 근거하여 수립되는 「지방 기후위기 적응대책 세부시행계획」시행의 적정성 등을 확인하기 위하여 매년 그 실적을 점검할 수 있으며, 필요한 경우 관련 자료의 제출을 요청할 수 있도록 하고 있으며(영 제43조 제4항, 제5항)
- 이를 근거로 하여 지자체는 세부시행계획의 추진상황을 매년 점검하고, 그 결과 보고서를 작성하여 시도지사 및 환경부 장관에 제출하여야 함(탄소중립녹색성장기본법 제40조).
- 따라서 본 이행점검은 「원주시 제2차 기후변화적응대책 세부시행계획」의 2022년도 세부이행과제에 대한 이행상황을 체계적이며, 종합적으로 점검하고 점검·환류하여 정책 및 환경 여건 변화에 능동적으로 대응하며, 세부사업에 대한 성과관리로 추진 세부과제에 대한 효율성을 높이며, 책임성을 확보 하는데 있음



2. 점검체계 및 방법


1) 이행점검 체계

- 적응대책 세부시행계획의 성과관리를 위한 이행점검 체계는 지자체의 특성을 반영하여 세부시행계획을 수립한 소관부서의 적응정책을 스스로 진단하고 환류하는 자체점검(self evaluation)방식을 원칙으로 함
 관련근거 : 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2023.09.)
- 세부시행계획의 이행점검은 [자체점검계획 수립], [자체점검], [점검결과 및 보고서 제출] 및 [점검결과 환류] 단계 실시
 - **점검 계획수립**
 점검계획은 적응분야별 점검대상 세부사업의 평가방법, 중간점검 및 최종평가, 최종점검에 따른 환류회 개최, 차년도 시행계획의 반영 등 행정적 절차를 포함하여 각 소관부서 안내
 - **자체점검**
 (중간점검) 부문별 세부사업의 집행실적 및 상황변화(사업, 예산 및 성과지표 등)를 모니터링하여 적정 조치 및 관리를 통하여 세부사업의 성과목표 달성 도모
 (최종평가) 당해 연도 부문별 세부사업 추진결과에 대한 성과목표 달성도, 집행 실적, 사업성과 및 미흡·보완사항 등을 종합 진단·평가
 (차년도 계획반영) 부문별 세부사업의 관리를 통해 추진실적이 저조 및 미추진 사업에 대한 조치 및 관리방안 마련과 우수사업에 대한 지속적 확대를 통하여 정책여건 및 상황변화에 따른 계획 변경
 - **점검결과 및 보고서 제출**
 (초안제출) 기초지자체는 자체점검 결과보고서를 작성하여 매년 2월 광역지자체에 제출
 (최종제출) 지방위원회 심의를 거쳐 매년 4월 30일까지 자체점검 결과서 최종 제출(지자체→환경부)
 - **점검결과 환류**
 환경부와의 협의를 통한 차년도 이행계획 마련 및 적응대책의 변경 또는 수정으로 세부 추진사업의 내실 및 효율성 도모

절차	주요 내용
<p style="text-align: center;">점검 계획수립 (매년 : 10월~11월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 당해연도 점검일정, 점검대상 및 방법 등 점검계획 마련 • 계획수립 시 추진현황 점검 및 관리 포함 • 적응대책 및 전년도 후속조치 결과 검토 • '지방 기후위기 적응대책 이행점검 시스템(http://lap.kei.re.kr/)'에 당해연도 목표 입력(매년 10월 31일)
↓	
<p style="text-align: center;">이행점검 (매년 : 12월~익년도 1월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 세부이행과제 소관부서는 추진실적 및 점검결과를 주관부서에 제출 • 주관부서는 세부이행과제 계획목표 및 계획에 산과 이행실적 비교 • 결과보고서 작성 및 점검결과 통보·조치
↓	
<p style="text-align: center;">점검결과 심의 및 결과보고서 제출 (매년 : ~익년도 4월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • '지방 기후위기 적응대책 이행점검 시스템(http://lap.kei.re.kr/)'에 • 추진실적 입력(매년 2월 15일) ÿ 본 지침에 따른 결과보고서를 파일 형태(한글)로 공문과 함께 작성·제출 • 기초지자체는 결과보고서를 광역지자체에 제출(매년 2월 5일) - 광역지자체는 관할 기초지자체의 결과보고서를 취합한 후 환경부 • 협의(매년 2월 15일) - 결과보고서 최종 제출(매년 4월 30일, 지자체→환경부) ※ 지방위원회 심의를 거쳐 제출
↓	
<p style="text-align: center;">점검결과 환류</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 결과보고서 탄소중립녹색성장위원회(이하 "위원회") 보고 (매년 5월 31일, 환경부→위원회) • 환경부와의 협의를 통한 차년도 이행계획 마련 및 적응대책 변경 또는 수정 보완 • 기존 지방 기후위기 적응대책 보고서 수정 및 제출


<그림 1.1> 지자체 적응대책 이행점검 절차

자료출처: 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(환경부, 2023.09.)

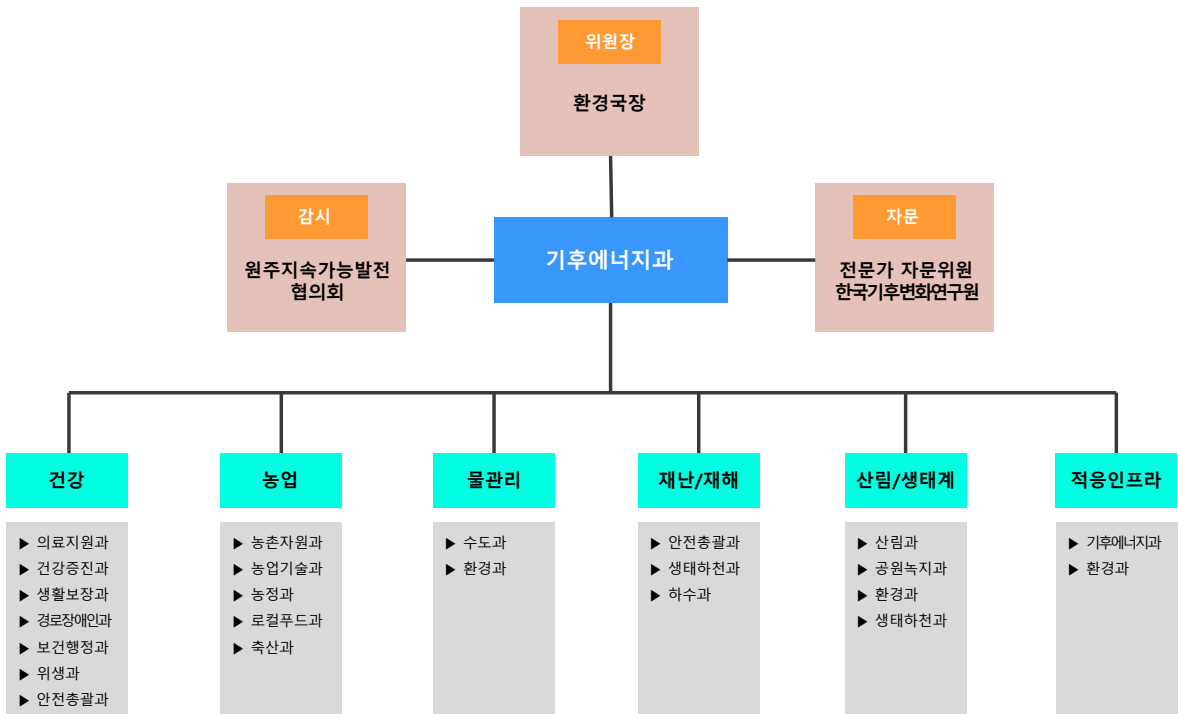

<그림 1.2> 제2차 원주시 기후변화적응대책 적응협의체 구성·운영도

자료 : 원주시 기후에너지과

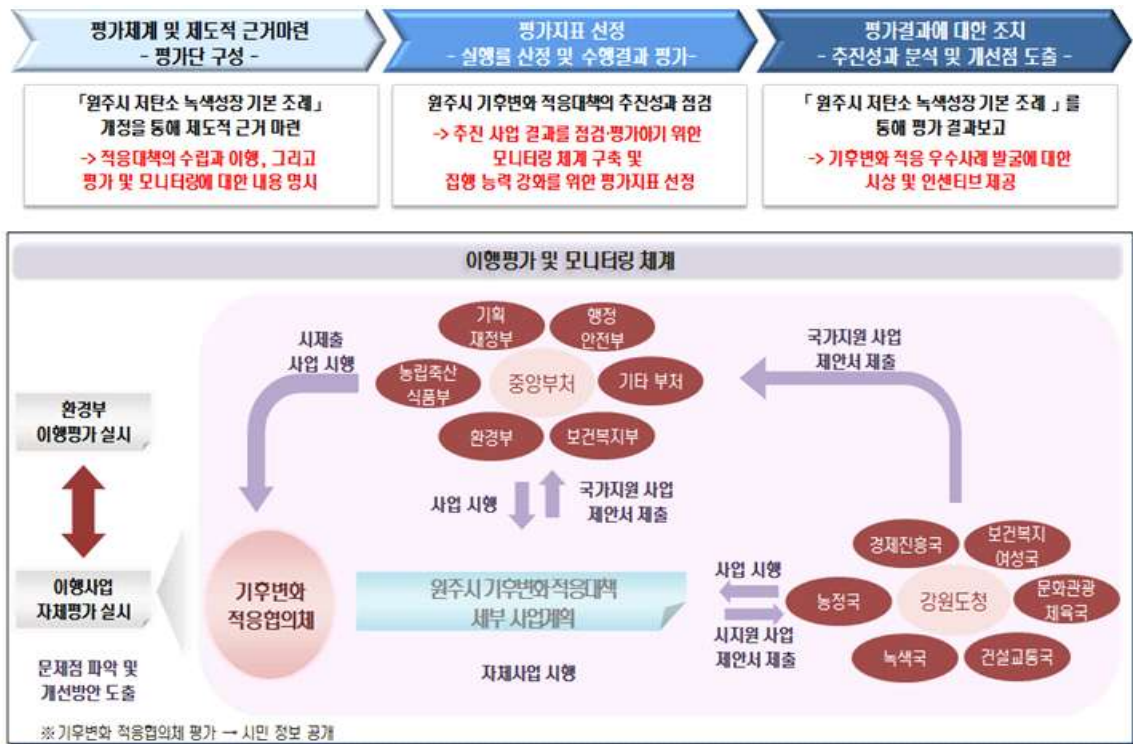

<그림 1.3> 원주시 기후변화적응대책 이행점검 및 모니터링 체계

(2) 이행점검 방법

○ 이행점검 주체

이행점검 주체는 점검목적 및 특성을 고려하여 “제2차 기후위기 적응대책 적응협의회”를 주체로 하여 중간점검 및 세부사업에 대한 최종 점검을 실시하였으며,

- 이외 부문별 추진 세부시행계획 수행에 따른 기후변화 정책사업의 사업별 중복 배제, 사업추진 당위성, 사업추진 우선순위 조정 등 사업의 체계적 관리와 중앙 부처에서 추진하는 국고사업의 적극적 대응과 지역의 특성화된 기후변화대응 사업의 발굴 업무를 포함하고 있음
- 점검부문: 건강 외 5개 적응부문 점검
- 점검대상: 제2차 기후위기적응대책 2023년 세부이행과제

○ 세부이행과제 점검기준 및 방법

세부사업에 대한 점검은 환경부 「지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침」의 “점검등급에 따른 점검방법”을 준용

- 성과지표에 따른 점검기준
 (정량지표) 목표 달성 노력(달성률) = 실적치/목표치(%)
 (정성지표) 예산 집행 노력(예산 집행률) = 실적예산/계획예산(%)
- (예산 집행률 적용기준)
 당해 연도 확정 예산에 대한 목표 대비 집행률을 의미함
- (비예산사업)
 성과목표 달성률(정량)또는 목표달성 정도(정성)에 따라 점검 시행
- (복합지표)
 세부이행과제에 성과지표가 2개 이상인 경우, 각각의 성과지표 달성률에 대한 평균 값 사용

<표 1.1> 종합등급(기초지자체 점검등급)

등급	매우 우수	우수	보통	미흡
점수	90점 이상	80점 이상	60점 이상	60점 미만

자료출처: 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2023.09.)

〈표 1.2〉 이행점검 항목, 배점 및 내용

점검 항목(배점)		점검 기준(배점)	세부 배점 내용
준비 (30)	1. 대책의 이행 (30)	1-1. 전년도 점검결과에 따른 조치(15)	- 전년도 미흡, 미추진 과제 등에 대한 후속조치
		1-2. 지자체 적응역량 강화(15)	- 환경부 주관 지자체의 적응역량 강화 교육, 이행점검 교육, 취약성 및 영향평가 교육등 참석 여부
이행	2. 추진 과정의 적절성 (40)	2-1. 성과목표대비 실제달성한 정도(20)	- 정량지표는 실적치/목표치, 정성지표는 성과목표 대비 달성 정도
		2-2. 계획 예산대비 실제 집행한 예산 정도(20)	- 당해연도 계획 예산 대비 실제 집행 정도
성과 (20)	3. 대책의 성과(30)	3-1. 자체성과 점검(30)	- 지자체의 우수사례 성과, 노력 등을 종합
가점 (10)	4. 추진기반 조성(10)	4-1. 지자체 조례 마련(2)	- 적응대책 수립 및 이행 혹은 유사한 사업과 관련하여 지자체의 조례 등 마련 여부
		4-2. 위원회 및 전문기관 운영(2)	- 지방 탄소중립녹색성장위원회 및 탄소중립지원센터 운영 여부
		4-3. 지역전문가 주민참여단 구성운영(3)	- 적응대책 수립, 이행 등 추진과정에서의 지역전문가, 지역주민 참여·평가 여부
		4-4. 우수사례 반영(3)	- 참여단 운영결과, 타 지자체 우수사례, 자체발굴한 우수사례를 세부이행과제에 반영한 정도
감점	5. 행정절차 지연	5-1. 행정절차 지연(-5)	- 적응대책 수립, 이행점검 시 추진실적 시스템입력 및 결과보고서 등 행정절차 지연

자료출처: 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2023.09.)

〈표 1.3〉 세부배점 적용기준

평가 기준(배점)	적용 기준		산출식	
	점수	적용사항		
준비 (30)	1-1. 전년도 점검결과에 따른 조치(15)	15	전년도 점검결과 미흡·미추진 사항에 대한 조치율 90% 이상	조치완료건수÷ 미흡·미추진건수 ×100(%)
		12	전년도 점검결과 미흡·미추진 사항에 대한 조치율 70% 이상	
		9	전년도 점검결과 미흡·미추진 사항에 대한 조치율 50% 이상	
		6	전년도 점검결과 미흡·미추진 사항에 대한 조치율 50% 미만	
	1-2. 지자체 적응역량 강화(15)	15	참석 대상(2명)의 교육참석 횟수(1명 최대 3회)가 6회 이상	참석대상 : 지자체, 탄소중립 지원

평가 기준(배점)	적용 기준		산출식	
	점수	적용사항		
이행 (40)	2-1. 성과목표 대비 실제 달성한 정도(20)	12	참석 대상(2명)의 교육참석 횟수(1명 최대 3회)가 5회 이상	센터 각 1명 대상교육 : 환경부에서주관 하는적응역량 강화, 영향평가 등의교육
		9	참석 대상(2명)의 교육참석 횟수(1명 최대 3회)가 4회 이상	
		6	참석 대상(2명)의 교육참석 횟수(1명 최대 3회)가 3회 이하	
	2-2. 계획 예산대비 실제 집행한 예산 정도(20)	20	평균 성과달성률 90% 이상	$\text{평균 목표달성률} = \frac{\sum(\text{개별 세부이행과제 목표달성률})}{\text{대상세부이행과제수}(\%)}$ $\text{-목표달성률} = \frac{\text{실적치}}{\text{목표치}} \times 100(\%)$
		16	평균 성과달성률 80% 이상	
		12	평균 성과달성률 60% 이상	
		8	평균 성과달성률 40% 이상	
		4	평균 성과달성률 40% 미만	
	2-2. 계획 예산대비 실제 집행한 예산 정도(20)	20	평균 예산집행률 90% 이상	$\text{평균 예산집행률} = \frac{\sum(\text{개별 세부이행과제 예산집행률})}{\text{대상 세부이행과제수}(\%)}$ $\text{-예산집행률} = \frac{\text{실 집행예산}}{\text{계획 예산}} \times 100(\%)$
		16	평균 예산집행률 80% 이상	
12		평균 예산집행률 60% 이상		
8		평균 예산집행률 40% 이상		
4		평균 예산집행률 40% 미만		
성과 (30)	3-1. 자체성과평가(30)	30	부문별 우수사례, 적응대책 이행 정도 및 효과성, 세부이행과제와 지역 리스크간 연계성을 포함하여 적극 반영	
		25	부문별 우수사례, 적응대책 이행 정도 및 효과성, 세부이행과제와 지역 리스크 간 연계성을 포함하여 일부 반영	
		20	부문별 우수사례, 적응대책 이행 정도 및 효과성, 세부이행과제와 지역 리스크 간 연계성 등 반영 미흡	
가점 (10)	4-1. 지자체 조례 마련(2)	2	지자체 조례 제정 시행 여부	
	4-2. 위원회 및 전문기관 운영(2)	2	지방 탄소중립녹색성장위원회: 1점 탄소중립지원센터 운영: 1점	
	4-3. 지역전문가주민참여단 구성 운영(3)	3	지역전문가 주민참여단 대상 교육, 회의 1회 이상 : 1점 지역전문가 주민참여단 구성 : 1점 지역전문가 주민참여단 운영 : 1점	
	4-4. 우수사례반영(3)	3	참여단 선정과제 확대·신규, 타 지자체 우수사례, 신규사업(과제) 발굴 등 우수 사례를 세부이행과제에 반영한 건수반영 건당 1점	
감점	5-1. 행정절차 지연(-5)	-5	1건 지연 : 감점 3점 2건 이상 지연 : 감점 5점	

평가 기준(배점)	적용 기준		산출식
	점수	적용사항	
(5)		<감점대상> - 적응대책 이행점검 추진실적 시스템입력 지연 - 결과보고서 제출 지연 - 적응대책 수립 완료(연도 초과) 지연 (5개년 중 수립시점 1회만 적용)	

※ (복합지표) 세부이행과제에 성과지표가 2개 이상인 경우, 각각의 목표달성률에 대한 평균값 사용

※ (예산집행률 적용기준) 당해연도 계획 예산에 대한 실적행률을 의미함

※ (비예산 과제) 목표달성률(정량) 또는 목표달성 정도(정성)에 따라 점검 시

자료출처: 지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(2023.09)



3. 추진경위

- 세부시행계획의 이행점검 절차는 환경부 “지방기후 위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침(환경부, 2023)”에 의해 「점검계획 수립」, 「중간점검 및 성과목표 조정」, 「최종점검 및 점검환류회」 순으로 점검 실시
- 세부시행계획의 이행점검 일정은 다음과 같음
 - 원주시 제2차 기후변화적응대책 세부시행계획 수립 공포 : 2019. 06.
 - 기후변화적응대책 이행협의체 직무역량강화 교육: 2023. 05.
 - 제2차 기후위기 적응대책 5차년도 세부시행계획 이행점검계획 수립: 23. 11.
 - 부문별 5차년도 세부이행과제에 대한 성과목표 조정: 23. 11.
 - 부문별 5차년도 세부이행과제에 대한 성과관리카드 작성 및 성과점검: 2023.01.
 - 제2차 기후위기적응대책 5차년도 세부시행계획 이행점검 보고서 작성: 2023. 01. ~ 02.
 - 제2차 기후위기 적응대책 5차년도 세부시행계획 이행점검 환류회 개최 : 2024. 05.(예정)





4. 점검대상

- 세부시행계획의 이행점검 대상은 「원주시 제2차 기후변화 적응대책 세부시행계획」의 건강 외 5개 적응 분야에 대한 39개 세부사업 이행점검
- ※ 추진완료 16개 세부이행과제 이행점검 대상 제외

<표 1.4> 제2차 기후변화적응대책 부문별 예산 및 사업 개수

적응분야	사업예산		사업개수		추진완료
	예산(백만원)	비율(%)	개수(개)	비율(%)	
건강	53,711	50.4	11(12)	27.5	1
농업	1,595.6	1.5	8(14)	22.5	6
물관리	6,654	6.2	5	12.5	-
재난/재해	13,110	12.3	5(8)	12.5	3
산림/생태계	8,543	8.0	6(10)	15	4
적응 인프라	23,012	21.6	4(6)	10	2
합 계	106,626	100	39	100	16

자료 : 제2차 원주시 기후변화적응대책 세부시행계획 수립(2019)

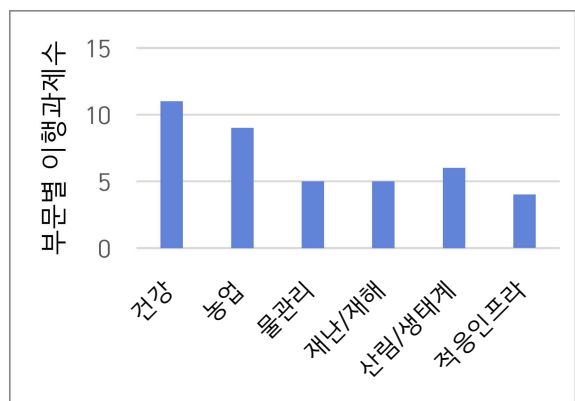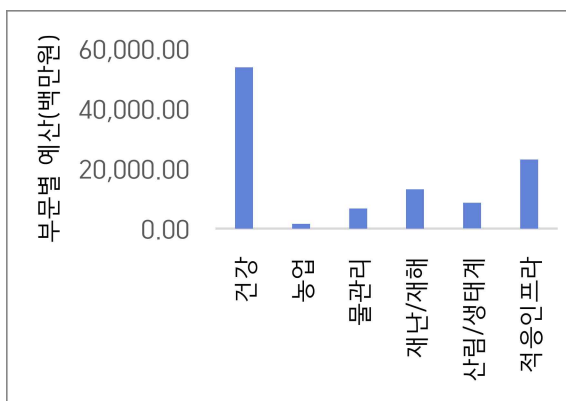

(a) 부문별 적응대책 예산

(b) 부문별 세부사업 수

<그림 1.4> 제2차 기후위기 적응대책 부문별 예산 및 이행과제 수

<표 1.5> 제2차 기후변화적응대책 이행점검 세부사업 목록

부문 (사업수)	실천과제	세부사업	성과목표	사업 유형	소관 부서
건강	【1-1-가】 취약계층 지원기반 강화	【1-1-가-1】 저소득층 검진사업	검진사업자 수(명)	기존	의료지원과
		【1-1-가-2】 방문건강 관리사업	방문등록관리자 수(명)	기존	건강증진과
		【1-1-가-3】 저소득 주민 최저생활 보장급여지급	최저생활 보장급여자 수(명)	기존	생활보장과
		【1-1-가-4】 독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스	대상자 확대(명)	기존	경로 장애인과
	【1-1-나】 시민 건강보호	【1-1-나-1】 농촌맞춤형 건강교실	건강교실 참여인원(명)	기존확대	보건행정과
		【1-1-나-2】 예방접종사업	국가예방접종(건 수)	기존	의료지원과
	【1-2-가】 전염병 감시 및 관리시스템 구축	【1-2-가-1】 식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	식품접객업소 지도(건수)	기존	위생과
		【1-2-가-2】 감염병 관리사업	역학조사(건수)	기존	보건행정과
		【1-2-가-3】 방역소득사업	예산집행율(%)	기존	보건행정과
	【1-2-나】 폭염한파 대응체계 구축	【1-2-나-1】 무더위쉼터 냉방비 지원	냉방비 지원 무더위 쉼터(개소)	기존보완	안전총괄과
		【1-2-나-2】 경로당 운영지원	예산집행율(%)	기존보완	경로 장애인과
		【1-2-나-3】 폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보	보도건수(건수)	기존	안전총괄과
	농업	【II-1-가】 신품종 개발 및 재배기술 보급	【II-1-가-1】 품목농업인연구회 전문능력 활성화	현장애로과제지 원(개소)	신규(발굴)
【II-1-가-2】 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업			사업실적(개소)	기존	농촌자원과
【II-1-가-3】 신품종 버섯 지역적응 재배 시범사업			재배면적(ha)	신규(발굴)	농업기술과
【II-1-가-4】 기후변화대응 양파 기계화 생력재배 시범			재배면적(ha)	신규(발굴)	농업기술과
【II-1-가-5】 폭염대응 시설채소 온도저감 기술시범			온도저감시설 면적(ha)	신규(발굴)	농업기술과
【II-1-가-6】 기후변화대응 지역 특화작목 육성			식재면적(ha)	기존보완	농업기술과
【II-1-나】 안정적 생산		【II-1-나-1】 가뭄대비 중소형 관정 개발사업	관정개발(공)	기존	농정과

부문 (사업수)	실천과제	세부사업	성과목표	사업 유형	소관 부서
	환경 구축 및 지원	【II-1-나-2】 비닐하우스 현대화 사업	내재해형 시설 설치지원(동)	기존	로컬푸드과
		【II-1-나-3】 과수 생력화 작업기 지원	작업기 지원(대)	기존	로컬푸드과
		【II-1-나-4】 사과 명품과원 조성 지원	명품과원조성지 원(ha)	기존	로컬푸드과
		【II-1-나-5】 시설원에 환경개선 지원	시설원에환경개 선(ha)	기존	로컬푸드과
	【II-2-가】 축산업 피해예방 및 저감	【II-2-가-1】 폭염등 재해대비 축산시설 구조개선	가축폐사율 감소(%)	기존	축산과
		【II-2-가-2】 거점소득세척시설 추가설치	제반사항추진(%)	신규(발굴)	축산과
		【II-2-가-3】 가축질병 예방체계 구축	공동방재단 운영(개반)	기존보완	축산과
물관리	【III-1-가】 상수도 안정성 제고	【III-1-가-1】 지방상수도(급·배수관) 확충사업	확충사업(km)	기존	수도과
		【III-1-가-2】 마을(소규모)수도시설 설치 및 개보수 사업	소규모 마을수도 설치(km)	기존	수도과
		【III-1-가-3】 먹는물 공동시설 소규모 개선사업	예산집행율(%)	기존	환경과
		【III-1-가-4】 상수도 급수구역 블록시스템 구축	상수도 급수구역(블록)	기존	수도과
	【III-1-나】 청정 수원 확보	【III-1-나-1】 비점오염저감시설 운영관리	수질검사율(%)	기존확대	환경과
재난/ 재해	【IV-1-가】 재해위험 저감 및 피해완화 사업	【IV-1-가-1】 무진 재해위험개선지구 정비사업	사업공정율(%)	기존	안전총괄과
		【IV-1-가-2】 봉산 재해위험개선지구 정비사업	사업공정율(%)	기존	안전총괄과
		【IV-1-가-3】 풍수해보험료 가입지원	보험가입 건수(주택 : 건/ 온실 : ㎡)	기존	안전총괄과
		【IV-1-가-4】 방문안전교육	교육인원(명)	기존	안전총괄과
	【IV-2-가】 방재 인프라 구축	【IV-2-가-1】 재난대응 안전한국훈련 실시	재난대비훈련(등 급)	기본보완	안전총괄과
		【IV-2-가-2】 원주천 댐 건설사업	사업공정율(%)	기존	생태하천과

부문 (사업수)	실천과제	세부사업	성과목표	사업 유형	소관 부서	
		【IV-2-가-3】 하천 재해예방 사업	사업공정율(%)	기존확대	생태하천과	
		【IV-2-가-4】 원주시 노후관로 정비사업	사업공정율(%)	기존	하수과	
산림/ 생태계	【V-1-가】 산림피해 방지	【V-1-가-1】 산불방지 대책	예산집행율(%)	기존	산림과	
		【V-1-가-2】 산림병해충 방제	방제면적(ha)	기존	산림과	
		【V-1-가-3】 산림재해방지 사망사업 확충	사망땀 신설 및 준설(개소)	기존	산림과	
	【V-1-나】 산림자원 체계적 관리	【V-1-나-1】 숲가꾸기 사업	숲가꾸기 사업(ha)	기존확대	산림과	
		【V-1-나-2】 문막일반산업단지 미세먼지 저감숲 조성	숲 조성 면적(ha)	신규(발굴)	공원녹지과	
		【V-1-나-3】 명품가로숲길 조성사업	숲길 조성(km)	기존확대	공원녹지과	
		【V-1-나-4】 미세먼지저감 조림사업	미세먼지 저감 조림 조성(ha)	신규(발굴)	산림과	
	【V-2-가】 생태계 유지 및 활용	【V-2-가-1】 단계천 생태하천 복원사업	사업공정율(%)	기존	생태하천과	
		【V-2-가-2】 원주천 생태하천 모니터링	모니터링(회)	기존	생태하천과	
		【V-2-가-3】 생태계교란생물 퇴치사업	생태교란식물 제거(m ²)	기존	환경과	
	적응 인프라	【VI-1-가】 신재생에너지 활성화	【VI-1-가-1】 저소득층 에너지효율개선(WAP) 사업	에너지 효율시공(가구)	기존확대	기후 에너지과
			【VI-1-가-2】 기후변화에너지 관련 시설 위탁 운영	참여 인원수(명)	기존	기후 에너지과
【VI-1-가-3】 시민참여형 기후변화 대응 행사 등 운영			참여 인원수(명)	기존보완	기후 에너지과	
【VI-1-가-4】 어린이체험 환경교육			교육 횟수(회)	기존보완	환경과	
【VI-1-가-5】 기후변화 대응 교육프로그램 운영			참여 인원(명)	기존확대	기후 에너지과	
【VI-1-가-6】 미세먼지 저감사업(자동차 분야)			예산집행율(%)	기존확대	기후 에너지과	

제 1 절 총 평

제 2 절 세부 점검결과 종합

제 3 절 주요성과

제 4 절 적응대책 추진기반 조성 및 이행력 제고

제 2 장

이행점검 결과



1. 총 평

- 「제2차 원주시 기후변화 적응대책」의 건강 외 5개 부문에 대한 39개 세부이행 과제를 대상으로 5차년도 세부시행계획에 대해 이행점검을 실시
 - 예산집행: 5차년도(2,023년) 건강 외 5개 부문에 대한 기후위기 적응대책 예산은 106,626백만원 이며, 이 중 107,070백만원을 집행하여 100%의 예산 집행실적을 보임
 - 추진실적: 세부사업의 추진실적은 76%를 보임. 부문별로는 건강 89%, 농업 79%,물관리 54%, 재난/재해 54%, 산림/생태계 83%, 적응 인프라 79%의 추진실적을 보임
- 부문별 세부과제 점검은 추진완료를 제외 한 39개 과제를 대상으로 점검하였으며, 이중 미추진 3개 과제를 제외한 36개 이행과제가 정상 추진되었음. 미추진 과제는 3개 과제로 건강과 농업 물관리 부문에서 각각 1개 이행과제를 보임
- 점검등급별 과제 개수는 매우 우수: 27개, 우수: 3개, 보통: 5개, 미흡 :1개 미추진: 3개로 나타남
- 종합점수는 준비 부문 24점, 이행 부문 32점, 성과 부문 25점, 가점에서 6점을 보여 총점은 87점을 보였으며, 점검등급은 “우수” 등급을 보임



2. 세부 점검결과 종합

1) 부문별 추진실적 점검결과

- **건강:** 건강 부문은 11개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 6개, 우수 1개, 보통 2개, 미흡 1개, 미추진은 1개 세부이행과제를 보임
 - 미추진 과제: 무더위 쉼터 냉방지 지원(안전총괄과)

- **농업:** 농업 부문은 8개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 5개, 보통 2개 세부이행과제를 보였으며, 미추진은 1개 세부이행과제를 보임
 - 미추진과제: 과수 생력화 작업기 지원(로컬푸드과)

- **물관리:** 물관리 부문은 5개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 3개, 우수 1개 세부이행과제를 보였으며, 미추진은 1개 세부이행과제를 보임
 - 미추진과제: 먹는물 공동시설 소규모 개선사업(환경과)

- **재난/재해:** 재난/재해 부문은 5개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급 별로는 매우 우수 4개, 우수 1개 세부이행과제를 보임

- **산림/생태계:** 산림/생태계 부문은 6개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급은 모든 세부 이행과제가 매우 우수를 보임

- **적응인프라:** 적응인프라 부문은 4개 세부이행과제가 추진되었으며, 등급별로는 매우 우수 3개, 보통 1개 세부이행과제를 보임

<표 2.1> 부문별 추진실적 점검결과

부문	과제 수 (개)	① 추진결과			② 이행실적		③ 변경사항		
		추진 (개)	미추진 (개)	사업 추진율 (%)	목표 달성률 (%)	예산 집행률 (%)	신규 (개)	삭제 (개)	조정 (개)
건강	11	10	1	90.9	86	73	-	1	5
농업	8	7	1	87.5	83	76.13	-	1	-
물관리	5	4	1	80	74	73.6	-	-	1
재난/재해	5	5	-	100	93.8	97.8	-	-	3
산림/생태계	6	6	-	100	100	99	-	-	3
적응인프라	4	4	-	100	79.25	100	-	-	1
합계 (비율)	39	36 (92.3%)	3 (7.7%)	92.3%	86.3%	83.3%	-	2	13

① 부문별 세부이행과제 추진현황

- 세부이행과제 추진은 미추진 과제 3개를 제외 한 36개 세부이행과제가 정상추진되었으며, 변경사항으로는 삭제 2개, 조정 13개 세부이행과제를 보임

<표 2.2> 부문별 세부이행과제 추진현황

부문	사업수	추진결과			변경사항			예산(백만원)	
		정상 추진	부분 추진	미추진	신규 추가	삭제	조정	계획예산	집행예산
건강	11	10	-	1	-	1	5	53,694	7,400
농업	8	7	-	1	-	1	-	749.65	1411.7
물관리	5	4	-	1	-	-	1	6644.1	6180
재난/재해	5	5	-	-	-	-	3	7,836.8	13,108
산림/생태계	6	6	-	-	-	-	3	7,331	7,531
적응인프라	4	4	-	-	-	-	1	789	22,603
합계 (비율)	39	36 (92.3%)	-	3 (7.7%)	-	2	13	77,045	58,234

② 부문별 세부이행과제 성과목표 달성결과

■ [건강 부문] 11개 단위사업

<표 2.3> [건강 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률(백만원)			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
1-1-가1	저소득층 검진사업 (저소득층 검진사업자 수)	기존	-	사업종료						○
1-1-가2	방문건강 관리사업 (방문등록관리자 수)	기존	-	12,921	6,257	48	653	652	100	×
1-1-가3	저소득 주민 최저생활 보장급여지급 (적기지급 여부(지급율))	기존	-	0	11,503	100	47,701	0	0	×
1-1-가4	독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스 (지원세대 수)	기존	-	1,613	3,400	100	232	736	100	×
1-1-나1	농촌맞춤형 건강교실 (교육참여자 수)	기존 확대	-	0	4,033	100	0	17	100	×
1-1-나2	예방접종사업 (영유아 접종인원)	기존	-	96	100	100	4,355	5,340	100	×
1-2-가1	식중독예방 및 식품접객업소 위생관리(식품접객업소 기획 점검 건수 및 예방관리 건수)	기존	-	0	15	100	5	5	100	×
1-2-가2	감염병 관리사업 (추적조사 완료율)	기존	-	100	100	100	5	2	40	×
1-2-가3	방역소독사업 (소독실시 횟수, 하수관로 약품투입기운영 설치 개소 수 및 해충유인 살충기 운영 설치 개소 수(회 및 개소))	기존	-	2,336	2,286	98	597	540	90	×
1-2-나1	무더위쉼터 냉방비 지원 (지원개소 수)	기존 보완	-	0	0	0	0	0	0	○
1-2-나2	경로당 운영지원 (냉방기 및 공기청정기 지원개수)	기존 보완	-	26	26	100	141	103	73	×
1-2-나3	폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보 (홍보활동(보도건수))	기존	-	6	50	100	5	5	100	×
평균	100%	-	-			86%	53,694	7,400	73%	-

■ [농업 부문] 14개 세부이행과제

<표 2.4> [농업 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도							미 추 진
				목표달성률			예산집행률				
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)		
2-1-가1	품목농업인연구회 전문능력 활성화 (현장 애로과제 지원 개소)	신규 (발굴)	-	9	9	100	20	99.7	100	×	
2-1-가2	작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업(사업실적(개소))	기존	-	사업종료						○	
2-1-가3	신품종 버섯 지역적응 재배 시범사업(시범사업 설치 실적)	신규 (발굴)	-	사업종료						○	
2-1-가4	기후변화대응 양파 기계화 생력재배 시범(시범사업 설치 실적)	신규 (발굴)	-	사업종료						○	
2-1-가5	폭염대응 시설채소 온도저감 기술시범(시범사업 설치 실적)	신규 (발굴)	-	사업종료						○	
2-1-가6	기후변화대응 지역 특화작목 육성(특화작목 재배면적)	기존 보완	-	1.5	6.2	100	105	362	100	×	
2-1-나1	가뭄대비 중소형 관정 개발사업(관정개발 수)	기존	-	130	87	67	0	510	100	×	
2-1-나2	비닐하우스 현대화 사업 (비닐하우스 설치 지원 동수)	기존	-	45	39	87	292	147	50	×	
2-1-나3	과수 생력화 작업기 지원 (작업기 지원 대수)	기존 보완	-	0	0	0	0	0	0	○	
2-1-나4	사과 명품과원 조성 지원(명품과원조성지원 면적)	기존	-	2	1.6	80	140	88	63	×	
2-1-나5	시설원에 환경개선 지원 (예산집행율)	기존	-	100	97	97	50	48	96	×	
2-2-가1	폭염등 재해대비 축산시설 구조개선(폭염에 따른 가축 폐사 감소율)	기존	-	사업종료						○	
2-2-가2	거점소독세척시설 추가설치 (거점소독세척시설 추가설치 여부 및 공정률)	신규 (발굴)	-	사업종료						○	
2-2-가3	가축질병 예방체계 구축(공동방재단 운영)	기존 보완	-	3	3	100	142. 65	157	100	×	
평균	100%					83%	749.6 5	1411. 7	76.13 %	-	

■ [물관리 부문] 5개 세부이행과제

<표 2.5> [물관리 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
3-1-가1	지방상수도(급배수관) 확충사업 (급배수관 확충(km))	기존	-	9.5	9.7	100	3,000	2,510	84	-
3-1-가2	마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업 (수도시설 개보수(km))	기존	-	10	6.99	70	2,000	1,935	97	-
3-1-가3	먹는물 공동시설 소규모 개선사업(예산집행율)	기존	-	0	0	0	0	0	0	○
3-1-가4	상수도 급수구역 블록시스템 구축(블록구축 개수)	기존	-	5	5	100	1,500	1,610	100	-
3-1-나1	비점오염저감시설 운영관리 (수질검사율(%))	기존 확대	-	0	100	100	144.1	125	87	-
평균	100%	-	-			74%	6644.1	6180	73.6%	

■ [재난/재해 부문] 8개 단위사업

<표 2.6> [재난/재해 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
4-1-가1	무진 재해위험개선지구 정비사업(사업공정율(%))	기존	-	사업종료						○
4-1-가2	봉산 재해위험개선지구 정비사업(사업공정율(%))	기존	-	사업종료						○
4-1-가3	풍수해보험 가입지원 (보험가입 건수)	기존	-	600	624	100	68	68	100	×
4-1-가4	방문안전교육 (교육인원(명))	기존	-	55,000	37,917	69	43	43	100	×
4-2-가1	재난대응 안전한국훈련 실시 ("우수" 등급 달성)	기본 보완	-	100	100	100	25.8	23	89	×
4-2-가2	원주천 댐 건설사업 (사업 공정율(%))	기존	-	0	100	100	6,487	6,487	100	×
4-2-가2	하천재해예방사업 (사업 공정율(%))	기존	-	0	100	00	1,213	6,487	100	×
4-2-가3	원주시 노후관리 정비사업 (사업 공정율(%))	기존 확대	-	사업종료						○
평균	100%					93.8%			97.8%	

■ [산림/생태계 부문] 10개 단위사업

<표 2.7> [산림/생태계 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
5-1-가1	산불방지대책 (대형산불 zero)	기존	-	0	1	100	3,390	3,390	100	-
5-1-가2	산림병해충 방제 (방제량(ha))	기존	-	258	388	69	761	757	99	-
5-1-가3	산림재해방지 사방사업 확충 (사방댐 신설 및 준설관리개소)	기존	-	10	10	100	1,113	1,367	100	-
5-1-나1	숲가꾸기 사업 (사업실적(ha))	기존 확대	-	940	940	100	2,007	1,958	98	-
5-1-나2	문막일반산업단지 미세먼지 저감숲 조성(사업실적 조성여부)	신규 (발굴)	-	사업종료						○
5-1-나3	명품가로숲길 조성사업 (사업실적(km))	기존 확대	-	사업종료						○
5-1-나4	미세먼지저감 조림사업 (조림면적(ha))	신규 (발굴)	-	사업종료						○
5-2-가1	단계천 생태하천 복원사업 (사업공정율(%))	기존	-	0	100	100	비예 산	비예 산	-	-
5-2-가2	원주천 생태하천 모니터링 (모니터링조사횟수(회))	기존	-	사업종료						
5-2-가3	생태교란생물 퇴치사업 (생태교란식물 제거면적(ha))	기존	-	100, 000	11,4 718	100	60	59	98	○
평균	100%					99%			99%	

■ [적응인프라 부문] 6개 단위사업

<표 2.8> [적응인프라 부문] 성과목표 달성결과

사업 번호	세부사업명	사업 유형	변경 사항	이행정도						
				목표달성률			예산집행률			미 추 진
				계획 목표	추진 실적	목표 달성률 (%)	계획 예산	집행 예산	예산 집행률 (%)	
6-1-가1	저소득층 에너지효율 개선(WAP)사업	기존 확대	-	사업종료						○
6-1-가2	기후변화,에너지 관련 시설 위탁운영	기존	-	71,7 89	98,3 76	100	689	689	100	-
6-1-가3	시민참여형 기후변화대응행사 등 운영	기존 보완	-	28,0 00	7,368	26	70	78	100	-
6-1-가4	어린이 체험교육	기존 보완	-	사업종료						○
6-1-가5	기후변화대응 교육프로그램 운영	기존 확대	-	6,200	5,796	93	30	30	100	-
6-1-가6	미세먼지 저감사업(자동차분야)	기존 확대	-	100	98	98	0	21,8 06	100	-
평균	100%					79,25%			100%	

2) 이행점검 종합점수 결과(정상추진, 부분 추진 사업)

<표 2.9> 종합점수 결과

구분	준비		이행		성과	가점				감점	총 점수	점검 등급
	2-1-1	2-1-2	2-2-1	2-2-2	2-3-1	2-4-1	2-4-2	2-4-3	2-4-4	5-1		
점수	12	12	16	16	25	2	1	-	3	-	87점	우수

3) 세부이행과제별 점검등급

- 부문별 세부사업의 점검 등급결과 매우 우수: 27개, 우수: 3개, 보통: 5개, 미흡: 1개, 미추진 3개 이행과제를 보임
- 세부이행과제 추진은 39개 세부사업 중 미추진 사업 3개를 보여 36개 사업이 정상적으로 추진되었으며, 미추진을 보인 이행과제는 부문별로 건강과 농업,물관리 부문에서 각각 1개 이행과제를 보임
- 종합점수 결과는 87점을 보여 “우수” 등급을 보였으며, 점검 기준 별로는 준비 부문에서 24점, 이행 부분 32점, 성과 부분 25점, 가점 부문 6점을 보임

<표 2.10> 부문별 세부이행과제 점검등급 결과

부문	사업 수 (지표 수)	성과 점검					추진 완료
		매우 우수 (90% 이상)	우수 (90% 미만~ 80% 이상)	보통 (80% 미만~ 65% 이상)	미흡 (65% 미만)	미추진 -	
건강	11	6	1	2	1	1	1
농업	8	5	-	2	-	1	6
물관리	5	3	1	-	-	1	-
재난/재해	5	4	1	-	-	-	3
산림/생태계	6	6	-	-	-	-	4
적응 인프라	4	3	-	1	-	-	2
총 합계 (비율)	39	27 (69.2%)	3 (7.7%)	5 (12.8%)	1 (2.6%)	3 (7.7%)	16

주) “추진완료” 세부이행과제는 점검 대상에서 제외 하였음

4) 미추진 사업

- 39개 세부이행 과제 중 미추진 과제는 3개 과제이며, 부문별로는 건강과 농업, 물 관리 부문에서 각각 1개 세부이행과제가 미추진 되었음
- ※ 세부이행 과제 중 사업종료는 점검에서 제외 하였음

<표 2.11> 부문별 미추진 사업 현황

부문	세부사업명	사업 유형	미추진 사유	비고
건강	무더위쉼터 냉방비 지원	기존보완	수요감소에 따른 사업 폐지	
농업	과수생력화 작업기 지원	기존	유사 사업 통폐합하여 사업내용 확대	
물관리	먹는물 공동시설 소규모 개선사업	기존	예산미확보에 따른 공사 미실시	

5) 당초 변경 및 신규 추가사업

- 당해연도 변경사업으로 조정된 사업은 총 13개 사업으로 부문별로는 건강 부문에서 5개, 물관리 부문에서 1개, 재난/재해 부문에서 3개, 산림/생태계 3개, 적응 인프라 1개 사업을 보임

<표 2.12> 당초 변경사업 및 신규 추가사업

부문	세부사업명	사업 유형	변경 여부	변경사유	변경내용
건강	방문건강 관리사업	기존	조정	지표단위 설명 정정 및 지표값 조정	- 당초: 명+회 - 변경: 명
	저소득 주민 최저생활 보장 급여지급	기존 보완		기초수급자 증가에 따른 예산증액	- 당초: 34,921백만원 - 변경: 47,701백만원
	식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	기존		사업내용 변경에 따른 예산감액(홍보물 제작 감량)	- 당초: 12백만원 - 변경: 5백만원
	방역소독사업	기존		코로나 19 방역소독 종료에 따른 예산 감액	- 당초: 722백만원 - 변경: 597백만원
	경로당 운영지원	기존 보완		에너지 원가 상승에 따른 예산 증액	- 당초: 126백만원 - 변경: 141백만원
물관리	비점오염시설 저감운영관리	기존 보완	조정	사업수요 증가에 따른 예산 증액	- 당초: 64백만원 - 변경: 144.1백만원
재난/재해	방문안전교육	기존	조정	성과목표 조정 2023년도 BSC 목표와 동일하게 성과치 수정	성과목표 수정 -당초: 65,000명 -변경: 55,000명
	원주천 댐 건설사업	기존		사업공정기간 연장	
	하천 재해예방 사업	기존 보완		사업공정기간 연장	
산림/생태계	산림병해충 방제사업	기존	조정	산림병해충 방제면적 증가에 따른 예산증액	- 당초: 545백만원 - 변경: 761백만원
	숲 가꾸기 사업	기존 보완		당해연도 사업물량 조정에 따른 예산 감액	- 당초: 2,450백만원 - 변경: 2,007백만원
	생태계교란식물 퇴치사업	기존		국도비 교부 감액에 따른 사업예산 감액	- 당초: 160백만원 - 변경: 60백만원
적응인프라	미세먼지 저감사업(친환경자동차)	기존	조정	친환경차 보급대수 증가에 따른 예산 조정	예산변동은 없으며, 광역단체 친환경차 할당 사업량 변경



3. 주요성과

- 제2차 적응대책의 이행점검을 통한 주요사업의 성과관리 및 지속적 모니터링
 - 부문별 세부사업에 대한 이행점검을 통하여 환류 체계 강화
 - 미추진 사업에 대한 지속적 모니터링 및 미추진사업 발생시 신규사업 발굴
 - 우수사업에 대한 지속적 확산 및 우수정책 적극 홍보

- 전문기관과 협업한 기후변화 대응으로 위상 제고
 - 전문기관 대행사업 추진을 통한 전문성 확보 및 세부사업의 지속적 성과 모니터링을 통해 차년도 계획의 내실과 효율적 업무 추진
 - 전문기관의 「기후위기 적응대책 이행점검」대행사업 추진을 통한 전문성 강화 및 세부사업의 지속적 성과 모니터링을 통한 계획의 내실과 효율적 업무추진(원주시 기후에너지과 - 한국기후변화연구원)

- 부문별 주요성과는 다음과 같음
 - 건강 부문

저소득층에게 의료급여지원을 통해 삶의 질 향상 및 합리적 의료이용을 할수 있도록 지원

공공의료기관 응급실 운영으로 군민의 안전한 의료 사회안전망 구축 기여

예방접종 실시로 감염병 발생을 예방하여 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상 기여
 - 농업 부문

향토어종 치어 방류로 내수면 수산자원 조성 및 생태계 보호

 - 물관리 부문

수도시설 개량을 통한 주민편의 증대
 - 물관리 부문

산불예방 및 방지로 산림자원과 국민재산 보호

노후 소화천을 정비하여 재해를 예방하고 친수환경을 조성하여 주민 생활 여건 향상
 - 재난/재해 부문

산림 여건변화에 대응한 맞춤형 조림으로 산주의 소득증대와 기후온난화 및 미세

▣ 산림/생태계 부문

저소득층에게 의료급여지원을 통해 삶의 질 향상 및 합리적 의료이용을 할수 있도록 지원

공공의료기관 응급실 운영으로 군민의 안전한 의료 사회안전망 구축 기여

예방접종 실시로 감염병 발생을 예방하여 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상 기여

▣ 적응/산업 부문

저소득층에게 의료급여지원을 통해 삶의 질 향상 및 합리적 의료이용을 할수 있도록 지원

공공의료기관 응급실 운영으로 군민의 안전한 의료 사회안전망 구축 기여

예방접종 실시로 감염병 발생을 예방하여 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상 기여

1) 지역 리스크 및 재해 저감 노력

- 국가 기후위기 적응대책 리스크 목록을 기반으로 발생가능성과 영향정도를 10점 척도로 산정하여 기후위기로부터 위험도가 높은 목록을 도출하였으며,

<표 2.13> 지역 기후위기 리스크 위험 순위

부 문	리스크 항목	발생가능성	영향척도	리스크 점수	리스크 순위
재난/재해	태풍에 의한 건강	9	9	81	1
농업	재배사육시설붕괴	8	9	71	2
건강	미세먼지에 의한 건강	8	9	72	3
건강	폭염에 의한 건강	8	9	72	4
재난/재해	폭설에 의한 기반시설	8	8	64	5

○ 리스크 저감을 위한 부문별 추진 세부이행과제는 다음과 같음

<표 2.14> 리스크 저감을 위한 부문별 추진 세부이행과제

부문	세부이행과제	세부내용	점검 등급
재난/재해	풍수해 보험 가입지원	태풍, 홍수, 지진 등의 풍수해로 발생하는 재산 및 인전피해 보상	매우 우수
	방문안전교육	안전취약 계층 재난/안전 방문교육	우수
	하천재해예방사업	하천정비를 통한 여름철 집중 호우발생 시 침수피해저감 및 친환경 하도정비	매우 우수
농업	비닐하우스 현대화지원사업	내재해형 표준시설 비닐하우스 설치를 통한 재해 예방 및 규모화·단지화 농업 발전모델 제시	보통
	시설원에 환경개선 지원	시설원에 시설 개·보수 및 현대화를 위한 기자재 지원	매우 우수
건강	감염병 관리사업	감염병감시활동, 역학조사, 감염병 예방요령 홍보교육	보통
	방역소독 사업	감염병 매개체 방제 및 오염원 소독을 통한 감염병 확산 예방	매우 우수
	폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보	폭염 및 한파대비 국민행동요령 홍보 및 안내	매우 우수
	경로당 운영지원	냉방기, 공기청정기 노후 교체 및 신설 경로당 지원	우수
	방문건강관리사업	건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스 제공 - 대상자 등록관리수 6,257명, 경로당 교육 113회	보통
	독거노인 중증장애인 응급안전 서비스	취약계층 24시간 모니터링 체계서비스 구축 운영	매우 우수

2) 지자체 선정 우수사례

사업명	건강 - 방역소독 사업					
적응부문	<input checked="" type="checkbox"/> 건강 <input type="checkbox"/> 재난/재해 <input type="checkbox"/> 농업업 <input type="checkbox"/> 산림/생태계 <input type="checkbox"/> 물관리 <input type="checkbox"/> 해양/수산 <input type="checkbox"/> 기후변화 감시/예측 <input type="checkbox"/> 교육홍보 <input type="checkbox"/> 국제협력 <input type="checkbox"/> 적응산업/에너지 <input type="checkbox"/> 기타(예: 적응기반, 교통, 관광 등)					
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기존 <input type="checkbox"/> 기존보완 <input type="checkbox"/> 기존확대 <input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 기타()					
사업성격	<input type="checkbox"/> 구조적(시설설치·조성·정비 등) <input checked="" type="checkbox"/> 비구조적(모니터링 및 유지관리, 자료구축·생산, 기술개발 등) <input type="checkbox"/> 사회적(법·제도 제정·정비, 교육·홍보 등)					
사업기간	2019년~2023년		사업예산		2,286 백만원	
연도별 추진경과	당초 목표	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
	2,336명	-	2,545	3,046	2,703	2,286
우수 내용						
사업개요	감염병 매개체 방제 및 오염원 소독을 통한 감염병 확산 예방					
추진실적 및 성과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 당초계획 - 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 100일 - 위생해충기피제 자동분사기 운영: 35대 ○ 추진현황 - 방역소독 대행업체 운영: 13개업체, 90일, 소독실시횟수: 2,169회 - 위생해충기피제 자동분사기 운영: 50대 해충유인살충기 18개소 67대 ○ 예산집행실적(90%) - 540백만원(집행) / 597백만원(계획) 					
성공요인 및 극복사항	<ul style="list-style-type: none"> - 감염병 매개체 방제 및 오염원 소독을 통한 감염병 확산 예방 - 방역소독 실시로 감염병 확산에 대한 지역주민 불안감 해소 					
대외확산 홍보실적	<ul style="list-style-type: none"> - 마을 주민 대표 회의 및 주민회의를 통한 복지사각지대 취약계층 발굴 - 시정보도 자료 매개체를 활용한 정책 적극 홍보 					
관련 증빙자료	<p>작성일 2023.04.10 조회수 436</p> <hr/> <p>원주시보건소, 하절기 방역소독 사업 추진</p> <hr/> <p>담당부서 보건행정과</p> <hr/> <p>문의전화 033-737-5393</p> <hr/> <p>-오는 10월까지 정화조, 하수관로 등 취약 지역 중점 소독</p> <p><input type="checkbox"/> 원주시는 이달 들어 기온이 상승함에 따라 모기 등 위생 해충이 활발해질 것으로 보고 감염병 매개체 방제를 위한 하절기 방역소독 사업을 추진한다고 밝혔다.</p> <p><input type="checkbox"/> 하절기 방역소독 사업은 시를 12개 권역으로 나눠 10월 말까지 방역소독 대행업체를 통해 진행된다.</p> <p><input type="checkbox"/> 특히, 모기, 파리와 같은 감염병 매개체가 다량 발생하기 쉬운 정화조, 하수관로 등 취약 지역을 중점적으로 소독한다.</p> <p><input type="checkbox"/> 혁신도시 수변공원, 기업도시 도오계 저수지, 단계전 등 민원 다수 발생지역에 대한 소독도 병행한다.</p> <p><input type="checkbox"/> 이와 함께, 산책로나 공원을 이용하는 시민들이 불편함을 겪지 않도록 해충기피제 자동분사기와 해충 포충기도 추가 설치할 예정이다.</p> <p><input type="checkbox"/> 김진희 보건소장은 "감염병의 원인이 되는 위생 해충의 방제를 통해 건강한 원주시를 만들도록 최선을 다하겠다."라며, "시민여러분도 모기 발생 예방을 위해 물이 고이기 쉬운 항아리, 물통, 대야 등을 뒤집어 두거나 뚜껑을 덮어두는 등 생활 방역에 동참해주길 바란다."라고 당부했다.</p>					

사업명	농업 - 시설원에 환경개선 지원																																																																																								
적응부문	<input type="checkbox"/> 건강 <input type="checkbox"/> 재난/재해 <input checked="" type="checkbox"/> 농업업 <input type="checkbox"/> 산림/생태계 <input type="checkbox"/> 물관리 <input type="checkbox"/> 해양/수산 <input type="checkbox"/> 기후변화 감시/예측 <input type="checkbox"/> 교육홍보 <input type="checkbox"/> 국제협력 <input type="checkbox"/> 적응산업/에너지 <input type="checkbox"/> 기타(예: 적응기반, 교통, 관광 등)																																																																																								
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기존 <input type="checkbox"/> 기존보완 <input type="checkbox"/> 기존확대 <input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 기타()																																																																																								
사업성격	<input type="checkbox"/> 구조적(시설설치·조성·정비 등) <input checked="" type="checkbox"/> 비구조적(모니터링 및 유지관리, 자료구축·생산, 기술개발 등) <input type="checkbox"/> 사회적(법·제도 제정·정비, 교육·홍보 등)																																																																																								
사업기간	2019년~2023년		사업예산		50백만원																																																																																				
연도별 추진경과	당초 목표	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년																																																																																			
	100%(예산집행을)	19%	100%	98%	99%	97%																																																																																			
우수내용																																																																																									
사업개요	기존 시설원에 생산 기반 시설에 고품질 생산을 위한 시설 신규 설치로 농업 안정화 실현 - 사업대상: 시설 재배에 종사하는 농업경영체 등록 농업인 - 시설원에 시설 개·보수 및 현대화를 위한 기자재 지원																																																																																								
추진실적 및 성과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 당초계획 - 시설원에 한경 개선: 3ha ○ 추진현황 - 시설원예환경개선: 3ha ○ 예산집행실적(97%) - 48백만원(집행) / 50백만원(계획) 																																																																																								
성공요인 및 극복사항	- 원예시설 내부 시설 설치 지원을 통한 시설원예 농가 경쟁력 향상 - 농업인 대학, 행정복지센터 등 주민자치회의시 농가참여를 위한 사업적극 홍보																																																																																								
대외확산 홍보실적	- 시정보도 자료 매개체를 활용한 정책 적극 홍보 - 시정 게시판, 농업인 대학, 행복복지센터의 사업 적극적 홍보로 농가참여 유도																																																																																								
관련 증빙자료	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">시설원에 환경개선 사업 정산검사 결과</p> <p>□ 관련법규 : 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제29조</p> <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022. 1. 12 ~ 2024. 1. 9 ○ 대 상 : 원주시 부론면 노원리 350, 한탄일 외 6 ○ 장 소 : 원주시 원천 ○ 보조금액 : 100,000,000원 (도비 15,000,000, 시비 35,000,000, 자부담 50,000,000) <p>□ 사업 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설원에 환경개선(환경시설, 양액제제시설 등) : 7농가 / 26동 ○ 사 업 비 : 103,520,000원 (도비 14,499,170, 시비 33,831,370, 자부담 55,189,460) <p>□ 사업비 집행 현황 (단위: 원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="2">예 산 액(교부액)</th> <th colspan="2">집 행 액</th> <th rowspan="2">집행률(%)</th> <th rowspan="2">이 과 발생액</th> <th rowspan="2">비 고</th> </tr> <tr> <th>금 액</th> <th>비율(%)</th> <th>금 액</th> <th>비율(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>100,000,000</td> <td>100</td> <td>103,520,000</td> <td>100</td> <td>1,669,460</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보조금</td> <td>50,000,000</td> <td>50</td> <td>48,330,540</td> <td>47</td> <td>1,669,460</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자부담</td> <td>50,000,000</td> <td>50</td> <td>55,189,460</td> <td>53</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>□ 정산검사 결과</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>검 정 항 목</th> <th>검사결과</th> <th>조치계획</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정산시기 적정 여부</td> <td>적정</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사업계획 변경</td> <td>예산 당초 보조금 신청(계획액) 집행 태도 사용여부</td> <td>적정</td> <td></td> </tr> <tr> <td>결산노역 여부</td> <td>적정</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">보조금 통상</td> <td>사업비의 당량여부(산정사) 입증금 내역 전체 표시한 통상 식료비출납부</td> <td>단정</td> <td></td> </tr> <tr> <td>통상 인출입자와 지출일자 일치 여부</td> <td>적정</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사립비 사용</td> <td>사업비 무관한 다른 비용과 혼용 사용여부</td> <td>적정</td> <td></td> </tr> <tr> <td>집행 잔액 만납액</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">회계 관리</td> <td>보조금 지출증명서유 구비 여부</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최정 집행 여부</td> <td>적정</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">과목 당</td> <td>최정 집행 여부</td> <td>적정</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보조금 교부조건 이행여부</td> <td>이행</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>사업 추진실적 증명자료 제출 여부</td> <td>제출</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 문제점 및 개선방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 없음 <p>□ 검토의견</p> <p>2023년 시설원에 환경개선 사업 정산결과 상기와 같이 적정하게 사업 이 추진되고 정산되었음을 보고합니다.</p> <p style="text-align: right;">정산 검사자 직급 지방농업서기 성명 김중현 (서명) 정산 확인자 직급 지방농업주사 성명 김용진 (서명)</p> </div> </div>						구 분	예 산 액(교부액)		집 행 액		집행률(%)	이 과 발생액	비 고	금 액	비율(%)	금 액	비율(%)	계	100,000,000	100	103,520,000	100	1,669,460	-		보조금	50,000,000	50	48,330,540	47	1,669,460	-		자부담	50,000,000	50	55,189,460	53	-	-		검 정 항 목	검사결과	조치계획	비고	정산시기 적정 여부	적정			사업계획 변경	예산 당초 보조금 신청(계획액) 집행 태도 사용여부	적정		결산노역 여부	적정		보조금 통상	사업비의 당량여부(산정사) 입증금 내역 전체 표시한 통상 식료비출납부	단정		통상 인출입자와 지출일자 일치 여부	적정		사립비 사용	사업비 무관한 다른 비용과 혼용 사용여부	적정		집행 잔액 만납액	-		회계 관리	보조금 지출증명서유 구비 여부	-		최정 집행 여부	적정		과목 당	최정 집행 여부	적정		보조금 교부조건 이행여부	이행			사업 추진실적 증명자료 제출 여부	제출	
구 분	예 산 액(교부액)		집 행 액		집행률(%)	이 과 발생액		비 고																																																																																	
	금 액	비율(%)	금 액	비율(%)																																																																																					
계	100,000,000	100	103,520,000	100	1,669,460	-																																																																																			
보조금	50,000,000	50	48,330,540	47	1,669,460	-																																																																																			
자부담	50,000,000	50	55,189,460	53	-	-																																																																																			
검 정 항 목	검사결과	조치계획	비고																																																																																						
정산시기 적정 여부	적정																																																																																								
사업계획 변경	예산 당초 보조금 신청(계획액) 집행 태도 사용여부	적정																																																																																							
	결산노역 여부	적정																																																																																							
보조금 통상	사업비의 당량여부(산정사) 입증금 내역 전체 표시한 통상 식료비출납부	단정																																																																																							
	통상 인출입자와 지출일자 일치 여부	적정																																																																																							
사립비 사용	사업비 무관한 다른 비용과 혼용 사용여부	적정																																																																																							
	집행 잔액 만납액	-																																																																																							
회계 관리	보조금 지출증명서유 구비 여부	-																																																																																							
	최정 집행 여부	적정																																																																																							
과목 당	최정 집행 여부	적정																																																																																							
	보조금 교부조건 이행여부	이행																																																																																							
	사업 추진실적 증명자료 제출 여부	제출																																																																																							



4. 적응대책 추진기반 조성 및 이행력 제고

1) 조례 제정을 통한 제도적 기반 마련

■ 탄소중립 녹색성장 기본조례

- 「기후위기 적응대책」의 수립·시행, 추진 계획의 점검 등 이행력 확보를 위하여 이를 포함한 「원주시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례 제정 (2022.5.20. 시행)
 - 원주시 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례」 시행(강원도 원주시 조례 제2101호(2022.5.20.))
- 원주시 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례」의 내용은 다음과 같음
 - 조례의 총칙
 - 온실가스 감축목표 및 계획
 - 지방 탄소중립 녹색성장위원회
 - 온실가스 감축 및 적응시책
 - 탄소중립 지역사회 이행과 확산

원주시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례
[시행 2022. 5. 20] [조례 제210호, 2022. 5. 20. 제정]



강일호 원주시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 및 같은 법 시행령에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하고, 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회로의 이행을 촉진하여 녹색성장을 활성화하는 것을 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) 원주시(이하 "시"라 한다)의 탄소중립 사회로의 이행 및 녹색성장은 다음 각 호의 기본원칙에 따라 추진되어야 한다.

1. 범지구적인 기후위기에 대한 종합적인 대응 전략으로서 탄소중립 사회로의 이행을 추진한다.
2. 경제·사회·환경 관련 모든 영역과 분야를 포괄적으로 고려하여 온실가스 감축 및 기후위기 적응 시책을 수립·시행한다.
3. 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 피해를 입을 수 있는 취약한 계층·부문·지역을 보호하는 등 정의로운 전이를 실현한다.
4. 녹색기술과 녹색산업에 대한 투자 및 지원을 강화함으로써 지역의 성장동력을 확충하고 일자리를 창출하는 기제로 활용하도록 한다.
5. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진 과정에서 모든 원주시민(이하 "시민"이라 한다)의 민주적 참여를 보장한다.

제3조(시의 책무) ① 시는 경제·사회·교육·문화 등 모든 부문에 제2조에 따른 기본원칙이 반영될 수 있도록 노력하여야 한다.

- ② 시는 지역적 특성과 여건 등을 고려하여 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 시책을 수립하고 이를 시행하여야 한다.
- ③ 시는 자신이 시행 주체가 되는 사업과 관련하여 발생하는 온실가스의 배출을 최소화하도록 노력하여야 한다.
- ④ 시는 「지방공기업법」 제49조에 따른 지방공사, 같은 법 제76조에 따른 지방공단, 사업자 및 시민이 온실가스를 효과적으로 감축하고 기후위기에 적응할 수 있도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.
- ⑤ 시는 온실가스 감축과 기후위기 적응 활동을 촉진하기 위하여 기후위기와 관련된 정보를 사업자 및 시민에게 제공하는 등 필요한 지원을 하도록 노력하여야 한다.

제4조(시민의 책무) ① 가정과 학교 및 사업장 등에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 "법"이라 한다) 제67조제1항에 따른 녹색생활을 적극 실천하고, 시의 시책에 참여하여 협력하여야 한다.

- ② 시민은 일상생활과 관련하여 발생하는 온실가스의 배출을 억제하기 위해 노력하여야 한다.

법제처	1	국가법령정보센터
-----	---	----------

4. 기본계획의 추진상황 점검 결과에 관한 사항
 5. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장에 관한 조례·행정계획에 관한 사항
 6. 법 제40조제1항에 따른 원주시 기후위기 적응대책(이하 "적응대책"이라 한다)의 수립·시행에 관한 사항
 7. 적응대책 추진상황의 점검에 관한 사항
 8. 그 밖에 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 시장은 별도로 위원회를 구성·운영하기 곤란한 경우에는 제2항 각 호의 사항을 강령도에 설치된 위원회에서 심의하도록 장원도지사에게 요청할 수 있다.

제10조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장 2명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다.

- ② 위원장은 원주시 부시장과 제3항제2호의 위원 중에서 시장이 지명하는 사람이 된다.
- ③ 위원회의 위원(이하 "위원"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장이 임명 또는 위촉한다.
 1. 시 소속 국장급 이상 공무원
 2. 원주시의회 의원의 탄소중립정책에 대한 식견과 경력이 풍부한 사람
 3. 기후과학, 온실가스 감축, 기후위기 예방 및 적응, 에너지·자원, 녹색기술, 녹색산업, 정의로운 전환 등 탄소중립 정책에 대한 식견과 경력이 풍부한 사람

제11조(위원회의 임기) 임명직 위원의 임기는 그 직에 재직하는 기간으로 하며, 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임 위원의 잔여 임기로 한다.

제12조(위원회의 해촉) 시장은 위촉위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解雇)할 수 있다.

1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제13조(위원회의 재직·기피·회피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 해당 사안의 당사자가 되거나 그 사건에 관하여 공중의 관리자 또는 의무자의 관계에 있거나 있었던 경우
 2. 위원이 해당 사안의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
 3. 위원이 해당 사안에 관하여 증언, 감정, 법률자문을 하거나 하였던 경우
 4. 위원이 해당 사안에 관하여 당사자의 대리인으로서 관여하거나 관여하였던 경우
- ② 위원에게 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 당사자는 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

법제처	2	국가법령정보센터
-----	---	----------

제5조(다른 조례와의 관계) 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진에 관하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다.

제2장 온실가스 감축목표 및 계획

제6조(온실가스 감축목표의 설정) ① 시는 전 지구적 기후위기 극복을 위하여 2050년까지 탄소중립을 달성하는 것을 비전(이하 "지역비전"이라 한다)으로 한다.

- ② 시는 기준연도와 목표연도를 정하고 원주시 중장기 온실가스 감축목표(이하 "감축목표"라 한다)를 수립하여 제7조제1항에 따른 원주시 탄소중립 녹색성장 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)에 포함하여야 한다.
- ③ 시장은 감축목표를 설정 또는 변경할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 지역비전
 2. 법 제8조제1항 및 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제3조제1항에 따른 중장기 국가 온실가스 감축목표
 3. 지역의 부문별 온실가스 배출·흡수 현황 및 전망
 4. 감축목표의 달성가능성
 5. 온실가스 감축 등 관련 기술 전망
 6. 해외 지자체 등 국제사회의 기후위기 대응 동향

제7조(탄소중립 녹색성장 기본계획의 수립 등) ① 시장은 법 제10조제1항에 따른 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획, 관할 구역의 지역적 특성 및 지역사회의 다양한 의견 등을 종합적으로 고려하여 법 제12조에서 정하는 바에 따라 10년을 계획기간으로 하는 원주시 탄소중립 녹색성장 기본계획을 5년마다 수립·시행하여야 한다.

- ② 시장은 확정된 기본계획을 공표하여야 한다.

제8조(계획의 추진상황 점검) 시장은 제7조제1항에 따른 기본계획의 추진상황과 주요 성과를 매년 점검하여야 한다.

제3장 지방탄소중립녹색성장위원회

제9조(2050 탄소중립녹색성장위원회의 구성·운영) ① 시의 탄소중립 사회 이행과 녹색성장의 추진을 위한 주요 정책 및 계획과 그 시행에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 시장 소속으로 원주시 2050 탄소중립녹색성장위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둘 수 있다.

- ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
 1. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 정책의 기본방향에 관한 사항
 2. 지역비전 및 감축목표의 설정에 관한 사항
 3. 기본계획의 수립·변경 등 그 시행에 관한 사항

법제처	1	국가법령정보센터
-----	---	----------

③ 위원이 제1항 각 호의 어느 하나에 따른 재직 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 연근의 심의에서 회피(回避)하여야 한다.

제14조(위원회의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄한다.

- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명된 위원이 그 직무를 대행한다.

제15조(회의) ① 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 때 또는 재직위원 3분의 1 이상의 회의 소집 요청이 있는 때에 위원장이 이를 소집한다.

- ② 위원회의 회의는 재직위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 전체지번 등 긴급한 사유로 대면회의가 불가능하거나 위원장이 안전이 경미하다고 인정하는 경우에는 서면으로 심의·의결 할 수 있다.

제16조(분과위원회) 위원회의 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우에 위원장이 위원회의 의결을 거쳐 정하는 바에 따라 분과위원회를 둘 수 있다.

제17조(위원회의 사무국) ① 위원회 및 분과위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 위원회 사무국을 둘 수 있다.

- ② 사무국에는 사무국장 1명과 필요한 사무직원을 둘 수 있다.
- ③ 사무국장은 위원장이 위원회의 의결을 거쳐 임명한다.

제18조(간사) 위원회 사무국을 두지 않을 경우 위원회 또는 위원회의 사무를 처리할 간사를 두며, 간사는 탄소중립 관련 업무담당 과장으로 한다.

제4장 온실가스 감축 및 적응 시책

제19조(지방 공공부문 목표관리 이행 지원) 시장은 관할구역에 위치한 법 제26조제1항에 따른 공공기관등이 같은 조 제1항 및 제2항에 따라 해당 기관별로 온실가스 감축목표를 준수할 수 있도록 지원할 수 있다.

제20조(신·재생에너지 전환) ① 시장은 관할구역 내 에너지 절약 및 신·재생에너지로의 에너지 전환 시책을 수립·시행하여야 한다.

- ② 시장은 도로·교통·항만 등 공공기반시설물과 운동장·체육관·문화회관 등 다중이용시설물에 대한 에너지 절감시설 및 신·재생에너지시설 보급·이용을 촉진하여야 한다.

제21조(녹색건축물의 활성화) ① 건축물의 신축 등을 하는 자와 기존 건축물의 소유자는 법 제31조제1항에 따른 녹색건축물의 활성화를 위하여 시장이 정하는 기준·절차를 따로도록 노력하여야 한다.



- ② 시장은 녹색건축물의 활성화를 위하여 제1항의 기준·절차를 준수하는 자에게 행정적·재정적·기술적 지원을 할 수 있다.

법제처	3	국가법령정보센터
-----	---	----------

<그림 2.5> 원주시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례

▣ 원주시 폭염 피해 예방 조례


- 원주시는 폭염의 장기화에 따른 시민의 생명과 건강의 피해를 최소화 하기 위해 「원주시 폭염 피해 예방 조례(원주시 조례 제1993호)」를 제정하여 시행 중에 있음(2021.5.28.)
- 조례의 주요 내용은 다음과 같음
 - 조례의 목적 및 정의
 - 폭염저감시설의 종류
 - 시장과 시민의 책무
 - 폭염 예방계획의 수립 및 예방사업
 - 무더위 쉼터 및 폭염취약계층 지원사업
 - 협력체계 구축

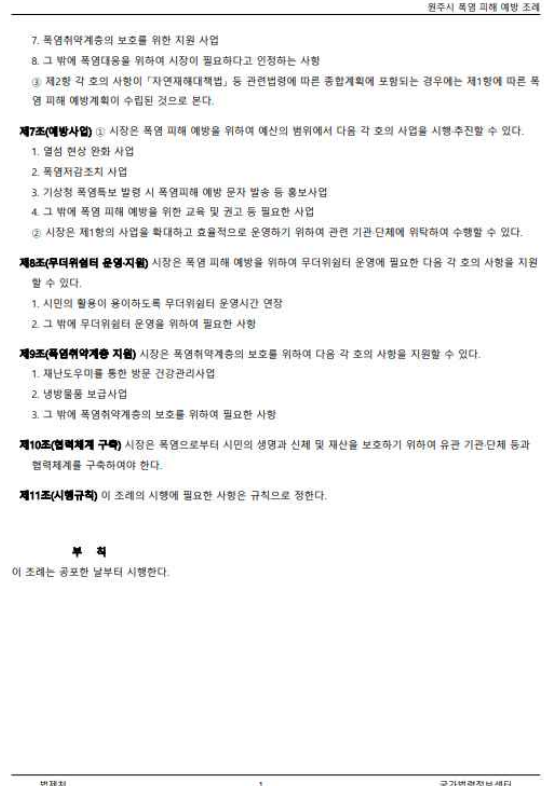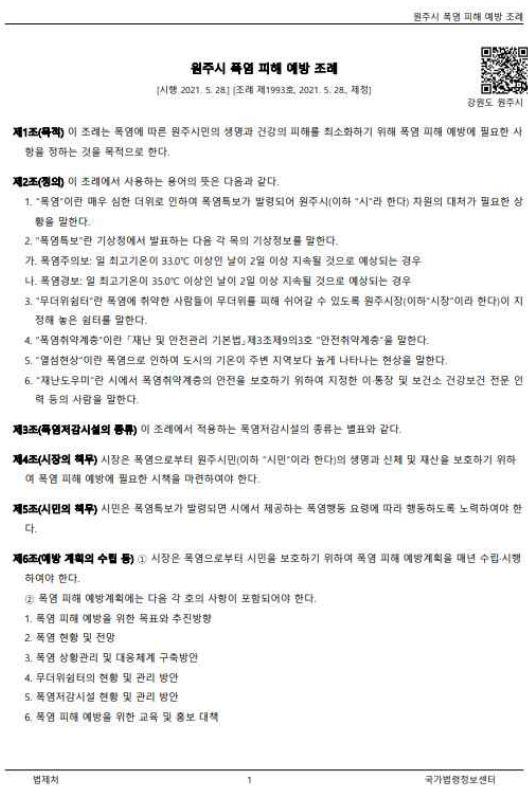

<그림 2.6> 원주시 폭염 피해 예방 조례

■ 원주시 기후변화 홍보관 설치 및 운영조례

- 시민의 저탄소 녹색성장에 대한 홍보 교육을 통한 녹색생활 실천 유도 및 기후위기에 대한 영향과 피해를 최소화 하기 위해 「원주시 기후변화홍보관 설치 및 운영 조례(원주시 조례 제17868호)를 제정하여 시행하고 있으며,
- 기후변화 홍보관의 주요 업무는 다음과 같음
 - 기후변화 전시 및 체험프로그램 운영
 - 전시 및 체험을 통한 시민 환경의식 제고
 - 어린이, 청소년 등에게 살아 있는 환경교육의 장 제공
 - 기후변화 정보 제공 및 정책 홍보
 - 그 밖에 기후변화 홍보를 위하여 필요한 사업

원주시 기후변화홍보관 설치 및 운영 조례	원주시 기후변화홍보관 설치 및 운영 조례
<p style="text-align: center;">원주시 기후변화홍보관 설치 및 운영 조례 (시행 2018. 4. 13) [조례 제1686호, 2018. 4. 13. 일부개정]</p> <div style="text-align: right;">  강원도 원주시 </div> <p>제1조(목적) 이 조례는 「저탄소 녹색성장 기본법」, 제5조와 관련하여 저탄소녹색성장에 대한 홍보·교육을 통한 녹색 생활 실천을 유도하기 위해 원주시 기후변화홍보관을 설치하고 그 관리 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p> <p>제2조(위치) 원주시 기후변화홍보관(이하 "홍보관"이라 한다)은 원주시 행구로 362에 설치한다.</p> <p>제3조(사업 및 기능) 홍보관은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 기후변화 전시 및 체험프로그램 운영 2. 전시 및 체험을 통한 시민 환경의식 제고 3. 어린이, 청소년 등에게 살아 있는 환경교육의 장 제공 4. 기후변화 정보 제공 및 정책 홍보 5. 그 밖에 기후변화 홍보를 위하여 필요한 사업으로서 원주시장(이하 "시장"이라 한다)이 별도로 정하는 사항</p> <p>제4조(관할료 등) 홍보관의 관할료는 무료로 한다. 다만, 시장은 체험학습 프로그램 등에 필요한 재료비 등에 대해서는 참여 수강생에게 비용을 부담하게 할 수 있다.</p> <p>제5조(이용 및 관람시간) ① 홍보관의 관람시간은 오전 9시부터 오후 6시까지 지로 한다. ② 시장은 필요하다고 인정할 때에는 제1항의 관람시간을 조정 할 수 있다. 이 경우 조정 내용을 미리 공지하는 등 필요한 조치를 해야 한다.</p> <p>제6조(유관) 홍보관의 휴관일은 다음 각 호와 같다. 1. 매주 월요일, 1월 1일, 설날 및 추석 연휴 2. 홍보관의 안전 점검이나 보수를 위하여 필요한 경우 3. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 경우</p> <p>제7조(관람금지 및 행위 제한) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에는 관람을 제한할 수 있다. 1. 술에 취하여 남에게 혐오감을 주는 자 2. 보호자를 동반하지 아니한 6세 미만의 영유아 3. 인화물질 및 위험물, 흉기 등을 소지하거나 동물을 동반한 사람. 다만, 「장애인 복지법」 제40조제3항에 따라 보조견 표지를 붙인 장애인 보조견의 동반은 예외로 한다. 4. 그 밖에 전시물 등의 보호 또는 관람질서유지를 위하여 제한이 필요하다고 인정하는 자 ② 관람자는 홍보 체험관 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 전시물에 손상을 주는 행위</p>	<p>2. 출연·고성방가 난무 등 다른 관람자에게 지장을 주는 행위 3. 그 밖에 관람에 영향을 준다고 판단하는 행위 ③ 시장은 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 자에게 행위 중지를 요청하여도 따르지 아니할 경우에는 관람거부 또는 퇴장을 명할 수 있다.</p> <p>제8조(변상책임) 관람자가 홍보관의 전시물이나 시설을 등을 고의 또는 과실로 파손·훼손하였을 때에는 즉시 원상 복구하거나 실 비로 변상하여야 한다.</p> <p>제9조(운영 및 위탁관리) ① 시장은 홍보관의 효율적인 운영·관리를 위하여 환경 및 기후변화 대응과 관련하여 연구·조사·교육·홍보·실천운동의 활동을 하는 비영리법인, 전문기관, 단체에 위탁하여 운영 관리하게 할 수 있다. ② 위탁기관 선정절차, 방법, 위탁관리기간 등 그 밖에 위탁관리 및 운영에 필요한 사항은 「원주시 사무의 민간위탁 기본조례」에 따른다. <개정 2018.4.13.> ③ 시장은 홍보관의 운영 및 관리에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. ④ 시장은 위탁기관에게 위탁사무의 수행에 필요한 범위에서 공유재산을 무상으로 사용할게 할 수 있다.</p> <p>제10조(수탁기관의 의무) ① 수탁기관은 제3조의 업무를 성실히 수행해야 하며, 불공정한 사무처리 및 비용 등의 부당 징수 행위를 하 여서는 안 된다. ② 수탁기관은 원주시의 사전 동의 없이 시설물의 원형을 임의로 변경해서는 안 된다. ③ 수탁기관은 관계 법령과 이 조례의 규정을 준수해야 한다.</p> <p>제11조(지도·감독) ① 시장은 수탁기관에 대해 위탁사무의 처리와 관련하여 필요한 사항을 보고하게 하거나 위탁업무 지도·감독에 필요한 서류, 시설 등을 검사할 수 있다. ② 시장은 제1항의 검사결과 위탁사무 처리가 위법 또는 부당하다고 인정될 때에는 시정을 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.</p> <p>제12조(위탁계약의 해지 등) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 1. 수탁기관이 법령이나 이 조례의 규정을 위반하는 경우 2. 수탁기관이 위탁계약상의 의무 등을 위반한 경우 3. 수탁기관이 위탁사무를 수행할 능력이 없다고 인정될 경우 ② 시장이 제1항에 따라 위탁을 해제 또는 해지하려는 경우에는 사전에 수탁기관에 의견진술의 기회를 주어야 한다.</p> <p>제13조(준용규정) 이 조례에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 「원주시 공유재산 관리 조례」 및 「원주시 재무회계 규칙」을 준용한다.</p> <p>제14조(시행규칙) 이 조례 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.</p>
법제처 1 국가법령정보센터	법제처 1 국가법령정보센터

<그림 2.7> 원주시 기후변화 홍보관 설치 및 운영 조례

2) 위원회 및 탄소중립지원센터 운영

■ 탄소중립 녹색성장위원회 구성·운영

- 우리 시의 탄소중립 녹색성장 기본조례 제9조(2050 탄소중립 녹색성장위원회의 구성·운영) 및 제10조(위원회의 구성)에 의해 차년도인 2024년 구성계획 중에 있음

○ 주요기능


- 탄소중립 사회 이행과 녹색성장의 추진을 위한 주요 정책 및 계획과 그 시행에 관한 사항을 심의·의결권을 가짐
- 위원회의 심의·의결 사항은 다음과 같음
 - 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 정책의 기본방향에 관한 사항
 - 원시시 탄소중립 비전 및 감축목표의 설정에 관한 사항
 - 기본계획의 수립·변경 및 그 시행에 관한 사항
 - 기본계획의 추진상황 점검 결과에 관한 사항
 - 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장에 관한 조례·행정계획에 관한 사항
 - 법 제40조제1항에 따른 춘천시 기후위기 적응대책(이하 “적응대책”이라 한다)의 수립·시행에 관한 사항
 - 적응대책 추진상황의 점검에 관한 사항
 - 그 밖에 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
 - 위원회를 구성·운영하기 곤란한 경우에는 제2항 각 호의 사항을 강원도에 설치된 위원회에서 심의

▣ 탄소중립 지원센터 지정·운영

- 우리 시는 지역의 탄소중립 이행 및 지역 맞춤형 탄소중립 사업발굴, 탄소중립 관련계획의 수립지원을 위하여 관내 전문기관을 지정하여 탄소중립지원센터를 운영 중에 있음
 - 지정기관: 상지대학교(전용환 센터장)
 - 지정기간: 2023. 7. 1. ~ 2026. 6 .30.(3년 간)



(a) 원주시 탄소중립지원센터 추진전략 및 비전

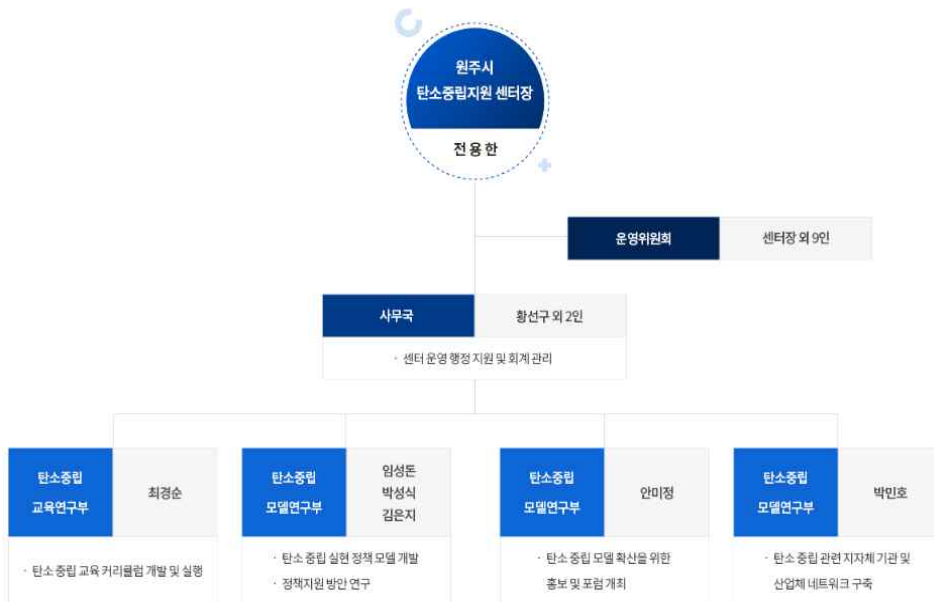

(b) 원주시 탄소중립지원센터 조직도

<그림 2.8> 원주시 탄소중립지원센터 추진전략 및 조직도

수신 상지대학교총장
(경유)

제목 원주시 탄소중립지원센터 지정서 교부

1. 귀 기관의 발전을 기원합니다
2. 원주시 기후에너지과-913(2023.6.20)호와 관련하여 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제68조 및 같은 법 시행령 제63조에 따라 귀 기관을 '원주시 탄소중립지원센터'로 지정하고 지정서를 붙임과 같이 교부 하고자 합니다.

□ 원주시 탄소중립지원센터 지정

- 가. 지정기관 : 상지대학교
- 나. 대 표 자 : 유만희
- 다. 소 재 지 : 원주시 상지대길 83
- 라. 지정기간 : 2023. 7. 1 ~ 2026. 6. 30 (3년)
- 마. 지정서 전달 : 2023.6.28(수) 09:00, 원주시 전달 (원주시청)

붙 임 : 지정서 1부, 끝.

원 주 시 

기후에너지과 2023. 6. 21.
 기후에너지과장 **박영민** 장 **서영미**
 협조자
 시행 기후에너지과-1076 (2023. 6. 21.) 관수
 우 26384 강원특별자치도 원주시 서흥로 1, (무일동, 원주시청) / http://www.wonju.go.kr
 전화번호 033-737-3171 팩스번호 033-737-4969 / won425@korea.kr / 대국민 공개
 원주시 공무원의 창작금지범을 준수합니다.


제 1 호

원주시 탄소중립 지원센터 지정서

1. 기 관 명: 상지대학교
2. 대 표 자: 유만희
3. 소 재 지: 원주시 상지대길 83
4. 지정기간: 2023. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. (3년)

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제68조 및 같은 법 시행령 제63조에 따라 위 기관을 원주시 탄소중립 지원센터로 지정합니다.

2023년 6월 28 일

원 주 시 

(a) 원주시 탄소중립지원센터 지정알림 공문(원주시 기후에너지과-1076호)

(b) 원주시 탄소중립지원센터 지정서(상지대학교)

<그림 2.9> 원주시 탄소중립지원센터 지정 알림(상지대학교)

3) 지역전문가·주민참여단 구성운영실적

- 해당분야의 경력 및 이력 등을 고려하여 차년도(2024) 지역 주민참여단 및 전문가를 구성 예정 중에 있으며, 이에 대한 절차는 다음과 같음.

전문가 및 주민참여단 구성 절차	주요일정	내 용
지역전문가 및 주민참여단 구성 공고	4~5월	광역 탄소중립지원센터 또는 전문기관 업무협조
전문가 및 주민참여단 구성 확정(전문가 및 주민참여단 각 4명)	6월	- 부문별 전문가 4명 - 지역주민 참여단 4명
기후위기 적응 역량강화 교육 - 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 - 전문가 및 주민참여단 역할	7월~익년 1월	광역 탄소중립지원센터 또는 전문기관 업무협조
운영회의 개최 - 적응대책의 수립지원 - 적응대책의 이행점검 및 우수사례 추천 - 지역주민체감형 세부과제 발굴	익년 2월~ 3월	- 전문가 평가 + 시민 평가 - 평가서 전달, 인식도 조사(사후)

<그림 2.6> 전문가 및 주민참여단 구성 절차 및 내용

- 지역전문가 및 주민참여단 운영은 구성일로부터 1년이며, 역할은 다음과 같음
 - 세부이행과제의 성과목표 적절성, 유효성 등을 검토
 - 적응대책의 수립(보완) 지원 및 세부이행과제의 발굴
 - 지자체 선정 우수사례 및 적응대책 효과성 분석을 위한 이행점검 내용 검토
 - 중점분야 선정 및 취약계층의 “지역주민 체감형” 과제 발굴 및 만족도가 높은 세부이행 과제 선정
 - 기후위기로 인한 영향 및 피해 최소화를 위한 사업의 지속적 발굴 추진

○ 협의체 운영체계도

<표 2.15> 제2차 기후위기 적응대책 이행협의체 구성·운영

구 분	주관부서	추진/소관부서
1. 건강	기후 에너지과	의료지원과, 건강증진과, 생활보장과, 경로장애인과, 보건행정과, 위생과, 안전총괄과
2. 농업		농촌자원과, 농업기술과, 농정과, 로컬푸드과, 축산과
3. 물관리		수도과, 환경과
4. 재난/재해		안전총괄과, 생태하천과, 하수과
5. 산림/생태계		산림과, 공원녹지과, 환경과, 생태하천과
6. 적응 프라		기후에너지과, 환경과
전문가		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 원주기후변화대응 교육연구센터 제현수 사무국장 ▪ 한국기후변화연구원 박수진 연구위원

4) 우수사례

- 기후위기로부터 위험도가 높은 리스크 목록을 기반으로 피해저감 노력정도가 높은 사업을 선정하여 전문가 검토를 통하여 우수사례 3건 선정
 - 건강: 방역소득 사업(보건행정과) / 리스크 목록: 태풍에 의한 건강 외
 - 농업: 시설원예 환경개선 지원(로컬푸드과) / 리스크 목록: 재배사육시설 붕괴
 - 건강: 폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내 / 리스크 목록: 폭염에 의한 건강

제 3 장

조치 및 관리계획

제 1 절 전년도 이행점검 조치결과

제 2 절 당해연도 조치계획

제 3 장

조치 및 관리계획



1. 미흡 및 미추진 과제 등에 대한 전년도 조치결과

- 전년도 “미흡” 및 “미추진” 보인 이행과제의 5차년도 조치결과는 다음과 같음

<표 3.1> 전년도 세부사업 조치계획

부문	세부사업명	전년도 조치계획	당해연도 조치결과	당해연도 최종점검
미흡 (7)	【I-2-가-1】 식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	사업수요조사를 통한 계획변경 및 성과목표 조정	수요조사를 통한 적정예산 확보 및 성과지표 조정	매우 우수
	【I-2-나-2】 경로당 운영지원	사업 성과지표 조정 사업추진계획 변경	사업추진계획 변경	우수
	【II-1-나-2】 비닐하우스 현대화 사업	사업여건 진단을 통한 성과 지표 조정	추진계획 변경 및 성과지표 조정	보통
	【II-1-나-4】 사과 명품과원 조성 지원	사업 지속적 홍보 및 추진계획 변경	추진계획 변경 및 성과지표 조정	보통
	【I-1-나-1】 지방상수도(급·배수 관) 확충사업	사업공정을 조정으로 추진계획 변경	행정절차 진행으로 사업 정상추진	매우 우수
	【III-1-가-1】 먹는물 공동시설 소규모 개선사업	사업여건 진단을 성과 지표 조정	사업연기로 인해 사업미추진	미추진
	【V-2-가-3】 생태계교란생물 퇴치사업	사업수요조사를 통한 추진계획 변경	추진여건 진단을 통한 성과지표 조정	매우 우수
미추진 (3)	【I-1-가-1】 저소득층 검진사업	차년도의 사업예산 미확보로 미추진	사업종료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)

부문	세부사업명	전년도 조치계획	당해연도 조치결과	당해연도 최종점검
	【I-2-나-1】 무더위쉼터 냉방비 지원	코로나 19 대응 단계에 따른 사업 단계적 추진	사업시행 소관부서의 여건 진단을 통한 사업삭제	미추진
	【II-2-가-2】 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업	사업계획 및 변경을 통한 정상추진	사업종료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
사업 종료 (12)	【II-1-가-3】 신품종 버섯 지역적응 재배 시범사업	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【II-1-가-4】 기후변화대응 양파 기계화 생력재배 시범	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【II-2-가-5】 폭염대응 시설채소 온도저감 기술	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【II-1-나-3】 과수 생력화 작업기 지원	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	사업내용이 유사한 사업으로 통폐합	미추진
	【II-2-가-1】 폭염 등 재해대비 축산시설 구조개선	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【II-2-가-2】 거점소득세척시설 추가 설치	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【IV-1-가-1】 무진 재해위험개선지구 정비사업	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【IV-1-가-2】 봉산 재해위험개선지구 정비사업	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【V-1-가-2】 문막일반산업단지 미세먼지 저감숲 조성	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【V-1-나-4】 미세먼지저감 조림사업	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【VI-1-가-1】 저소득층 에너지효율 개선(WAP)사업	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)
	【VI-1-가-4】 어린 이 체험교육	사업추진완료에 따른 차년도 사업삭제	전년도 사업추진완료로 당해연도 사업삭제 (이행점검 대상 제외)	사업삭제 (추진완료)



2. 미흡 및 미추진 과제 등에 대한 당해연도 조치계획

- 5차년도(2023년) 이행점검 결과, 미추진을 보인 3개 세부이행과제에 대한 조치계획은 다음과 같음

<표 3.2> 당해연도 자체점검결과 조치계획

구 분	세부과제명	조치사항	차년도 조치계획
미흡 (1)	【I-1-가-1】 저소득 주민 최저생활 보장 급여지급	기초수급자 증가에 따른 예산증액	제3차 적응대책 수립 시, 예산증액
미추진 (3)	【I-2-나-1】 무더위 쉼터 냉방비 지원	사업추진 여건 조사 결과 기대효과 미흡	차년도 수립 중인 3차 적응대책의 세부사업 일몰
	【II-1-나-2】 과수생력화 작업기 지원	사업수요조사의 기대효과 미흡으로 차년도 사업 일몰	차년도 수립 중인 3차 적응대책의 세부사업 일몰
	【II-1-나-4】 먹는물 공동시설 소규모 개선 사업	지방상수도 보급 확대에 따른 지하수 이용가 저조 이에 사업일몰	차년도 수립 중인 3차 적응대책의 세부사업 일몰

제 4 장

차년도 시행계획

제 1 절 변경 주요내용

제 2 절 차년도 변경 과제 목록

적응대책 변경



1. 변경 주요내용

- 건강 외 6개 부문에 대한 5차년도 추진 세부사업은 총 39개 사업(미추진 3개)대상 이행점검
- 이행점검 결과 “미추진”을 보인 세부사업에 대해서는 사업에 대한 수요 및 여건조사를 통하여 당해연도 수립 중인 3차 적응대책과 연계하여 사업 일몰
- “보통” 이하 등급을 보인 이행과제에 대해서는 소관부서의 협의를 통해 성과목표 조정 및 사업 추진에 대한 여건 분석으로 당해연도 3차 적응대책의 보완으로 성과 목표달성제고 노력
- 적응대책의 거버넌스 강화를 위하여 민간위원을 포함한 이행협의체 활성화하고 그 기능을 강화하여 적응대책 수립단계부터 참여를 통한 지역특성 및 여건에 맞는 사업발굴
- 전문가 및 주민참여단의 지속적 운영으로 적응대책 수립 지원 및 이행점검의 시민참여를 통하여 우수사례 발굴, 세부이행과제의 성과목표 적설성 등 세부사업에 대한효과 분석
- 담당직원의 기후위기 적응대책 직무역량 강화를 위한 교육 프로그램 확대(연 1회 이상 개최)하여 적응대책수립의 참여의식 제고



2. 차년도 변경(신규, 삭제, 조정) 과제 목록

- 제2차 적응대책의 55개 세부이행과제 대한 이행점검 결과를 기반으로 하여 사업추진에 대한 한계점을 진단하여 당해연도 수립 중인 3차 적응대책에 연계하여 수립
- 제2차 적응대책의 55개 세부이행과제 중 “우수” 이상을 보인 사업에 대해서는 지속적으로 확산하고 “미흡” 및 “미추진”을 보인 세부과제에 대한 차년도 변경내용은 다음과 같음

<표 4.1> 차년도 추진세부사업 목록

총개수	변경 유형	부분 과제수	세부이행과제명 (부문-사업번호)	변경내용			
				과제 유형	당초계획	변경계획	사유
미흡	조정	건강 (1)	저소득 주민 최저생활 보장 급여지급 (I-1-가-3)	기존	기초수급자 증가에 따른 예산증액	제3차 적응대책 수립 시, 예산증액	2차적응대책 수립기관 만료에 따른 적응대책 재수립(3차)
미추진	삭제	건강 (1)	무더위 쉼터 냉방비 지원 (I-2-나-1)	기존보완	사업재검토에 따른 일몰	제3차 적응대책의 세부사업 일몰	2차적응대책 수립기간 만료에 따른 적응대책 재수립(3차)
		농업 (1)	과수생력화 작업기 지원 (II-1-나-3)	기존	사업내용이 유사한 사업으로 통폐합	제3차 적응대책의 세부사업 일몰	
	물관리 (1)	먹는물 공동시설 소규모개선사업 (III-2-라)	기존	지방상수도 보급확대에 따른 지속적 사업미추진으로 사업삭제	제3차 적응대책의 세부사업 일몰		

부 록

1. 제2차 기후위기적응대책 세부사업 목록
2. 부문별 세부사업 점검 결과

▣ 제2차 기후위기적응대책 세부사업 목록

적응분야	과제번호	세부과제	사업추진여부	담당부서
건강	1-1-가-1	저소득층 검진사업	추진완료	의료지원과
	1-1-가-2	방문건강 관리사업	정상추진	건강증진과
	1-1-가-3	저소득 주민 최저생활 보장급여지급	정상추진	생활보장과
	1-1-가-4	독거노인, 중증장애인 응급안전 서비스	정상추진	경로장애인과
	1-1-나-1	농촌맞춤형 건강교실	정상추진	보건행정과
	1-1-나-2	예방접종사업	정상추진	의료지원과
	1-2-가-1	식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	정상추진	위생과
	1-2-가-2	감염병 관리사업	정상추진	보건행정과
	1-2-가-3	방역소득사업	정상추진	보건행정과
	1-2-나-1	무더위쉼터 냉방비 지원	미추진	안전총괄과
	1-2-나-2	경로당 운영지원	정상추진	경로장애인과
	1-2-나-3	폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내홍보	정상추진	안전총괄과
농업	2-1-가-1	품목농업인연구회 전문능력 활성화	정상추진	농촌자원과
	2-1-가-2	작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업	추진완료	농촌자원과
	2-1-가-3	신품종 버섯 지역적응 재배 시범사업	추진완료	농업기술과
	2-1-가-4	기후변화대응 양파 기계화 생력재배 시범	추진완료	농업기술과
	2-1-가-5	폭염대응 시설채소 온도저감 기술시범	추진완료	농업기술과
	2-1-가-6	기후변화대응 지역 특화작목 육성	정상추진	농업기술과
	2-1-나-1	가뭄대비 중소형 관정 개발사업	정상추진	농정과
	2-1-나-2	비닐하우스 현대화 사업	정상추진	로컬푸드과
	2-1-나-3	과수 생력화 작업기 지원	미추진	로컬푸드과
	2-1-나-4	사과 명품과원 조성 지원	정상추진	로컬푸드과
	2-1-나-5	시설원에 환경개선 지원	정상추진	로컬푸드과
	2-2-가-1	폭염등 재해대비 축산시설 구조개선	추진완료	축산과
	2-2-가-2	거점소독세척시설 추가설치	추진완료	축산과
	2-2-가-3	가축질병 예방체계 구축(공동방제단 운영)	정상추진	축산과
물관리	3-1-가-1	지방상수도(급배수관) 확충사업	정상추진	수도과
	3-1-가-2	마을(소규모) 수도시설 설치 및 개보수 사업	정상추진	수도과
	3-1-가-3	먹는물 공동시설 소규모 개선사업	미추진	환경과
	3-1-가-4	상수도 급수구역 블록시스템 구축	정상추진	수도과
	3-1-나-1	비점오염저감시설 운영관리	정상추진	환경과

적응분야	과제번호	세부과제	사업추진여부	담당부서
재난/재해	4-1-가-1	무진 재해위험개선지구 정비사업	추진완료	안전총괄과
	4-1-가-2	봉산 재해위험개선지구 정비사업	추진완료	안전총괄과
	4-1-가-3	풍수해보험 가입지원	정상추진	안전총괄과
	4-1-가-4	방문안전교육	정상추진	안전총괄과
	4-2-가-1	재난대응 안전한국훈련 실시	정상추진	안전총괄과
	4-2-가-2	원주천 댐 건설사업	정상추진	생태하천과
	4-2-가-3	하천 재해예방 사업	정상추진	생태하천과
	4-2-가-4	원주시 노후관로 정비사업	추진완료	하수과
산림 생태계	5-1-가-1	산불방지대책	정상추진	산림과
	5-1-가-2	산림병해충 방제	정상추진	산림과
	5-1-가-3	산림재해방지 사방사업 확충	정상추진	산림과
	5-1-나-1	숲가꾸기 사업	정상추진	산림과
	5-1-나-2	문막일반산업단지 미세먼지 저감숲 조성	추진완료	공원녹지과
	5-1-나-3	명품가로숲길 조성사업	추진완료	공원녹지과
	5-1-나-4	미세먼지저감 조림사업	추진완료	산림과
	5-2-가-1	단계천 생태하천 복원사업	정상추진	생태하천과
	5-2-가-2	원주천 생태하천 모니터링	추진완료	생태하천과
	5-2-가-3	생태교란생물 퇴치사업	정상추진	환경과
적응인프라	6-1-가-1	저소득층 에너지효율 개선(WAP)사업	추진완료	기후에너지과
	6-1-가-2	기후변화,에너지 관련 시설 위탁운영	정상추진	기후에너지과
	6-1-가-3	시민참여형 기후변화대응행사 등 운영	정상추진	기후에너지과
	6-1-가-4	어린이 체험교육	추진완료	환경과
	6-1-가-5	기후변화대응 교육프로그램 운영	정상추진	기후에너지과
	6-1-가-6	미세먼지 저감 사업(자동차 분야)	정상추진	기후에너지과

1 [건강 1-1] 12개 세부사업 (사업 종료)

의료지원과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-1-가-1	저소득층 검진사업	기존	'19 ~ 20	

□ 사업개요

- 질환의 조기발견과 치료로 신체적 건강 유지 및 건강취약계층 삶의 질 향상
- 유병율이 높은 질환의 조기검진으로 경제적 부담 완화 및 질환에 대한 올바른 지식 제공

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 골다공증, 동맥경화, 갑상선질환검진 4,800명 • 전립선질환검진 2,250명 	<ul style="list-style-type: none"> • 골다공증, 동맥경화, 갑상선질환검진 4,800명 • 전립선질환검진 2,250명
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 골다공증, 동맥경화, 갑상선질환검진 4,800명 • 전립선질환검진 2,250명 	<ul style="list-style-type: none"> • 전립선질환검진 64명
2021	사업 종료	사업종료
2022	사업 종료	사업종료
2023	사업 종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 건강검진 지원(명))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	141	163	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		141	1	-	-	-
성과	계획	당해년도	7,050	7,050	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		7,050	64	-	-	-
목표 달성도(%)			100%	0.9%	-	-	-

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 사업종료
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 사업종료
- 성과지표 조정사항
 - 사업종료

1 [건강 1-2]

건강증진과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-1-가-2	방문건강관리사업	기존	'19 ~ 23	김나형 (4052)

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 건강취약계층
- 사업내용: 대상자 등록 및 방문건강관리서비스 제공, 경로당 등 집단 건강관리, 지역사회 자원 연계 등
- 사업예산: 653백만원(국비 및 기금 280, 도비 64, 시비 309)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 12,496회, 경로당 교육 425회	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 11,551회, 경로당 교육 459회
2020	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 12,496회, 경로당 교육 425회	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 9,237명, 경로당 교육 45회 (코로나19 발생으로 전화관리로 일시전환)
2021	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 12,496회, 경로당 교육 425회	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 7,457명, 경로당 교육 7회 (코로나19 발생으로 경로당 교육 일시중단)
2022	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 12,496회, 경로당 교육 425회	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 7,087명, 경로당 교육 64회
2023	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스제공 - 대상자 등록관리수 12,921명, 경로당 교육 425회	• 건강취약계층 방문건강 등록관리, 서비스 제공 - 대상자 등록관리수 6,257명, 경로당 교육 113회

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 방문건강 관리자 수 및 경로당교육(건))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	653	653	653	696	653
	실적		653	662	653	620	652
성과	계획	당해년도	12,921	12,921	8,000	8,000	12,921
	실적		12,010	9,282	7,457	7,087	6,257
목표 달성도(%)			92.9	71.8	93.2	88.9	48.4

□ 2023년도 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 만성질환 관리 및 건강행태 개선 노력으로 의료접근성이 떨어지는 취약계층의 삶의 질 개선
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	방문등록관리자수
	실적 / 계획	6,257 / 12,921
	달성률(%)	48.4%
예산집행 노력	실적 / 계획	652 / 653
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		지역보건의료정보시스템 및 내부 보고자료
최종점검		보통(12.5)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당 없음
- 성과지표 조정사항
 - 지표단위 설명 정정 및 지표값 조정(명)

1 [건강1-3]

생활보장과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-1-가-3	저소득 주민 최저생활 보장 급여 지급	기존	'19 ~ 23	박성준 (2662)

□ 사업개요

- 목 적 : 국민기초생활보장법에 의하여 생활이 어려운 자에게 필요한 급여를 행하여 이들의 최저생활을 보장
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 기초생활보장 대상자에 대한 기초 및 부가급여 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 기초생활보장 대상자에 대한 기초·부가급여 적기지급	• 생계급여 6,081가구 29,505백만 원 • 교육급여 2,403명 145백만 원 • 해산장제급여 326명 232백만 원
2020	• 기초생활보장 대상자에 대한 기초·부가급여 적기지급	• 생계급여 6,216가구/32,530백만 원 • 교육급여 2,383명/26백만 원 • 해산장제급여 360명/285백만 원
2021	• 기초생활보장 대상자에 대한 기초·부가급여 적기지급	• 생계급여 6,981가구/40,211백만 원 • 교육급여 2,997명/27백만 원 • 해산장제급여 389명/308백만 원
2022	• 기초생활보장 대상자에 대한 기초·부가급여 적기지급	• 생계급여 7,841가구/42,694백만 원 • 교육급여 3,008명/44백만 원 • 해산장제급여 518명/413백만 원
2023	• 기초생활보장 대상자에 대한 기초·부가급여 적기지급	• 생계급여 8,027가구/47,142백만 원 • 교육급여 2,895명/45백만 원 • 해산장제급여 581명/463백만 원

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 저소득주민 급여지원(명))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	31,495	32,317	33,164	34,030	47,701
	실적		29,882	32,841	40,546	43,151	0
성과	계획	당해년도	8,810	9,528	9,778	10,033	0
	실적		8,810	8,959	10,367	11,367	11,503
목표 달성도(%)			100	94	106	113	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 저소득층 최저생활보장 및 삶의 질 향상 기여
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	적기지급 여부(지급률)
	실적 / 계획	(11,503/0)×100
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	(47,701백만 원/0백만 원)×100
	집행률(%)	0%
추진실적 근거자료		강원도 '기초생활급여 집행실적' 제출문서 및 지방재정관리시스템
최종점검		미흡(7.5)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 기초수급자 증가에 따른 예산증액
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

1 [건강 1-4]

경로장애인과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-1-가-4	독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스	기존	'19 ~ 23	안정민 (2683)

□ 사업개요

- 독거노인·장애인의 가정에 화재 및 가스 감지센서 등을 설치하여 응급사고 발생 시 소방서와 연계하여 조치하고, 지역센터의 수시점검을 통하여 취약계층의 안전대책을 마련하고자 함

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	· 수혜자: 독거노인 1,500명 / 장애인 113명	· 수혜자: 독거노인 1,489명 / 장애인 94명
2020	· 수혜자: 독거노인 1,500명 / 장애인 113명	· 수혜자: 독거노인 1,482명 / 장애인 98명
2021	· 수혜자: 독거노인 1,500명 / 장애인 113명	· 수혜자: 독거노인 1,645명 / 장애인 113명
2022	· 수혜자: 독거노인 1,500명 / 장애인 113명	· 수혜자: 독거노인 1,689명 / 장애인 113명
2023	· 수혜자: 독거노인 1,500명 / 장애인 113명	· 수혜자: 독거노인 3,230명 / 장애인 170명

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 지원세대(개소))

구분	목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	252	232	232	232	232
	실적	260	327	343	478	736
성과	계획	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613
	실적	1,583	1,580	1,758	1,802	3,400
목표 달성도(%)		98.1	98	100	110	210

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 취약계층의 화재 및 가스 사고에 대비한 상시 안전체계 구축, 24시간 모니터링 체계 구축
- (점검결과)

구분	세부내용	
목표달성 노력	지표명(단위)	독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스
	실적 / 계획	3,400대 / 1,613세대
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	736/232
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료	사업추진실적 및 정산보고	
최종점검	매우 우수(20)	

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 2024년 사업량 100% 달성, 24년도 사업량 확대
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

① [건강 1-5]

보건행정과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-1-나-1	농촌맞춤형 건강교실	기존보완	'19 ~ 23	임상봉 (4016)

□ 사업개요

- 의료취약지역 거주 65세 이상 노인들의 건강관리능력을 강화시키기 위하여 농촌맞춤형 건강교실 운영

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 건강교실 참여인원 2,447명	• 건강교실 참여인원 2,419명
2020	• 건강교실 참여인원 2,447명	• 건강교실 참여인원 828명
2021	• 건강교실 참여인원 2,447명	• 건강교실 참여인원 762명
2022	• 건강교실 참여인원 2,447명	• 건강교실 참여인원 2,367명
2023	• 건강교실 참여인원 0명	• 건강교실 참여인원 4,033명

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 건강교실참여인원(명))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	17	17	17	17	0
	실적		17	6	7	16	17
성과	계획	당해년도	2,447	2,447	2,447	2,447	0
	실적		2,419	828	762	2,367	4,033
목표 달성도(%)			100	34	32	97	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 건강증진활동 및 교육을 통해 의료취약지역 노인들의 건강관리능력 강화
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	농촌맞춤형 건강교실 참여인원(연인원)
	실적 / 계획	4,033명 / 0명
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	17백만원 / 0백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		<ul style="list-style-type: none"> • 2023년도 보건진료소 건강교실 운영결과보고 • 2023년도 예산집행현황
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 계획 목표 달성으로 추후 예산 사용 효율화, 교육 다각화 등 사업 내실화 예정
- 성과지표 조정사항
 - 없음

1 [건강 1-6]

의료지원과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	I-1-나-2	예방접종사업	기존	'19 ~ 23	정윤서 (4074)

□ 사업개요

- 국가예방접종 실시로 접종비용 부담을 경감하여 접종 향상에 기여하고, 예방접종 대상 감염병 퇴치기반 강화 - 만12세 이하 어린이 : 국가필수예방접종17종

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	•어린이 국가필수예방접종17종: 86,000건	•어린이 국가필수예방접종17종: 85,546건
2020	•어린이 국가필수예방접종17종: 86,000건	•어린이 국가필수예방접종17종: 89,822건
2021	•어린이 국가필수예방접종17종: 86,000건	•어린이 국가필수예방접종17종: 93,336건
2022	•어린이 국가필수예방접종17종: 86,000건	•어린이 국가필수예방접종17종: 84,630건
2023	•어린이 국가필수예방접종17종: 86,000건	•어린이 국가필수예방접종18종: 93,812건 (2023년부터 로타바이러스예방접종 추가)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 예방접종건수(건))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	4,349	4,349	4,352	4,352	4,355
	실적		3,210	3,207	3,508	3,615	5,340
성과	계획	당해년도	96%(86,000건)	96%(86,000건)	96%(86,000건)	96%(86,000건)	96%(86,000건)
	실적		99.5%(85,546건)	100%(89,822건)	100%(93,336건)	98%(84,630건)	100%(93,812건)
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 관내 위탁의료기관 및 유관기관 대상 예방접종 홍보 확대로 적기 유아접종률 향상
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	영유아예방 접종율
	실적 / 계획	100% / 96%
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	5,340백만원 / 4,355백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		질병관리본부 질병보건통합관리 시스템, 지역보건 의료정보 시스템
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

1 [건강 1-7]

위생과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-2-가-1	식중독예방 및 식품접객업소 위생관리	기존	'19 ~ 23	박보미 (4049)

□ 사업개요

- 식품접객업소에 대한 지속적인 지도 점검을 통해 위생수준을 향상시키고, 식중독 발생이 우려되는 업소에 대한 효율적인 지도 점검을 실시하여 식중독 발생을 사전에 예방하기 위함

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) - 기획점검 16회 / 수시점검 3,548개소 • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 - 점검업소 수 740개소 • 예방관리 2회
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) - 기획점검 14회 / 수시점검 3,321개소 • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 - 점검업소 수 701개소 • 예방관리 2회
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) - 기획점검 15회 / 수시점검 3,048개소 • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 - 점검업소 수 602개소 • 예방관리 1회
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) - 기획점검 15회 / 수시점검 4,320개소 • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 - 점검업소 수 719개소 • 예방관리 1회
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 	<ul style="list-style-type: none"> • 식품접객업소 지도 점검(기획, 수시) - 기획점검 15회 / 수시점검 3,372개소 • 식중독 발생 우려 집단급식시설 지도 점검 - 점검업소 수 724개소 • 예방관리 1회

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 식품접객업소 기획 점검 건수 및 예방관리 건수(건))

구분	목표수준	2019	2020	2021	2022	2023	
예산	계획	당해년도	12	12	8	5	5
	실적		12	21	8	5	5
성과	계획	당해년도	17	18	17	15	0
	실적		18	16	16	15	15
목표 달성도(%)			100	88.9	94	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

○ 성과 및 효과

- 식품접객업소에 대한 지속적인 지도 점검 및 영업자, 종사자 등에 대한 교육 강화를 통해 식중독 발생 예방 및 위생수준 향상으로 선진문화 정착에 기여

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	식품접객업소 지도건수
	실적 / 계획	15 건 / 0건
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	15백만원 / 0백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		새울 지도 점검 실적
최종점검		매우 우수(20)

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

○ 성과지표 조정사항

- 해당사항 없음

1 [건강 1-8]

보건행정과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-2-가-2	감염병 관리사업	기존	'19 ~ 23	최윤우 (4091)

□ 사업개요

- 감염병 신고접수 및 관리
- 역학조사

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 감염병감시활동,역학조사,감염병 예방요령 홍보교육	• 감염병 감시(신고접수): 909건 • 역학조사: 194건
2020	• 감염병감시활동,역학조사,감염병 예방요령 홍보교육	• 감염병 감시(신고접수): 489건 • 역학조사: 116건
2021	• 감염병감시활동,역학조사,감염병 예방요령 홍보교육	• 감염병 감시(신고접수): 463건 • 역학조사: 147건 • 추적조사 완료율: 100%
2022	• 감염병감시활동,역학조사,감염병 예방요령 홍보교육	• 감염병 감시(신고접수): 423건 • 역학조사: 424건 • 추적조사 완료율: 100%
2023	• 감염병감시활동,역학조사,감염병 예방요령 홍보교육	• 감염병 감시(신고접수): 595건 • 역학조사: 143건 • 추적조사 완료율: 100%

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 추적조사 완료율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	5	5	5	5	5
	실적		4	9	5	2	2
성과	계획	당해년도	100%(194건)	100%(116건)	100%	100%	100%
	실적		100%(194건)	100%(116건)	100%	100%	100%
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 해외유입감염병 추적관리로 지역사회 감염병 확산 방지
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	추적조사 완료율(%)
	실적 / 계획	100% / 100%
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	2백만원 / 5백만원
	집행률(%)	40%
추진실적 근거자료		질병보건통합관리시스템
최종점검		보통(12.5)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 예산 변경

1 [건강 1-9]

보건행정과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-2-가-3	방역소독사업	기존	'19 ~ 23	김다운 (2058)

□ 사업개요

- 감염병 매개체 방제 및 오염원 소독을 통한 감염병 확산 예방

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 95일 위생해충기피제 자동분사기 운영: 23대 해충유인 살충기: 11개소 34대 	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 95일 소독실시횟수: 2,614회 위생해충기피제 자동분사기 운영: 23대 해충유인살충기 11개소 34대
2020	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 100일 위생해충기피제 자동분사기 운영: 35대 	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 15개업체, 84일 소독실시횟수: 2,464회 위생해충기피제 자동분사기 운영: 35대 해충유인살충기 14개소 46대
2021	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 100일 위생해충기피제 자동분사기 운영: 35대 	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 15개업체, 84일 소독실시횟수: 2,950회 위생해충기피제 자동분사기 운영: 41대 해충유인살충기 14개소 55대
2022	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 100일 위생해충기피제 자동분사기 운영: 35대 	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 80일 소독실시횟수: 2,593회 위생해충기피제 자동분사기 운영: 45대 해충유인살충기 16개소 60대
2023	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 14개업체, 100일 위생해충기피제 자동분사기 운영: 35대 	<ul style="list-style-type: none"> 방역소독 대행업체 운영: 13개업체, 90일 소독실시횟수: 2,169회 위생해충기피제 자동분사기 운영: 50대 해충유인살충기 18개소 67대

□ 성과목표 및 이력관리(백만원 소독실시 횟수, 하수관로 약품투입기운영 설치개소수 및 해충유인 살충기 운영 설치개소수(회 및 개소))

구분	목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	635	689	755	688	597
	실적	669	737	753	603	540
성과	계획	2,652	2,934	2,935	2,936	2,336
	실적	2,671	2,545	3,046	2,703	2,286
목표 달성도(%)		100	86.7	104	92	97.8

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 감염병 매개체 방제 및 오염원 소독을 통한 감염병 확산 예방
 - 방역소독 실시로 감염병 확산에 대한 지역주민 불안감 해소
- (점검결과)

구분	세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)
	소독실시 횟수, 하수관로 약품투입기운영 설치 개소 수 및 해충유인 살충기 운영 설치 개소 수 (회 및 개소)
	2,286회 / 2,336회
예산집행 노력	실적 / 계획
	540백만원 / 597백만원
	집행률(%)
90%	
추진실적 근거자료	
방역소독 대행업체 소독일지 등	
최종점검	
매우 우수(20)	

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 없음
- 성과지표 조정사항
 - 예산 변경

1 [건강 1-10] (미추진)

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-2-나-1	무더위쉼터 냉방비 지원	기존보완	'19 ~ 23	김종영 (3263)

□ 사업개요

- 사업기간 : 매년 하절기
- 지원대상 : 관내 무더위쉼터
- 추진방법 : 공동주택 내 지정된 무더위쉼터 전기요금 납부자에게 6,9월 냉방비 지급
 - 단독계량기 설치 쉼터 월 10만원까지 실비지원(6, 9월분)
 - 공동계량기 설치 쉼터 월 4만원 정액지원(6, 9월분)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 무더위쉼터 추가 지정 및 전수조사 장비 후 보조금 지급	• 무더위쉼터 257개소 냉방비 지원
2020	• 무더위쉼터 추가 지정 및 전수조사 장비 후 보조금 지급	• 미추진
2021	• 무더위쉼터 추가 지정 및 전수조사 장비 후 보조금 지급	• 미추진
2022	• 무더위쉼터 추가 지정 및 전수조사 장비 후 보조금 지급	• 미추진
2023	• 무더위쉼터 추가 지정 및 전수조사 장비 후 보조금 지급	• 미추진

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 지원 개소 수(개소))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	40	40	40	40	미추진
	실적		18.5	미추진	미추진	미추진	미추진
성과	계획	당해년도	266 개소	290 개소	310 개소	330 개소	미추진
	실적		257 개소	미추진	미추진	미추진	미추진
목표 달성도(%)			96.6	-	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 미추진
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	미추진
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

1 [건강 1-11]

경로장애인교

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-2-나-2	경로당 운영지원	기존보완	'19 ~ 23	변혜민 (2587)

□ 사업개요

- 냉방기, 공기청정기 노후 교체 및 신설 경로당 지원
- 경로당 냉방비 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	· 신규 및 노후 냉방기 보유 경로당에 냉방기 16개 지원 · 관내 경로당 435개소에 냉방비 지원 · 공기청정기 775대 지원	· 42개소에 냉방기 보급 및 6개소 전기공사 진행 · 관내 경로당 424개소 냉방비 지원, 50여 개소 에어컨 수리비 지원 · 관내 경로당 공기청정기 775대 지원, 신규 경로당 공기청정기 6대 지원
2020	· 신규 및 노후 냉방기 보유 경로당에 냉방기 16개 지원 · 관내 경로당 435개소에 냉방비 지원 · 신규 경로당 공기청정기 5대 지원	· 경로당 냉방기 21개 지원 · 경로당 449개소 에어컨 필터 세척 · 경로당 444개소 냉방비 지원, 60여개소 에어컨 수리비 지원 · 신규 경로당 공기청정기 6대 지원
2021	· 냉방기 30대 지원 · 공기청정기 5대 지원	· 경로당 냉방기 22개 지원 · 경로당 456개소 냉방비 지원 · 신규 경로당 공기청정기 6대 지원
2022	· 냉방기 30대 지원 · 공기청정기 5대 지원	· 경로당 냉방기 15개 지원 · 경로당 461개소 냉방비 지원 · 신규 경로당 공기청정기 5대 지원
2023	· 냉방기 21대 지원 · 공기청정기 5대 지원	· 경로당 냉방기 21개 지원 · 경로당 461개소 냉방비 지원 · 신규 경로당 공기청정기 5대 지원

□ 성과목표 및 이력관리

(백만원, 냉방기 및 공기청정기 지원개수(개))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	739	123	123	126	141
	실적		765	124	78	88	103
성과	계획	당해년도	490	45	35	35	26
	실적		823	27	28	20	26
목표 달성도(%)			100	60	80	66	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 경로당에 냉방기, 공기청정기를 보급하고 냉방비를 지원함으로써 더위 및 미세먼지에 취약한 어르신들의 건강한 생활영위
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	냉방기 21대 및 공기청정기 5대
	실적 / 계획	26건 / 26건
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	103백만원 / 141백만원
	집행률(%)	73%
추진실적 근거자료		추진실적 및 정산보고서 등
최종점검		우수(15)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 예산 100% 미달성
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

1 [건강 1-12]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
건강	1-2-나-3	폭염한파 주의경보 및 국민행동요령 안내 홍보	기존	'19 ~ 23	김종영 (3263)

□ 사업개요

- 폭염 및 한파 특보(주의보·경보) 안내
- 폭염 및 한파대비 국민행동요령 홍보

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 폭염 및 한파 특보 안내 • 폭염 및 한파 대비 국민행동요령 홍보	• 폭염 및 한파 특보(주의보·경보) 안내 • 폭염 및 한파 대비 행동요령 보도(8건)
2020	• 폭염 및 한파 특보 안내 • 폭염 및 한파 대비 국민행동요령 홍보	• 폭염 및 한파 특보(주의보·경보) 안내 • 폭염 및 한파 대비 행동요령 보도(3건)
2021	• 폭염 및 한파 특보 안내 • 폭염 및 한파 대비 국민행동요령 홍보	• 폭염 및 한파 특보(주의보·경보) 안내 • 폭염 및 한파 대비 행동요령 보도(3건)
2022	• 폭염 및 한파 특보 안내 • 폭염 및 한파 대비 국민행동요령 홍보	• 폭염 및 한파 특보(주의보·경보) 안내 • 폭염 및 한파 대비 행동요령 보도(6건)
2023	• 폭염 및 한파 특보 안내 • 폭염 및 한파 대비 국민행동요령 홍보	• 폭염 및 한파 특보(주의보·경보) 안내 • 폭염 및 한파 대비 행동요령 보도(50건)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 행동요령 홍보활동(보도건수))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	5	5	6.5	5	5
	실적		5	7	6.5	4	5
성과	계획	당해년도	6	6	6	6	6
	실적		8	3	3	6	50
목표 달성도(%)			133	50	50	90	833

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 폭염·한파 등 극한 기후 사전알림 및 대비 행동요령 홍보를 통한 인명 및 재산피해 예방
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	홍보 활동 (보도 건수)
	실적 / 계획	50건 / 6건
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	5백만원 / 5백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		보고서 및 보도자료 등
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

② [농업 2-1]

농촌지원과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-가-1	품목농업인연구회 전문능력 활성화	신규(발굴)	'19 ~ 23	최창순 (4151)

□ 사업개요

○ 품목농업인연구회 과제교육 및 현장애로과제 지원

- 품목농업인연구회 과제교육 : 28회, 2,800명
- 품목농업인연구회 현장애로과제 지원 : 9개소

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	•과제교육 : 176회, 3,900명 •현장애로과제 지원 : 5~8개소	•과제교육 : 166회, 3,612명 •현장애로과제 지원 : 8개소
2020	•과제교육 : 140회, 2,800명 •현장애로과제 지원 : 5~8개소	•과제교육 : 55회, 1,227명 •현장애로과제 지원 : 9개소
2021	•과제교육 : 140회, 2,800명 •현장애로과제 지원 : 5~8개소	•과제교육 : 47회, 987명 •현장애로과제 지원 : 7개소
2022	•과제교육 : 140회, 2,800명 •현장애로과제 지원 : 5~8개소	•과제교육 : 80회, 1,692명 •현장애로과제 지원 : 7개소
2023	•과제교육 : 140회, 2,800명 •현장애로과제 지원 : 9개소	•과제교육 : 155회, 2,334명 •현장애로과제 지원 : 9개소

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업실적(현장애로과제 지원 개소))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	100	100	100	100	20
	실적		103	74.5	100	100	99.7
성과	계획	당해년도	8개소	8개소	7개소	7개소	9개소
	실적		8개소	9개소	7개소	7개소	9개소
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

○ (성과 및 효과)

- 품목농업인 연구회 과제교육(155회, 2,334명), 현장애로과제 해결(9개소)

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	연구회 과제교육, 현장애로과제 해결 지원
	실적 / 계획	9개소 / 9개소
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	99.7백만원 / 20백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		사업성과 보고
최종점검		매우 우수(20)

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

○ 성과지표 조정사항

- 해당사항 없음

2 [농업 2-2](사업종료)

농촌자원과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-가-2	작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업	기존	'19 ~ '20	문보람 (4167)

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 위 차: 원주시 일원
- 사업대상: 같은 작목을 재배하는 단체(마을)
- 사업비: 개소당 50,000천원(국비 50%, 시비 50%)
- 사업내용
 - 전문가컨설팅: 농작업(작업장, 작업자세 등) 위험성 점검 및 개선, 대책수립
 - 농작업 안전장비 및 안전보호구 지원
 - PAOT(참여형 농작업 환경개선 활동)교육

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업 추진(1개소)	• 1개소 추진 완료(부론면 섬강하우스 수박작목반)
2020	• 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업 추진(1개소)	• 1개소 추진 완료(부론 북송이작목반)
2021	• 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업 추진(1개소)	• 1개소 추진 완료(치악채소작목반)
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 시범사업추진개소(개소))

구분	목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	50	50	50	사업종료	사업종료
	실적	50	50	실적 작성	-	-
성과	계획	1개소	1개소	1개소	사업종료	사업종료
	실적	1개소	1개소	실적 작성	-	-
목표 달성도(%)		100%	100%	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 -
- (점검결과)

구분	세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)
	실적 / 계획
	달성률(%)
예산집행 노력	실적 / 계획
	집행률(%)
추진실적 근거자료	
최종점검	

- 미흡 및 개선.보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

2 [농업 2-3] (사업종료)

농업기술과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-가-3	신품종 버섯 지역적응 재배 시범사업	신규 (발굴)	'19	이진규 (4178)

□ 사업개요

- 장소 : 원주시 지정면 신평석화로 134 은혜농원(134m²)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	•배지, 재배사 환경개선	• 잎새버섯 배지입상 후 출하완료 • 재배사 환경개선 완료
2020	사업종료	사업종료
2021	사업종료	사업종료
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 시범사업지원(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	15	사업종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		12	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	사업완료	사업종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		사업완료	-	-	-	-
목표 달성도(%)			-	-	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

○ (성과 및 효과)

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당 없음

○ 성과지표 조정사항

- 해당 없음

2 [농업 2-4] (사업종료)

농업기술과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-가-4	기후변화대응 양파 기계화 생력재배 시범	신규 (발굴)	'19~'20	박건희 (4177)

□ 사업개요

- 기후변화로 남부지방 주산지 고품질 양파 생산량이 감소하고 있고 저장성이 떨어짐
- 노동력 부족으로 양파 생산면적이 확대되지 않아 기계화를 통한 생력재배 면적 확대

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 양파 기계화 생력재배 시범(1개소 3ha)	• 양파 기계화 생력재배 시범(1개소 3.2ha)
2020	• 양파 기계화 생력재배 시범(1개소 3ha)	• 양파 기계화 생력재배 시범(1개소 3ha)
2021	사업종료	사업종료
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 시범사업 설치 실적(양파생력재배 면적(ha)))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	32	20	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		20	20	-	-	-
성과	계획	당해년도	3ha	3ha	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		3.2ha	3ha	-	-	-
목표 달성도(%)			100	100	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과) : 기후변화대응 새로운 양파 재배단지 육성
- (점검결과)

구분	세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)
	실적 / 계획
	달성률(%)
예산집행 노력	실적 / 계획
	집행률(%)
추진실적 근거자료	
최종점검	

사업종료

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 사업추진 완료
- 성과지표 조정사항
 - 해당 없음

2 [농업 2-5] (사업종료)

농업기술과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-가-5	폭염 대응 시설채소 온도저감 기술시범	신규 (발굴)	'19	박건희 (4177)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12.
- 면적 : 6개소, 0.5ha
- 장소 : 원주시 부론면 정산로 9 외 5개소

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	•차광막, 환기팬, 쿨넛, 저압포그 등 설치	• 차광막, 쿨넛 등 차광시설 2농가 • 저압포그 2농가 • 외부살수장치+유동팬 2농가
2020	사업종료	사업종료
2021	사업종료	사업종료
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 시범사업 설치 실적)

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	50	사업 종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		40	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	사업 추진 완료	사업 종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		사업 추진 완료	-	-	-	-
목표 달성도(%)			100	-	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 고온기 온도저감장치 설치로 시설하우스 내 생산성 향상
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 사업추진 완료
- 성과지표 조정사항
 - 없음

2 [농업 2-6]

농업기술과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-가-6	기후변화 대응 지역 특화작목 육성	기존보완	'19 ~ 23	김수재 (4185)

□ 사업개요

- 향토과실 다래 특성화 작목 육성 및 부존자원 소득화 실증재배

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 3ha(19.2ha) 부존자원 소득작목 육성 : 돌배 0.5ha 	<ul style="list-style-type: none"> 다래 생산기반 확대 : 3ha 돌배 신규과원 조성 : 0.5ha
2020	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 1ha(20.2ha) 부존자원 소득작목 육성: 돌배 0.5ha(1.0ha) 	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 : 3.6ha(22.8ha) 돌배 재배면적 확대 : 0.3ha(0.8ha)
2021	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 1ha(20.2ha) 부존자원 소득작목 육성: 돌배 0.5ha(1.0ha) 	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 : 0.0ha(22.8ha) 돌배 재배면적 확대 : 1.1ha(1.9ha)
2022	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 1ha(22.2ha) 부존자원 소득작목 육성: 돌배 0.5ha(2.0ha) 	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 : 0.2ha(23a) 돌배 재배면적 확대 : 2ha(3.9ha)
2023	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 1ha(23.2ha) 부존자원 소득작목 육성: 돌배 0.5ha(2.5ha) 	<ul style="list-style-type: none"> 다래 재배면적 확대 : 4ha(27a) 돌배 재배면적 확대 : 2.2ha(6.1ha)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 특화작목 재배면적(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	305	105	105	105	105
	실적		305	503	10	38	362
성과	계획(ha)	당해년도	3.5	1.5	1.5	2	1.5
	실적(ha)		3.5	3.9	1.1	2	6.2
목표 달성도(%)			100	260	73	100	413

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

○ (성과 및 효과)

- 다래 재배면적 확대: 23농가 4ha, 16% 확대
- 돌배 부존자원 발굴 및 보급: 12농가 2.2ha, 144% 확대

○ (점검결과)

구분	세부내용	
목표달성 노력	지표명(단위)	다래과원 조성면적, 돌배나무 식재면적(ha)
	실적 / 계획	6.2 ha / 1.5ha
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	362백만원 / 105백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		시범사업 추진계획, 추진결과
최종점검		매우 우수(20)

○ 미흡 및 개선.보완사항

- 면적확대를 위해 사업예산 확보

○ 성과지표 조정사항

- 해당 없음

2[농업2-7]

농정과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-나-1	가뭄대비 중소형 관정 개발 사업	기존	'19 ~ 23	양수빈 (4144)

□ 사업개요

- 사업대상 : 391공(소형 192공, 중형 199공) ※ 변동 가능
- 위 치 : 원주시(문막읍 외 15개 면·동)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ※ 변동 가능
- 19~20 백만 원(시비 200, 자부담 200) 21~23 백 만원(시비 350, 자부담 350) ※ 변동 가능

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 중소형 관정개발 - 소형 33공, 중형 34공	• 중소형 관정개발 - 소형 30공, 중형 32공
2020	• 중소형 관정개발 - 소형 33공, 중형 34공	• 중소형 관정개발 - 소형 33공, 중형 31공
2021	• 중소형 관정개발 - 소형 77공, 중형 47공	• 중소형 관정개발 - 소형 64공, 중형 55공
2022	• 중소형 관정개발 - 소형 33공, 중형 34공	• 중소형 관정개발 - 소형 68공, 중형 55공
2023	• 중소형 관정개발 - 중소형 관정 0공	• 중소형 관정개발 - 중소형 관정 87공

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 관정 개발 수(공))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	400	400	700	700	0
	실적		378	370	661	699	510
성과	계획	당해년도	67 공	67 공	124 공	67 공	0 공
	실적		62 공	64 공	115 공	123 공	87 공
목표 달성도(%)			92.5	95.5	92.7	183.6	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 가뭄대비 농업용수 개발로 영농활동 증대 및 주민 불편 해소
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	관정 개발 수(공)
	실적 / 계획	87공 / 0공
	달성률(%)	100 %
예산집행 노력	실적 / 계획	510백만원 / 0백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		관정개발사업 완료보고서 및 보조금 집행 실적
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 양수능력 부족으로 관정개발 사업을 포기하는 대상자가 빈번히 발생하는 바, 사전에 농업용수 개발이 가능한지 대상지 파악 및 선정 후 관정개발 유도
- 성과지표 조정사항
 - 양수능력 부족으로 관정개발 포기자 발생 시 관정개발 실적으로 적용하고, 사업자를 변경하여 관정개발 사업 재추진

2 [농업 2-8]

료컬푸드과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-나-2	비닐하우스 현대화사업	기존	'19 ~ 23	김중현 (4412)

□ 사업개요

- 내재해형 표준시설 비닐하우스 설치를 통한 재해 예방 및 규모화·단지화 농업 발전모델 제시
 - 사업량: 45동
 - 사업비: 360,000천원(도비 54,000 시비 126,000 자부담 180,000)
 - 사업기준: 330㎡ 1동 기준 8,000천원
 - 사업대상: 시설채소 330㎡ 이상 재배 희망하는 농업경영체 등록 농업인
 - 사업내용: 내재해형 표준시설 비닐하우스 설치 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 내재해형 비닐하우스 45동 지원	• 내재해형 비닐하우스 45동 14,850㎡ 지원
2020	• 내재해형 비닐하우스 45동 지원	• 내재해형 비닐하우스 46동 16,342㎡ 지원
2021	• 내재해형 비닐하우스 45동 지원	• 내재해형 비닐하우스 125동 42,428㎡ 지원
2022	• 내재해형 비닐하우스 45동 지원	• 내재해형 비닐하우스 34동 42,428㎡ 지원
2023	• 내재해형 비닐하우스 45동 지원	• 내재해형 비닐하우스 39동 12,870㎡ 지원

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업 실적(비닐하우스 설치지원(동)))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	292	292	292	292	292
	실적		292	349.6	120	161	147
성과	계획	당해년도	45	45	45	45	45
	실적		45	46	125	34	39
목표 달성도(%)			100	100	278	76	87

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 내재해형 비닐하우스 39동 지원
- 점검결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	비닐하우스 설치 지원 동수
	실적 / 계획	39 동 / 45 동
	달성률(%)	87%
예산집행 노력	실적 / 계획	147 백만원 / 292 백만원
	집행률(%)	50%
추진실적 근거자료		2023년 비닐하우스 지원 사업 정산검사
최종점검		보통(10)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 원자재 가격 상승으로 인한 사업 포기자 발생으로 예산소진에 문제 발생
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

② [농업 2-9] (미추진)

로컬푸드과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-나-3	과수 생력화 작업기 지원	기존	'19 ~ 23	김중현 (4412)

□ 사업개요

- 과수 생산 편의장비 지원을 통한 농가 경영비 절감 및 작업 효율성 제고
 - 사업량: 7대
 - 사업비: 140,000천원(도비 21,000 시비 49,000 자부담 70,000)
 - 사업기준: 고소작업차 1대 기준 20,000천원
 - 사업대상: 과수 재배에 종사하는 농업경영체 등록 농업인
 - 사업내용: 과수 전용 고소작업차 구입 비용 일부 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 과수 전용 고소작업차 4대 지원	• 과수 전용 고소작업차 4대 지원
2020	• 과수 전용 고소작업차 5대 지원	• 과수 전용 고소작업차 7대 지원
2021	• 과수 전용 고소작업차 5대 지원	• 미추진
2022	• 과수 전용 고소작업차 5대 지원	• 미추진
2023	• 과수 전용 고소작업차 5대 지원	• 미추진

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 작업기 지원(대))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	80	100	100	100	100
	실적		140	140	미추진	미추진	미추진
성과	계획	당해년도	4	5	5	5	0
	실적		7	7	미추진	미추진	미추진
목표 달성도(%)			100	100	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 과수 분야 생력화 작업기 지원으로 농촌인구 감소 및 고령화에 따른 농촌 지역 인력 부족 해소
- 점검결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업 미추진
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 사업통합으로 인하여 해당 사업 미추진
- 성과지표 조정사항
 - 해당 사업 종료

2 [농업 2-10]

로컬푸드과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	II-1-나-4	사과 명품과원 조성 지원	기존	'19 ~ 23	김중현 (4412)

□ 사업개요

- 신규과원 조성 및 확대를 통한 과수 산업 정예화·전업화로 과수 재배농가 경쟁력 제고
 - 사업량: 0.7ha
 - 사업비: 49,000천원(도비 10,290 시비 24,010 자부담 14,700)
 - 사업기준: 1,000m² 당 7,000천원
 - 사업대상: 사과 신규과원 조성 및 기존 과원 확대 농가
 - 사업내용: 사과 재배 농가 영농 규모화를 위한 사과 신규과원 조성 패키지 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 사과 명품과원 0.5ha 조성	• 사과 명품과원 조성 0.264ha 조성
2020	• 사과 명품과원 1ha 조성	• 사과 명품과원 조성 0.5ha 조성
2021	• 사과 명품과원 2ha 조성	• 사과 명품과원 조성 0.7ha 조성
2022	• 사과 명품과원 2ha 조성	• 사과 명품과원 조성 1ha 조성
2023	• 사과 명품과원 2ha 조성	• 사과 명품과원 조성 1.6ha 조성

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 명품과원조성지원(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	35	70	49	140	140
	실적		18	35	33	93	88
성과	계획	당해년도	0.5	1	2	2	2
	실적		0.264	0.5	0.7	1	1.6
목표 달성도(%)			53	50	70	50	80

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 신규과원 조성을 통한 원주시 관내 과수 경쟁력 향상
- 점검결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업실적(명품과원 조성지원 면적)
	실적 / 계획	1.6 ha / 2 ha
	달성률(%)	80%
예산집행 노력	실적 / 계획	88 백만원 / 140백만원
	집행률(%)	63%
추진실적 근거자료		2023년 명품과원 기반조성 정산검사 결과보고
최종점검		보통(10)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

② [농업 2-11]

로컬푸드과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-1-나-5	시설원에 환경개선 지원	기존	'19 ~ 23	김중현 (4412)

□ 사업개요

- 기존 시설원에 생산 기반 시설에 고품질 생산을 위한 시설 신규 설치로 농업 안정화 실현
 - 사업량: 0.5개소
 - 사업비: 25,000천원(도비 3,750 시비 8,750 자부담 12,500)
 - 사업기준: 1개소 기준 50,000천원
 - 사업대상: 시설 재배에 종사하는 농업경영체 등록 농업인
 - 사업내용: 시설원에 시설 개·보수 및 현대화를 위한 기자재 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 시설원에 환경개선 2ha	• 시설원에 환경개선 지원 9.5 ha
2020	• 시설원에 환경개선 3 ha	• 시설원에 환경개선 지원 2 ha
2021	• 시설원에 환경개선 3 ha	• 시설원에 환경개선 0.3ha
2022	• 시설원에 환경개선 3 ha	• 시설원에 환경개선 0.3ha
2023	• 시설원에 환경개선 3 ha	• 시설원에 환경개선 0.3ha

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 시설환경개선(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	50	50	50	50	50
	실적		9.5	75	12	61	48
성과	계획	당해년도	100%	100%	100%	100%	100%
	실적		19%	100%	98%	99%	97%
목표 달성도(%)			19	100	98	99	97

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 원예시설 내부 시설 설치 지원을 통한 시설원에 농가 경쟁력 향상
- 점검결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	시설환경개선 예산집행률
	실적 / 계획	97 % / 100%
	달성률(%)	97 %
예산집행 노력	실적 / 계획	48 백만원 / 50 백만원
	집행률(%)	96 %
추진실적 근거자료		2023년 시설원에 환경개선 정산검사 결과보고
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

2 [농업2-12](사업종료)

축산과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-2-가-1	폭염 등 재해대비 축산시설 구조개선	기존	'19 ~ 23	함정식 (4194)

□ 사업개요

- 사업내용: 폭염 등 재해대비 시설 및 장비 지원
- 사업량: 41개소(지붕단열 2, 냉방시설 1, 온도조절 36, 용수개발 2) ※ 추진 중 적의 변동
- 사업비: 146백만 원(도비 22, 시비 51, 자부담 73)
- 지원대상: 축산업 허가·등록된 가축사육 농가 및 법인

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 지붕단열 12개소 • 냉방시설 8개소 • 온도조절 30개소	• 지붕단열 13개소 • 냉방시설 4개소 • 온도조절 82개소 • 추진 중(이월)
2020	• 지붕단열 3개소 • 냉방시설 4개소 • 온도조절 3개소 • 착유실냉방 5개소	• 냉방시설 3개소 • 온도조절 56개소 • 착유실냉방 2개소
2021	• 지붕단열 2개소 • 냉방시설 1개소 • 온도조절 36개소 • 화재감지 4개소	• 지붕단열 2개소 • 냉방시설 1개소 • 온도조절 36개소 • 용수개발 2개소
2022	• 지붕단열 2개소 • 냉방시설 1개소 • 온도조절 36개소 • 화재감지 4개소	미추진
2023	사업종료	

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 폭염에 따른 가축 폐사 감소율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	344,613	990	146	200	사업종료
	실적		271	371	146	-	-
성과	계획	당해년도	40	40	40	40	사업종료
	실적		40	40	40	-	-
목표 달성도(%)			100	100	100	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 축종별 맞춤형 폭염 대응시설 및 장비 지원을 통한 안정적인 가축사육 도모
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 없음
- 성과지표 조정사항
 - 없음

2 [농업2-13](사업종료)

축산과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-2-가-2	거점소독세척시설 추가 설치	신규(발굴)	'19 ~ 21	이성권 (4405)

□ 사업개요

- 사업량: 1개소 ※ 일일 140대 소독 규모(단층/500m²)
- 사업비: 938백만원(국비 288, 도비 86, 시비 564)
- 사업내용: 축산관련차량 및 운전자 소독을 위한 거점소독세척시설 설치 및 운영
- 사업부지: 신림면 용암리 1355

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 거점소독세척시설 1개소 추가 설치	• 2020년 본예산 확보: 576백만원
2020	• 거점소독시설 설치 착공 및 완공	• 거점소독세척시설 설치 착공
2021	• 거점소독세척시설 설치 완공	• 거점소독세척시설 설치 준공
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 거점소독세척시설 추가설치 여부 및 공정률(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	-	586	938	사업종료	사업종료
	실적		0	27	911	-	-
성과	계획	당해년도	제반사항추진	100%	100%	사업종료	사업종료
	실적		추진완료	5%	97%	-	-
목표 달성도(%)			100	5	97	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 차단방역 체계 구축을 위한 거점소독세척시설 추가 설치로 관내 축산농가 보호기반 조성
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 없음
- 성과지표 조정사항
 - 없음

2 [농업2-14]

축산과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
농업	11-2-가-3	가축질병 예방체계 구축 (공동방제단 운영)	기존보완	'19 ~ 23	노혁 (4406)

□ 사업개요

- 사업량: 공동방제단 운영(3개반)
- 사업비: 152,540천원(기금 76,270, 도비 15,254, 시비 61,016)
- 소독대상: 소규모 사육농가, 밀집사육지역 등
- 사업내용: 상대적으로 방역이 소홀한 소규모 농가 및 밀집사육지역 등 소독 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 공동방제단 3개반 운영: 210호, 24회 소독	• 공동방제단 3개반 운영: 210호, 35회 소독
2020	• 공동방제단 3개반 운영: 198호, 24회 소독	• 공동방제단 3개반 운영: 198호, 35회 소독
2021	• 공동방제단 3개반 운영: 257호, 24회 소독	• 공동방제단 3개반 운영: 257호, 24회 소독
2022	• 공동방제단 3개반 운영: 257호, 24회 소독	• 공동방제단 3개반 운영: 257호, 24회 소독
2023	• 공동방제단 3개반 운영: 257호, 24회 소독	• 공동방제단 3개반 운영: 257호, 24회 소독

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 공동방제단 운영 개반(개반))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	142.65	142.65	152.54	151.726	142.65
	실적		143	145	152.54	151.726	156.8
성과	계획	당해년도	3개반	3개반	3개반	3개반	3개반
	실적		3개반	3개반	3개반	3개반	3개반
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 소독 등 방역이 취약한 소규모 농가 및 취약지역을 대상으로 주기적으로 소독 실시
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	공동방제단 3개반 운영(%)
	실적 / 계획	3개반 / 3개반
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	156.8백만원 / 142.65백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		추진 내역 공문 및 완료 보고
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

③ [물관리 3-1]

수도과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
물관리	III-1-가-1	지방상수도(급·배수관) 확충사업	기존	'19 ~ 23	신영근 (4234)

□ 사업개요

- 행구동 꽃밭머리길 외 24개소 상수관 설치공사 (D250 ~ D20) L=18.6km, 사업비 3,000백만원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 지방상수도 확충사업 공사 완료	• 지방상수도 확충사업 공사 완료
2020	• 지방상수도 확충사업 공사 완료	• 지방상수도 확충사업 공사 완료
2021	• 지방상수도 확충사업 공사 완료	• 지방상수도 확충사업 공사 완료(L=18.6km)
2022	• 지방상수도 확충사업 공사 완료	• 지방상수도 확충사업 공사 완료(L=15.1km)
2023	• 지방상수도 확충사업 공사 완료	• 지방상수도 확충사업 공사 완료(L= 9.70km)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 지방상수도 확충(km))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	2,300	5,000	5,000	5,000	3,000
	실적		2,300	3,080	4,153	2,457	2,510
성과	계획	당해년도	14km	30km	30km	30km	9.5km
	실적		6km	12.8km	18.6km	15.1km	9.7km
목표 달성도(%)			233	42.7	62	50	102

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

○ (성과 및 효과)

- 문막읍 반계리 문막노인복지센터 외 12개소 상수도 미보급 지역 상수관로 9.70km 설치하여 사업 대상지 주민들의 생활 여건 개선

○ (점검결과)

구분	세부내용	
목표달성 노력	지표명(단위)	지방상수도 확충사업
	실적 / 계획	9.7km / 9.5km
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	2,510백만원 / 3,000백만원
	집행률(%)	83.6%
추진실적 근거자료		준공계
최종점검		매우 우수(20)

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

○ 성과지표 조정사항

- 해당사항 없음

3 [물관리 3-2]

수도과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
물관리	III-1-가-2	마을(소규모)수도시설 설치 및 개보수 사업	기존	'19 ~ 23	이재우 (4254)

□ 사업개요

- 상수도 미 급수지역 상수관로 설치 및 노후시설 교체

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 소규모수도시설 사업수요조사 및 시행	• 소규모수도시설 설치(1.4km) 및 개보수사업(7km)
2020	• 소규모수도시설 사업수요조사 및 시행	• 소규모수도시설 설치(2.1km) 및 개보수사업(9km)
2021	• 소규모수도시설 사업수요조사 및 시행	• 소규모수도시설 설치(3.6km) 및 개보수사업(4.5km)
2022	• 소규모수도시설 사업수요조사 및 시행	• 소규모수도시설 설치(0.45km) 및 개보수사업(7.35km)
2023	• 소규모수도시설 사업수요조사 및 시행	• 소규모수도시설 설치(3.25km) 및 개보수사업(3.74km)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 수도시설 설치 및 개보수(km))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	2,093	2,000	2,000	2,000	2,000
	실적		1,342	1,851	1,563	1,354	1,935
성과	계획	당해년도	10km	10km	10km	10km	10km
	실적		8.4km	11.1km	8.1km	7.8	6.99
목표 달성도(%)			84	100	81	78	70

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 상수도 미 급수지역 주민들에게 안전한 생활용수 공급
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	마을(소규모)수도시설 설치 및 개보수 사업(km)
	실적 / 계획	6.99km / 10km
	달성률(%)	69.9%
예산집행 노력	실적 / 계획	1,935백만원 / 2,000백만원
	집행률(%)	97%
추진실적 근거자료		사업 관련 서류
최종점검		우수(15)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 토지사용승낙서 징구 어려움으로 인한 발주 및 준공시기 지연
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

3 [물관리 3-3](미추진)

환경과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
물관리	III-1-가-3	먹는물 공동시설 소규모 개선사업	기존	'19~23	봉재남 (3064)

□ 사업개요

- 대상시설 : 국형사 샘물 외 6개소
- 사업비 : 10백만 원
- 사업내용 : 국형사 샘물 보수 및 자외선 소독시설 개량공사 실시

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사, 시설보수 및 관리	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사 12회, 물탱크 청소 2회, 시설보수 및 개선 등 10회
2020	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사, 시설보수 및 관리	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사 12회, 시설보수 및 관리 2회
2021	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사, 시설보수 및 관리	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사 12회, 물탱크 청소 2회, 시설보수 2회
2022	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사, 시설보수 및 관리	• 먹는물 공동시설 소규모 개선사업 - 수질검사 12회, 물탱크 청소 2회, 시설보수 2회
2023	미추진	미추진

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업비 예산집행율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	10	10	10	10	미추진
	실적		8.8	3.6	2.0	3.1	-
성과	계획	당해년도	100%	100%	100%	100%	미추진
	실적		88%	36%	20%	31%	-
목표 달성도(%)			88	36	20	31	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 해당사항 없음
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	미추진
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 -
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

3 [물관리 3-4]

수도과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
물관리	III-1-가-4	상수도 급수구역 블록시스템 구축	기존	'19 ~ 23	안동혁 (3784)

□ 사업개요

- 유수율 제고에 따른 수도물 생산량 감소로 상수도 경영관리 개선

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 12개 소블록시스템 구축 • 12개 소블록 유량,수압 계측기기 설치	• 12개 소블록시스템 구축완료 - 문막, 일산동, 단구동, 단계동, 학생동 일원 • 구축 완료 소블록 계측기기 설치 완료
2020	5개 소블록시스템 구축 (원주 신구배수지 급수구역 일원)	• 11개 소블록 실시설계 완료 및 계약 (지정면, 무실동, 태장동 일원-현대화사업 추진)
2021	5개 소블록시스템 구축 (구곡배수지 급수구역 일원)	• 우선사업대상지 11개 소블록시스템 구축완료 (태장동, 우산동, 봉산동 일원)
2022	5개 소블록시스템 구축 (봉화산배수지 급수구역 일원)	2020년부터 지방상수도 현대화사업 위탁 구축
2023	5개 소블록시스템 구축 (읍면배수지 급수구역 일원)	• 사업대상지(전체분) 5개 소블록시스템 구축완료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 블록구축 개수(개))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	2,800	1,500	1,500	7,839	1,500
	실적		3,200	4,089	2,649	3,777	1,610
성과	계획	당해년도	12블록	5블록	11블록	5블록	5블록
	실적		12블록	0블록	11블록	4블록	5블록
목표 달성도(%)			100	0	100	80	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 블록시스템 구축에 따른 관망관리체계 개선 및 유수율 제고
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	블록구축 개수(블록)
	실적 / 계획	5 블록 / 5 블록
	달성률(%)	100 %
예산집행 노력	실적 / 계획	1,500 백만원 / 1,610백만원
	집행률(%)	100 %
추진실적 근거자료		현대화사업 집행내역
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

③ [물관리 3-5]

환경과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
물관리	III-1-나-1	비점오염 저감시설 운영관리	기존보완	'19 ~ 23	봉재남 (3064)

□ 사업개요

- 사업기간: 2019 ~ 2023
- 대 상: 자연형시설 1개소: 소초면 축산단지(인공습지)[시설용량 4,430m², 면적 9,148m²]
/ 장치형시설 46개소(원주기업도시 17, 무실2지구 5, 강원혁신도시 18, 문막반계산단 6)
- 사업내용: 모니터링, 준설, 주변 환경정비 등 유지·관리

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 120회, 수질검사 33회	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 120회, 수질검사 33회
2020	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 120회, 수질검사 33회	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 120회, 수질검사 33회
2021	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 184회, 수질검사 49회	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 184회, 수질검사 49회
2022	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 184회, 수질검사 49회	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 184회, 수질검사 49회
2023	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 184회, 수질검사 49회	• 비점오염저감시설 운영관리 - 점검 184회, 수질검사 49회

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 수질검사율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	64	64	110	135	144.1
	실적		55	59	93	89	125
성과	계획	당해년도 (수질검사율)	100%	100%	100%	100%	0%
	실적		100%	100%	100%	100%	100%
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 비점오염물질 저감을 통한 하천수질 개선
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	점검률, 수질검사율(%)
	실적 / 계획	100% / 0%
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	125백만 원/144.1백만 원
	집행률(%)	86.7%
추진실적 근거자료		육안검사 기록 대장, 관리운영대장, 수질분석 결과대장
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-1] (사업종료)

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난/ 재해	IV-1-가-1	무진 재해위험개선지구 정비사업	기존	'19 ~ 20	전배진 (3264)

□ 사업개요

- 원주시 봉산동 1008-1번지 일원 붕괴위험지구 정비
 - 가옥철거(66동) 및 사면보호, 배수로 정비

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	•공사준공 및 사업 분석 및 점검 용역 시행	• 공사 준공 : 19. 10. 11.
2020	•사업 분석 및 점검 용역 시행	• 용역 발주 : 20. 11. 20.
2021	사업종료	사업종료
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업추진공정율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	10,479	10,480	사업 종료	사업 종료	사업 종료
	실적		9,875	10,022	-	-	-
성과	계획	당해년도	50%	100%	사업 종료	사업 종료	사업 종료
	실적		50%	100%	-	-	-
목표 달성도(%)			100	100	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 사업종료
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-2] (사업종료)

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난/ 재해	IV-1-가-2	봉산 재해위험개선지구 정비사업	기존	'19 ~ 21	전배진 (3264)

□ 사업개요

- 원주시 봉산동 1003-1번지 일원 붕괴위험지구 정비
 - 가옥철거(95동) 및 사면보호, 배수로 정비

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 총사업비 변경 및 공사 착공	• 공사 착공 19. 03. 28. • 총사업비 변경 19. 08. 07.
2020	• 보상 완료 및 공사 준공	• 토지 84필지 보상완료 • 공사 준공 20. 12. 16.
2021	• 사업 분석 및 점검 용역 시행	• 용역 준공 : 21. 11. 26.
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업추진공정율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	14,075	16,445	16,445	사업종료	사업종료
	실적		13,443	15,558	15,631	-	-
성과	계획	당해년도	50%	100%	100%	사업 종료	사업 종료
	실적		100%	100%	100%	-	-
목표 달성도(%)			100	100	100	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 해당사항 없음(사업종료)
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-3]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난/ 재해	IV-1-가-3	풍수해보험료 가입지원	기존	'19 ~ 23	김종영 (3263)

□ 사업개요

○ 태풍, 홍수, 지진 등의 풍수해로 발생하는 국민의 재산피해를 보상하기 위해 행정안전부가 권장하고 민간보험사가 운영하는 정책보험

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 주택 400건/온실 10,000㎡ 가입	• 주택 806건/온실 20,975㎡ 가입
2020	• 주택 400건/온실 12,000㎡ 가입	• 주택 596건/온실 59,672㎡ 가입
2021	• 주택 400건/온실 13,000㎡ 가입	• 주택 524건/온실 116,251㎡ 가입
2022	• 주택 400건/온실 14,000㎡ 가입	• 주택 578건/온실 116,311㎡ 가입
2023	• 주택 400건/온실 15,000㎡ 가입	• 주택 624건/온실 102,507㎡ 가입

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 주택(건)/온실(㎡), %)

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	49	52	60	60	68
	실적		10	14	22	40	68
성과	계획	당해년도	400/10,000	450/12,000	500/13,000	550/14,000	600/15,000
	실적		806/20,975	596/59,672	524/116,251	578/116,311	624/102,507
목표 달성도(%)			202/210	132/497	109/894	105/831	104/683

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

○ (성과 및 효과)

- 저렴한 보험료로 예기치 못한 풍수해 피해로부터 시민들의 재산피해 보전

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	풍수해보험 가입 주택(건)
	실적 / 계획	624 건 / 600 건
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	68 백만원 / 68 백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		사업완료 보고서
최종점검		매우 우수(20)

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 풍수해보험 홍보 활성화 추진

○ 성과지표 조정사항

- 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-4]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난/ 재해	IV-1-가-4	방문안전교육	기존	'19 ~ 23	한의진 (3664)

□ 사업개요

- 교육대상: 안전취약계층(어린이, 학생 및 노인 등)
- 교육내용: 교통, 화재, 학교폭력, 성폭력, 심폐소생술 등 예방 및 대처교육

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 방문안전교육 활성화(대상사 확대, 교육프로 그램 개발 등)	• 관내 어린이집, 학생 및 노인 교육 실시 - 유치원, 어린이집 712회/23,604명 - 초.중.고등학교 709/29,325명 - 경로당 125/4,811명
2020	• 방문안전교육 활성화(대상사 확대, 교육프로 그램 개발 등)	• 관내 어린이집, 학생 및 노인 교육 실시 - 유치원, 어린이집 630회/15,552명 - 초.중.고등학교 588회/16,184명 - 경로당 644회/4,042명
2021	• 방문안전교육 활성화(대상사 확대, 교육프로 그램 개발 등)	• 관내 어린이집, 학생 및 노인 교육 실시 - 유치원, 어린이집 810회/16,711명 - 초.중.고등학교 656회/16,052명 - 경로당 144회/1,364명
2022	• 방문안전교육 활성화(대상사 확대, 교육프로 그램 개발 등)	• 관내 어린이집, 학생 및 노인 교육 실시 - 유치원, 어린이집 707회/ 13,310명 - 초.중.고등학교 815회/ 19,735명 - 경로당 402회/ 7,866명
2023	• 방문안전교육 활성화(대상사 확대, 교육프로 그램 개발 등)	• 관내 어린이집, 학생 및 노인 교육 실시 - 유치원, 어린이집 647회/ 15,232명 - 초.중.고등학교 1,086회/ 18,177명 - 경로당 417회/ 4,508명

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 교육인원(명))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	37	38	39	40	43
	실적		39	37	40	43	43
성과	계획	당해년도	61,000	62,000	63,000	40,000	55,000
	실적		57,740	35,778	32,763	40,911	37,917
목표 달성도(%)			96	57.7	94	102	69

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 취약계층에 대한 안전교육 접근기회 향상 및 시민 만족도 향상에 기여
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	교육인원(명)
	실적 / 계획	37,917 명 / 55,000명
	달성률(%)	69%
예산집행 노력	실적 / 계획	43 백만원 / 43백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		2023년도 취약계층 방문안전교육 실적 보고
최종점검		우수(15)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-5]

안전총괄과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난/재해	IV-2-가-1	재난대응 안전한국훈련	기존보완	'19 ~ 23	이보람 (3682)

□ 사업개요

- **훈련목표:** 재난대응 역량강화 및 재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 및 군부대 등 관계 기관과의 협업가능체계 구축 등
- **참여기관:** 원주소방서, 원주경찰서 등 관내 18개 유관기관 및 단체
- **훈련방법:** 훈련 주제별 토론훈련(1회), 현장훈련(1회), 대피훈련(3회)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	· 산불 및 다중이용시설 화재 대응 훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 4회, 안전점검 1회)	· 산불 및 다중이용시설 화재 대응 훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 4회, 안전점검 1회)
2020	· 2개 이상의 복합재난상황 대응훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 4회, 안전점검 1회)	· 비대면 사이버교육 대체 : 훈련담당 2명
2021	· 2개 이상의 복합재난상황 대응훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 4회, 안전점검 1회)	· 토론훈련 1회, 안전점검 1회
2022	· 2개 이상의 복합재난상황 대응훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 4회, 안전점검 1회)	· 다중밀집시설화재 및 산불 대응 훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 1회, 대피훈련 3회)
2023	· 2개 이상의 복합재난상황 대응훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 4회, 안전점검 1회)	· 다중밀집시설화재 대응 훈련 (토론훈련 1회, 현장훈련 1회, 대피훈련 3회)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 점검결과)

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8
	실적		20	5.8	5.8	20.9	23
성과	계획	당해년도	우수	우수	우수	우수	우수
	실적		우수	대체(교육이수)	우수	우수	우수
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 토론훈련 및 현장훈련이 시나리오에 따라 체계적으로 이루어졌으며 훈련을 위한 사전 회의로 재난현장 대응 유관기관과의 협업체계를 공고히 함.
- 점검결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	재난대응 안전한국훈련 실시
	실적 / 계획	우수 / 우수
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	23 백만원 / 25.8 백만원
	집행률(%)	90%
추진실적 근거자료		훈련 결과보고서
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-6]

생태하천과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난 재해	IV-2-가-2	원주천 댐 건설사업	기존	'19 ~ '23	안화영 (3242)

□ 사업개요

- 위 치 : 판부면 신촌리 838-5번지 신촌천 일원
- 사업량 및 사업비 : 콘크리트중력식댐 1기 / 90,590백만 원
- 사업기간 : 2014년~2024년(11년)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 2차 보상완료	• 2차 보상완료 • 본댐공사 착수
2020	• 본댐 건설 착조	• 본댐착조(20%) • 이설도로공사 착수
2021	• 본댐 건설 착조	• 본댐착조(27%) • 이설도로(15%)
2022	• 본댐 건설 착조	• 본댐착조(70%) • 이설도로(100%)
2023	• 본댐 건설 착조	• 본댐착조(85%)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 공사 공정율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해연도	13,574	14,827	11,000	10,834	6,487
	실적		13,574	14,827	11,000	10,834	6,487
성과	계획	당해연도 (사업공정)	20%	40%	50%	70%	0%
	실적		20%	40%	50%	70%	100%
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 상류지역 홍수방어대책 설치를 위한 본 댐 및 이설도로 공사 추진
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	당해연도 공사 공정률(%)
	실적 / 계획	100% / 0%
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	6,487백만원 / 6,487백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		공정보고서
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-7]

생태하천과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난 재해	IV-2-가-3	하천재해 예방사업	기존보완	'19 ~ 23	안화영 (3242)

□ 사업개요

- 위 치 : 신림면 신림리, 문막읍 반계리, 판부면 신촌리, 소초면 흥양리
- 사업량 및 사업비 : 하천정비 L=17.876km / 69,478백만 원
- 사업기간 : 2012 ~ 2024년(14년)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 화천(행구3교 완료) • 주포천(4차분 준공) • 신촌, 원심천(설계완료) 	<ul style="list-style-type: none"> • 화천(행구3교 완료) • 주포천(4차분 기성율 85%) • 신촌, 원심천(설계 70%)
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 주포천(5차분 착수) • 신촌, 원심천(보상 및 사업착수) 	<ul style="list-style-type: none"> • 주포천(5차분 보상 및 착수) • 신촌, 원심천(보상 및 사업착수)
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 주포천(5.6차분 완료) • 신촌, 원심천(사업추진) 	<ul style="list-style-type: none"> • 주포천(신림지구) 사업 착수 • 신촌, 원심천 사업 착수
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 신촌, 원심천(사업추진) 	<ul style="list-style-type: none"> • 주포천(신림지구) 사업 추진 • 신촌, 원심천 사업 추진
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 신촌, 원심천(사업추진) 	<ul style="list-style-type: none"> • 주포천(신림지구) 사업 추진 • 신촌, 원심천 사업 추진

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업추진공정률(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	5,800	1,213	6,667	5,570	1,213
	실적		49,374	126	2,780	4,333	6,487
성과	계획	당해년도	26%	27%	50%	60%	0%
	실적		26%	27%	50%	60%	100%
목표 달성도(%)			100	51	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 하천정비를 통한 여름철 집중 호우발생 시 침수피해저감 및 친환경 하도정비
- (점검결과)

구분	세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)
	실적 / 계획
	달성률(%)
예산집행 노력	실적 / 계획
	집행률(%)
	추진실적 근거자료
최종점검	매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

4 [재난/재해 4-8] (사업종료)

하수과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
재난 재해	IV-2-가-4	원주시 노후관로 정비사업	기존	'19 ~ 22	한기수 (4272)

□ 사업개요

- 노후 하수관로 정비
 - 긴급보수 14.498km, 일반보수 23.617km

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 재원협의 및 강원도 기술심의 완료 • 공사 착공	• 재원협의 및 강원도 기술심의 완료 • 공사 착공
2020	• 공사 추진	• 공사 추진(공정률 50%) • 총사업비 변경 신청(환경청)
2021	• 공사 추진	• 공사 추진(공정률 75%) • 총사업비 변경 승인(환경청) • 설계변경
2022	• 공사 준공	• 공사 추진(공정률 100%)
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 공사 공정률(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	7,484	8,679	5,705	4,289	사업종료
	실적		826	8,544	14,012	17,790	-
성과	계획	당해년도	10%	40%	35%	15%	사업종료
	실적		10%	30%	35%	15%	-
목표 달성도(%)			100	75%	100%	100	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 해당사항 없음
- (점검결과)

구분	세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)
	실적 / 계획
	달성률(%)
예산집행 노력	실적 / 계획
	집행율(%)
추진실적 근거자료	
최종점검	

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림·생태계	V-1-가-1	산불방지 대책	기존	'19 ~ 23	최성환 (3142)

□ 사업개요

- 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영
 - 봄 철 : 2023.02.01.~ 05.15. (3.5개월) / 가을철 : 2023.11.01.~12.15. (1.5개월)
- 산불감시인력, 진화인력, 공중계도 임차헬기 등 배치, 기계화진화, 등짐펌프 등 진화장비 확충
- 사업비 : 3,390백만원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대) • 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동 (고정, 순찰감시) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대) • 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동 (고정, 순찰감시)
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대) • 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동 (고정, 순찰감시) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대) • 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동 (고정, 순찰감시)
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개 대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대) • 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동 (고정, 순찰감시) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개 대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대) • 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동 (고정, 순찰감시)
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개 대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산불방지대책본부 및 상황실 설치·운영 • 산불예방 입산통제구역 지정·고시 : 32개소 / 16,100ha • 산불진화 및 계도용 공동임차헬기 배치 : 원주시, 횡성군 • 산불 조망형 및 밀착형 무인감시카메라운영 : 10개소 • 산불전문예방진화대 배치 : 4개 대 (본부 2개 대, 부론·신림 각1개 대)

• 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동
(고정, 순찰감시)

• 산불유급감시원 배치 : 18개 읍면동
(고정, 순찰감시)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 산불 건수)

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	3,390	3,390	3,390	3,878	3,390
	실적		2,671	3,468	2,925	3,878	3,390
성과	계획(건)	당해년도	0	0	0	0	0
	실적(건)		0	0	0	100	1
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행4차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 대형산불 1건
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	대형산불 제로(산불건수)
	실적 / 계획	1 건 / 0 건
	달성률(%)	100%(달성율)
예산집행 노력	실적 / 계획	3,390 백만원 / 3,390 백만원
	집행률(%)	100%(달성률)
추진실적 근거자료		산불발생 보고서
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

[산림/생태계 5-2]

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태 계	V-1-가-2	산림병해충 방제	기존	'19 ~ 23	박민규 (3143)

□ 사업개요

○ 산림병해충 방제

- 사업기간 : 2019. 1.~2023.12.
- 사업비 : 761백만원
- 사업내용 : 소나무 재선충병 예찰 및 방제, 솔잎혹파리 등 돌발해충 적기방제

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2020	• 산림병해충방제(290ha)	• 소나무재선충병 등 산림병해충 490ha 방제
2021	• 산림병해충방제(270ha)	• 소나무재선충병 등 산림병해충 876ha 방제
2022	• 산림병해충방제(500ha)	• 소나무재선충병 등 산림병해충 489 ha 방제
2023	• 산림병해충방제(258ha)	• 소나무재선충병 등 산림병해충 388 ha 방제

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 방제면적(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	545	545	545	545	761
	실적		545	575	755	655	757
성과	계획	당해년도	300ha	290ha	280ha	270ha	258ha
	실적		683.16ha	490ha	876ha	489ha	388ha
목표 달성도(%)			100	100	100	100	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과) - 방제량 388ha
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	방제면적(ha)
	실적 / 계획	388 ha / 258ha
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	757백만원 / 761백만원
	집행률(%)	99%
추진실적 근거자료		예산집행 실적보고
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

5 [산림/생태계 5-3]

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태 계	V-1-가-3	산림재해방지 사방사업 확충	기존	'19 ~ 23	박민규 (3163)

□ 사업개요

- 사방댐 신설 및 사방댐 준설관리

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 사방댐 신설 4개소 • 사방댐 준설관리 4개소	• 사방댐 신설 4개소 완료 • 사방댐 준설관리 4개소 완료
2020	• 사방댐 신설 5개소 • 사방댐 준설관리 5개소	• 사방댐 신설 4개소 완료 • 사방댐 준설관리 8개소 완료
2021	• 사방댐 신설 5개소 • 사방댐 준설관리 5개소	• 사방댐 신설 5개소 완료 • 사방댐 준설관리 3개소 완료
2022	• 사방댐 신설 5개소 • 사방댐 준설관리 5개소	• 사방댐 신설 9개소 완료 • 사방댐 준설관리 2개소 완료
2023	• 사방댐 신설 5개소 • 사방댐 준설관리 5개소	• 사방댐 신설 6개소 완료 • 사방댐 준설관리 4개소 완료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사방댐신설 및 준설관리개소(개소))

구분	목표수준	2019	2020	2021	2022	2023	
예산	계획	당해년도	1,113	1,113	1,241	2,500	1,113
	실적		1,019	1,099	1,241	2,500	1,367
성과	계획	당해년도	8개소	10개소	8개소	11개소	10개소
	실적		8개소	12개소	8개소	9개소	10개소
목표 달성도(%)			100	120	100	82	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 주요성과
 - 사방댐 신설 6개소, 사방댐 준설관리 4개소 완료
- (점검결과)

구분	세부내용	
목표달성 노력	지표명(단위)	사방댐 신설 및 준설관리 (개소)
	실적 / 계획	10 개소 / 10 개소
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	1,367백만원 / 1,405백만원
	집행률(%)	97%
추진실적 근거자료		준공서류 및 예산내역
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선.보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

5 [산림/생태계 5-4]

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림·생태계	V-1-나-1	숲 가꾸기 사업	기존보완	'19 ~ 23	박규범 (3162)

□ 사업개요

- 산림 숲가꾸기 사업

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 숲가꾸기 사업 계획 : 1,592ha	• 숲가꾸기 사업 완료 : 1,614ha
2020	• 숲가꾸기 사업 계획 : 1,592ha	• 숲가꾸기 사업 완료 : 1,466ha
2021	• 숲가꾸기 사업 계획 : 1,592ha	• 숲가꾸기 사업 완료 : 1,275ha
2022	• 숲가꾸기 사업 계획 : 1,592ha	• 숲가꾸기 사업 완료 : 1,178ha
2023	• 숲가꾸기 사업 계획 : 940ha	• 숲가꾸기 사업 완료 : 940ha

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 숲가꾸기사업면적(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	2,450	2,450	1,980	2,809	2,007
	실적		2,430	2,315	1,777	2,809	1,958
성과	계획	당해년도	1,592	1,592	1,592	1,592	940
	실적		1,614	1,466	1,275	1,178	940
목표 달성도(%)			80	97	80	74	100

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 숲가꾸기 사업 940ha 완료
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	숲가꾸기 사업(ha)
	실적 / 계획	940ha / 940 ha
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	1,958 백만원 / 2,007 백만원
	집행률(%)	98%
추진실적 근거자료		준공서류 및 예산내역
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

5 [산림/생태계 5-5] (사업종료)

공원녹지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태 계	V-1-나-2	문막일반산업단지 미세먼지 저감숲 조성	신규 (발굴)	'19	안지연 (3646)

□ 사업개요

- 문막 일반산업단지 미세먼지 저감숲(도시림) 조성(교목, 관목 등 수목식재)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 미세먼지 저감숲 2ha 조성	• 미세먼지 저감숲 2ha 조성
2020	사업종료	사업종료
2021	사업종료	사업종료
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, %)

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	2,000	사업종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		1,700	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	2ha	사업종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		2ha	-	-	-	-
목표 달성도(%)			100	-	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)

-

- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항

- 해당 없음

- 성과지표 조정사항

- 해당 없음

5 [산림/생태계 5-6] (사업종료)

공원녹지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태 계	V-1-나-3	명품 가로숲 길 조성사업	기존보완	'19 ~ '22	강수빈 (3652)

□ 사업개요

- 가로수와 어우러진 관목을 식재하여 복층형태의 가로숲길을 조성함으로써 도시경관 이미지 제고 및 미세먼지 저감

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 북원로 명품가로숲길 조성계획 1.8km • 남원로 명품가로숲길 조성계획 1.3km	• 북원로 명품가로숲길 조성 1.8km • 남원로 명품가로숲길 조성 1.3km
2020	• 혁신도시 명품가로숲길 조성사업 1.0km	• 혁신도시 명품가로숲길 조성사업 2.4km
2021	• 혁신도시 명품가로숲길 조성사업 1.0km	• 동부순환로 명품가로숲길 조성사업 2.0km
2022	• 혁신도시 명품가로숲길 조성사업 1.0km	• 혁신로 외 3개 노선 6.3km
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 가로숲길 조성(km))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	1,000	400	400	400	사업종료
	실적		990	200	200	2,000	-
성과	계획	당해년도	3.1km	1.0km	1.0km	1.0km	사업종료
	실적		3.1km	2.4km	2.0km	6.3km	-
목표 달성도(%)			100	100	100	100	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 도로 옆 유희토지 내 가로수와 조화로운 관목식재로 도시미관 개선
- 복층가로숲길을 조성함으로써 배기가스, 미세먼지 저감 등 대기질 개선
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료 -
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당 없음
- 성과지표 조정사항
 - 조기 목표 달성에 따른 2021년 사업으로 전체 구간 사업 종료

5 [산림/생태계 5-7](사업종료)

산림과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태 계	V-1-나-4	미세먼지 저감 조림사업	기존	'19	안지연 (3162)

□ 사업개요

- 사업내용 : 미세먼지 저감 조림 조성(80ha)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 미세먼지 저감 조림 계획 : 80ha	• 미세먼지 저감 조림 완료 : 80ha
2020	사업종료	사업종료
2021	사업종료	사업종료
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 조림면적(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	938	사업종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		938	-	-	-	-
성과	계획	당해년도	80ha	사업종료	사업종료	사업종료	사업종료
	실적		80ha	-	-	-	-
목표 달성도(%)			100	-	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 미세먼지 저감림 조성을 목적으로 침·활 다층 혼효림을 조성하여 미세먼지 저감 및 대기정화 기능 극대화
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

5 [산림/생태계 5-8]

생태하천과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태 계	V-2-가-1	단계천 생태하천 복원사업	기존	'19 ~ 23	손건희 (2528)

□ 사업개요

- 하천 복개철거, 수생태 복원, 유지용수 확보 및 수질개선, 친수 공간조성 등

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 설계의 안전성 검토 및 조달청 설계적정성 검토, 설계용역 완료 및 공사 착공	• 설계의 안전성 검토 및 조달청 설계적정성 검토, 설계용역 완료 및 공사 착공
2020	• 단계천 생태하천 복원사업(원주천합류부 ~ 신일유도빌, 800m)	• 공사 진행(복개 구조물 철거 및 관로공사 시행)
2021	• 단계천 생태하천 복원사업(신일유도빌 ~ 미광연립, 850m)	• 1~3복개구간 좌우안 복개철거 및 옹벽시공 • 4~5비복개구간 옹벽 및 조경석 설치 • 3, 4교량 설치 완료
2022	• 하반기 단계천 생태하천 복원사업 준공 예정	• 1~3 복개구간 좌우안 복개철거 및 옹벽시공 • 1~2 도로포장
2023	• 단계천 생태하천 복원사업 준공	• 인도교 설치, 2교량 설치, 도로포장, 판석설치, 경사로 및 계단 설치, 자연석 쌓기, 수목식재 등 생태환경 조성, 기타 부대공

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 사업추진 공정율(%))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	15,546	14,000	8,700	5,020	비예산
	실적		25,800	5,434	8,700	5,290	비예산
성과	계획	당해년도	30%	40%	65%	100%	0%
	실적		10%	35%	55%	86%	100%
목표 달성도(%)			33.3	87.5	85%	86%	100%

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)

- 건전화 된 도심하천에 깨끗하고 풍부한 물 공급 추진으로 수질개선에 기여하고 자연과 공존하는 생태하천으로 복원

- (점검결과)

구분	세부내용	
목표달성 노력	지표명(단위)	사업공정율
	실적 / 계획	100% / 0%
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	비예산
	집행률(%)	비예산
추진실적 근거자료		사업공정보고서
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항

- 해당사항 없음

- 성과지표 조정사항

- 2023년 11월 사업 준공

5 [산림/생태계 5-9]

생태하천과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태계	V-2-가-2	원주천 생태하천 모니터링	기존	'19 ~ 22	손건희 (2528)

□ 사업개요

- 원주천의 수생태계 변화 모니터링으로 복원효과 확인
 - 환경부 『생태하천복원사업 업무처리지침(2017.12.22.)』에 따른 사후모니터링(5년간)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2018	• 1차년도 용역수행	• 수질 및 수생태계 변화 모니터링
2019	• 2차년도 용역수행(차년도 모니터링 결과·문제점 조사 후 2차년도 모니터링 반영)	• 수질 및 수생태계 변화 모니터링 및 사업 전·후 변화 분석·점검 주민만족도 조사 1회
2020	• 3차년도 용역수행(2차년도 모니터링 결과·문제점 조사 후 3차년도 모니터링 반영)	• 수질 및 수생태계 변화 모니터링 및 사업 전·후 변화 분석·평가 주민만족도 조사 1회
2021	• 4차년도 용역수행(3차년도 모니터링 결과·문제점 조사 후 4차년도 모니터링 반영)	• 수질 및 수생태계 변화 모니터링 및 사업 전·후 변화 분석·평가 주민만족도 조사 1회
2022	• 5차년도 용역수행(4차년도 모니터링 결과·문제점 조사 후 5차년도 모니터링 반영)	• 수질 및 수생태계 변화 모니터링 및 사업 전·후 변화 분석·평가 주민만족도 조사 1회
2023	• 원주천 수생태계 변화 모니터링 수질조사 13회	• 2018~2022년도까지 5년간 사후 모니터링 최종 완료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 모니터링 횟수 및 조사 횟수(회))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	25	25	25	25	사업종료
	실적		50	22	22	22	-
성과	계획	당해년도	13회	13회	13회	13회	사업종료
	실적		13회	13회	13회	13회	-
목표 달성도(%)			100	100	100	100	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 원주천의 수질 및 수생태계 변화 모니터링, 사업 전·후 변화 분석·평가하여 수질, 수생태계 향상 효과
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	2018~2022년까지 5년간 사후 모니터링 최종 완료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 2022년 5차년도 원주천 모니터링 최종 완료
 - * 「생태하천복원사업 업무추진 지침」에 따른 사업 완료 후 5년간 사후모니터링 2018~2022년도까지 5년간 추진 완료

5 [산림/생태계 5-10]

환경과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
산림· 생태계	V-2-가-3	생태계교란생물 퇴치사업	기존	'19 ~ 23	박지나 (3055)

□ 사업개요

- 생태계교란생물 퇴치사업 : 전문인력 및 장비를 동원한 교란종 균락지 제거사업 실시

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(240,000㎡)	• 중장비임차를 통한 교란식물 균락 뿌리제거 - 제거사업 면적 : 196,600㎡
2020	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(300,000㎡)	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(97,890㎡)
2021	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(360,000㎡)	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(122,344㎡)
2022	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(420,000㎡)	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(129,277㎡)
2023	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(100,000㎡)	• 원주시 전역 생태계교란식물 제거(114,718㎡)

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 생태교란식물 제거면적(ha))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	78	50	60	140	60
	실적		75	30	60	60	59
성과	계획	당해년도	175,000	110,000	130,000	420,000	100,000
	실적		196,600	97,890	122,344	129,277	114,718
목표 달성도(%)			112	89	94	31	115

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
 - 생태계교란 식물 제거를 통한 토착종 서식지 보호 및 생물 종다양성 보전
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	생태계교란생물 퇴치사업
	실적 / 계획	114,718㎡ / 100,000㎡
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	59 백만원 / 60 백만원
	집행률(%)	98%
추진실적 근거자료		'23년 사업 정산자료
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 생태계 교란식물 번식력에 비해 예산확보 어려움으로 퇴치사업 추진의 한계점 발생
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

⑥ [적응기반 6-1] (사업종료)

기후에너지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
적응 기반	VI-1-가-1	저소득층 에너지효율개선(WAP) 사업	기존보완	'19 ~ 23	이주연 (3184)

□ 사업개요

- 단열이 취약한 저소득층 주택의 단열시공으로 에너지효율을 개선하여 에너지복지에 기여
 - 창호, 바닥, 난방배관, 보일러 교체 등 단열 시공 지원

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 저소득층 가구 에너지효율 시공 - 20가구	• 저소득층 가구 에너지효율 시공 - 19가구
2020	• 저소득층 20 가구 에너지효율 시공	• 저소득층 가구 에너지효율 시공 - 18가구
2021	• 저소득층 20 가구 에너지효율 시공	• 저소득층 가구 에너지효율 시공 - 20가구
2022	• 저소득층 20 가구 에너지효율 시공	-사업종료-
2023	• 저소득층 20 가구 에너지효율 시공	-사업종료-

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 시공가구 수(가구))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	75	75	75	75	사업종료
	실적		74.9	74.5	74.6	사업종료	-
성과	계획	당해년도	20	20	20	20	사업종료
	실적		19	18	20	사업종료	-
목표 달성도(%)			95	90	100	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 관내 저소득층 주민들의 에너지 복지를 향상 시키며 온실가스 감축 기여
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

- 미흡 및 개선.보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

6 [적응기반 6-2]

기후에너지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
기후	VI-1-가-2	기후변화·에너지 관련 시설 위탁운영	기존	'19 ~ 23	윤창석 (3199)

□ 사업개요

- 기후변화대응 연구 및 교육, 기후변화 전시 및 체험 프로그램 운영
신재생에너지 등 산업육성에 필요한 인력 양성 및 교육
- 기후변화의 심각성에 대한 시민들의 인식제고를 위한 홍보와 체험, 교육학습 운영

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 기후변화·에너지 관련 시설 위탁 운영	• 기후변화대응 관련 교육, 프로그램 개발 • 기획전시회 개최, 체험 프로그램 운영
2020	• 기후변화·에너지 관련 시설 위탁 운영	• 기후변화·에너지 관련 시설 위탁 운영
2021	• 기후변화·에너지 관련 시설 위탁 운영	• 기후변화대응 관련 교육·체험 프로그램 운영 • 테마 및 기획전시 프로그램 운영
2022	• 기후변화·에너지 관련 시설 위탁 운영	• 기후변화대응 관련 교육·체험 프로그램 운영 • 테마 및 기획전시 프로그램 운영
2023	• 기후변화·에너지 관련 시설 위탁 운영	• 기후변화대응 관련 교육·체험 프로그램 운영 • 테마 및 기획전시 프로그램 운영

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 교육참여인원(명))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	500	500	500	500	689
	실적		500	607	607	607	689
성과	계획	당해년도	98,000	98,200	98,400	98,600	71,789
	실적		125,689	26,746	44,441	77,187	98,376
목표 달성도(%)			125	27.2	45.2	78.2	137

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- (성과 및 효과)
- 시민의 기후변화에 대한 인식 고취를 통하여 실천의식 확산에 기여
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	참여 인원(명)
	실적 / 계획	98,376 명 / 71,789명
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	689 백만원 / 689 백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		사업 결과보고서
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
- 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
- 해당사항 없음

6 [적응기반6-3]

기후에너지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
기후	VI-1-가-3	시민참여형 기후변화 대응행사 등 운영	기존	'19 ~ 23	유지안 (3174)

□ 사업개요

- 시민 참여형 기후변화대응 행사(지구의날 행사, 교통주간행사) 개최
 - (지구의 날 행사) 기획전시, 어린이 환경뮤지컬, 차 없는 원일로 행사
 - (교통주간행사) 체험행사, 캠페인, 토론회 개최

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 기후주간행사, 친환경교통주간행사 및 미세먼지 줄이기행사 운영	• 기후주간행사 8,650명 • 교통주간 및 미세먼지 행사 7,300명
2020	• 기후주간행사, 친환경교통주간행사 및 미세먼지 줄이기행사 운영	• 기후주간행사 5,549명 • 교통주간 및 미세먼지 행사 취소
2021	• 기후주간행사, 친환경교통주간행사 및 미세먼지 줄이기행사 운영	• 기후주간행사 10,711명 • 교통주간 및 미세먼지 행사 1,659명
2022	• 기후주간행사, 친환경교통주간행사 및 미세먼지 줄이기행사 운영	• 기후주간행사 13,604명 • 교통주간 및 미세먼지 행사 2,716명
2023	• 기후주간행사, 친환경교통주간행사 및 미세먼지 줄이기행사 운영	• 기후주간행사 5,398명 • 교통주간 및 미세먼지 행사 1,970명

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 참여인원(명))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	70	70	70	70	70
	실적		70	30	78	78	78
성과	계획	당해년도	23,250명	24,500명	25,750	27,000	28,000
	실적		35,626명	5,549명	12,370	16,320	7,368
목표 달성도(%)			100	22.65	48	60	26.3

□ 2023년도(시행4차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 기후변화주간행사를 통해 기후변화에 대한 시민들의 의식 제고
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	참여 인원(명)
	실적 / 계획	7,368명 / 28,000명
	달성률(%)	26.3%
예산집행 노력	실적 / 계획	78 백만원 / 70 백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		사업추진 성과보고서
최종점검		보통(12.5)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

6 [적응기반 6-4] (사업종료)

환경과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
적응 기반	VI-1-가-4	어린이체험 환경교육	기존	'19 ~ 20	안희애 (3033)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주입식 교육에서 탈피하여 보고 느끼며 어린이 눈높이에서 쉽고 재미있게 환경문제에 접근할 수 있는 맞춤형 교육

○ 교육대상 : 관내 유치원 및 어린이집(3,000명 내외)

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 어린이체험 환경교육 계획 수립 및 교육실시	• 93회, 2,811명 참여
2020	• 어린이체험 환경교육 계획 수립 및 교육실시	• 48회, 1,052명 참여
2021	사업종료	사업종료
2022	사업종료	사업종료
2023	사업종료	사업종료

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 어린이 환경교육횟수(회))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	50	50	사업 종료	사업종료	사업종료
	실적		48	35	-	-	-
성과	계획	당해년도	100회	120회	사업 종료	사업종료	사업종료
	실적		93회	48회	-	-	-
목표 달성도(%)			93	40	-	-	-

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

○ 성과 및 효과

- 사업종료

○ (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	사업종료
	실적 / 계획	
	달성률(%)	
예산집행 노력	실적 / 계획	
	집행률(%)	
추진실적 근거자료		
최종점검		

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 사업종료

○ 성과지표 조정사항

- 사업종료

⑥ [적용기반 6-5]

기후에너지과

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
기후	VI-1-가-5	기후변화대응 교육프로그램 운영	기존	'19 ~ 23	윤창석 (3199)

□ 사업개요

- 시민참여형 기후변화대응 교육프로그램 운영
 - 기후야 놀자: 교구·교재개발, 교육프로그램 운영, 워크북 공모전 등

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	• 교구·교재개발, 교육프로그램 운영, 워크북 공모전 등	• 교구·교재개발, 교육프로그램 운영, 워크북 공모전 등
2020	• 기후야 놀자 교육 프로그램: 6,000명 • 네컷만화 공모전: 1,000명	• 기후야 놀자 교육 프로그램: 4,870명 • 네컷만화 공모전: 756명
2021	• 기후변화 대응 프로그램 운영	• 기후야 놀자 교육 프로그램: 5,632명 • 네컷만화 공모전: 1,241명
2022	• 기후변화 대응 프로그램 운영	• 기후야 놀자 교육 프로그램: 5,668명 • 네컷만화 공모전: 186명
2023	• 기후변화 대응 프로그램 운영	• 기후야 놀자 교육 프로그램: 5,796명 • 탄소중립콘텐츠 공모전: 228명

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 교육참여인원(명))

구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	30	30	30	30	30
	실적		30	30	30	30	30
성과	계획	당해년도	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
	실적		7,469	5,626	6,873	5,854	5,796
목표 달성도(%)			103.1	90.7	110.8	94.4	93.4

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 기후변화 교육을 위한 지역 파트너십의 구축과 교육인력의 양성에 기여
- (점검결과)

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	참여 인원(명)
	실적 / 계획	5,796 명 / 6,200명
	달성률(%)	93.4%
예산집행 노력	실적 / 계획	30 백만 원 / 30백만 원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		사업추진 성과보고서
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 해당사항 없음
- 성과지표 조정사항
 - 해당사항 없음

부문	과제번호	세부이행과제	과제유형	기간	담당자 (연락처)
적응 기반	VI-1-가-6	미세먼지 저감사업 (자동차 분야)	기존	'19 ~ 23	전무성, 우혁 (3049, 3048)

□ 사업개요

- 내연기관차량 매연을 저감하여 맑은 공기를 유지하고 쾌적한 도시 대기환경 조성

□ 계획대비 추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2019	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급: 232대 경유자동차 매연저감장치지원: 120대 	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급: 263대 경유자동차 매연저감장치지원: 211대
2020	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급: 242대 경유자동차 매연저감장치지원: 100대 	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급: 261대 경유자동차 매연저감장치지원: 97대
2021	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급(968대) 경유자동차 매연저감장치지원: 195대 	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급: 995대 경유자동차 매연저감장치지원: 429대
2022	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급(766대) 경유자동차 매연저감장치지원: 2대 	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급: 1,834대 경유자동차 매연저감장치지원: 423대
2023	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급(1,532대) 경유자동차 매연저감장치지원: 2대 	<ul style="list-style-type: none"> 친환경차 보급(1,112대) 경유자동차 매연저감장치지원: 195대

□ 성과목표 및 이력관리(백만원, 예산 집행율(%))


구분		목표수준	2019	2020	2021	2022	2023
예산	계획	당해년도	4,096	4,140	20,858	37,156	0
	실적		8,825	5,972	20,020	30,842	21,806
성과	계획	당해년도	100%	100%	100%	100%	100%
	실적		100%	100%	96%	86%	98%
목표 달성도(%)			100	100	96	86	98

□ 2023년도(시행5차) 점검결과

- 성과 및 효과
 - 친환경차 보급 및 경유자동차 매연저감장치 지원을 통한 온실가스 배출 저감 및 대기오염 개선
- (점검결과)


구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	예산 집행률(%)
	실적 / 계획	98% / 100%
	달성률(%)	98%
예산집행 노력	실적 / 계획	21,806 백만원 / 0 백만원
	집행률(%)	100%
추진실적 근거자료		실적 보고, 사업 결과 보고
최종점검		매우 우수(20)

- 미흡 및 개선·보완사항
 - 친환경차 보급 시 출고지연 기간 등을 감안하여 사업 연장 필요
- 성과지표 조정사항
 - 없음



강원특별자치도

새로운 강원! 특별 자치시대!




수신 수신자 참조
(경유)
제목 지방 기후위기 적응대책 '22년도 이행평가 간담회 및 교육 참석자 상시학습 인정 알림

1. 환경부 기후적응과-1410(2023. 6. 20.)호와 관련입니다.

2. 지방 기후위기 적응대책 '22년도 이행평가 간담회 및 교육 참석자 명단을 붙임과 같이 알려드리오니, 해당 시군에서는 교육 참석자들이 상시학습시간을 인정받을 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 일시/장소 : 6. 13(화) 14:00 ~ 17:00 / 서울역 공간모아 8층 회의실
6. 15(목) 14:00 ~ 17:00 / 오송역 오송컨벤션센터 대회의실
나. 상시학습 인정시간 : 3시간

붙임 1. (6. 13) 간담회 및 교육 참석자 명단 1부.
2. (6. 15) 간담회 및 교육 참석자 명단 1부, 끝.



강원특별자치도지사

수신자 강릉시청(환경과), 호천군청(환경과), 영월군청(환경과), 양양군청(환경과), 원주군청(청정환경과), 한국기후변화연구원

주무관 **김요준** 기후변화대책팀장 **김병철** 46-4124241 연일 2023. 6. 21. **최종호**

참조자

시행 에너지과-446 (2023. 6. 21.) 접수

우 24266 강원특별자치도 춘천시 중앙로 1 (봉곡동) / <https://state.gwd.go.kr>

전화번호 033-249-2936 팩스번호 033-249-3175 / psvalma11@korea.kr / 비공개(0)

2024 강원 동계청소년올림픽대회 성공 개최!

참석자 명단 [ㄱ~ㄴ]

번호	성명	지자체	소속	참석 희망일	서명
1	강유희	부산	부산광역시 탄소융합정책과	2023-06-13	강유희
2	고준지	경기	수원시 기후에너지과	2023-06-13	
3	곽원아	대전	대전탄소융합지원센터	2023-06-13	곽원아
4	구할모	경기	여주시 환경과	2023-06-13	김미연
5	권요준	강원	강원도 에너지과	2023-06-13	권요준
6	김가은	서울	동대문구	2023-06-13	
7	김경희	충남	당진시 기후환경과	2023-06-13	
8	김기택	경북	경상북도 포항시 환경정책과	2023-06-13	김기택
9	김영우	서울	송파구 원문환경과	2023-06-13	
10	김희수	인천	인천광역시 부평구	2023-06-13	김희수
11	김병우	제주	제주탄소융합지원센터	2023-06-13	김병우
12	김보경	경기	용인시 기후대기과	2023-06-13	
13	김보미	서울	강서구 녹색환경과	2023-06-13	
14	김보영	경기	용인시 기후대기과	2023-06-13	김보영
15	김보형	서울	종로구 환경과	2023-06-13	
16	김성진	부산	부산광역시 동래구 환경위생과	2023-06-13	김성진
17	김여진	기상청	수도권기상청 기후서비스과	2023-06-13	김여진
18	김영미	광주	광주광역시 (재)국제기후환경센터	2023-06-13	김영미
19	김영석	충남	천안시청 기후대기과	2023-06-13	김영석
20	김영수	서울	관악구청 녹색환경과	2023-06-13	김영수
21	김영숙	서울	강남구 환경과	2023-06-13	김영숙
22	김예슬	광주	광주광역시 (재)국제기후환경센터	2023-06-13	김예슬
23	김환선	서울	문광부 기후환경과	2023-06-13	김환선
24	김은비	광주	광주광역시 광산구청 기후환경과	2023-06-13	
25	김은정	강원	평창군 환경과	2023-06-13	
26	김은지	경기	광명시 기후에너지과	2023-06-13	
27	김재철	충남	공산군 환경위생과	2023-06-13	김재철
28	김정훈	경기	구리시 환경과	2023-06-13	
29	김종필	인천	인천광역시 동진군	2023-06-13	
30	김지연	인천	인천시 환경기후정책과	2023-06-13	
31	김지현	경기	김포시 기후에너지과	2023-06-13	김지현
32	김진경	서울	도봉구 기후환경과	2023-06-13	김진경
33	김진영	강원	한국기후변화연구원	2023-06-13	김진영
34	김정림	강원	양구군 환경과	2023-06-13	
35	김혜민	서울	서대문구 기후환경과	2023-06-13	
36	김희수	전북	전라북도 정읍시 자원순환과	2023-06-13	김희수

교육참석인정알림(강원도 에너지과-446호)

교육참석일시(23.6.13.(화) 14:00~17:00)

참석자 명단 [ㄴ~ㅅ]

번호	성명	지자체	소속	참석 희망일	서명
21	박선영	기상청	대전지방기상청 기후서비스과	2023-06-15	박선영
22	박성희	충북	음성군	2023-06-15	박성희
23	박성훈	충남	충청남도 탄소융합정책과	2023-06-15	박성훈
24	박아영	울산	울산광역시 울주군청	2023-06-15	
25	박종희	경남	경상남도 창원군	2023-06-15	
26	박준성	경북	김천시청 환경위생과	2023-06-15	
27	박상조	부산	부산광역시 기장군 환경위생과	2023-06-15	박상조
28	백수원	충남	논산시 환경과	2023-06-15	
29	변명희	대구	대구광역시 기후환경정책과	2023-06-15	변명희
30	서영숙	충북	청주시	2023-06-15	서영숙
31	서연주	경북	경상북도 구미시	2023-06-15	
32	서현정	경북	경산시청	2023-06-15	서현정
33	손지민	경북	경상북도 의성군청 환경속산과 탄소융합	2023-06-15	손지민
34	손호영	부산	부산광역시 사상구 환경위생과	2023-06-15	손호영
35	송명석	강원	한국기후변화연구원	2023-06-15	송명석
36	신동우	경남	경상남도 창원군	2023-06-15	
37	신승희	경남	경상남도 밀양시	2023-06-15	신승희
38	심지영	경기	시흥시 환경정책과	2023-06-15	심지영

참석자 명단 [ㅇ~]

번호	성명	지자체	소속	참석 희망일	서명
122	한겨레	대구	대구광역시 남구 녹색환경과	2023-06-13	한겨레
123	한대진	강원	한국기후변화연구원	2023-06-13	한대진
124	한승연	경기	의정부시 기후에너지과	2023-06-13	한승연
125	허윤희	인천	인천광역시 남동구	2023-06-13	허윤희
126	홍수진	강원	한국기후변화연구원	2023-06-13	홍수진
127	홍진영	전남	전라남도 해남군	2023-06-13	
128	황수진	경북	군위군 환경과	2023-06-13	
129	황희진	경남	경상남도 김해시	2023-06-13	황희진
130		경기	파주시 환경지도과	2023-06-13	
131		경기	파주시 환경지도과	2023-06-13	
132		경기	파주시 환경지도과	2023-06-13	

교육참석일시(23.6.13.(화) 14:00~17:00)

교육참석일시(23.6.13.(화) 14:00~17:00)

참석자 명단 [보-스]


번호	성명	지자체	소속	참석 희망일	서명
21	박선영	기상청	대전지방기상청 기후서비스과	2023-06-15	박선영
22	박설희	충북	음성군	2023-06-15	박설희
23	박성훈	충남	충청남도 탄소융합정책과	2023-06-15	박성훈
24	박아영	울산	울산광역시 물주군청	2023-06-15	
25	박윤희	경남	경상남도 장영군	2023-06-15	
26	박준성	경북	김천시청 환경위생과	2023-06-15	
27	백성호	부산	부산광역시 기장군 환경위생과	2023-06-15	백성호
28	백수환	충남	논산시 환경과	2023-06-15	
29	변영희	대구	대구광역시 기후환경정책과	2023-06-15	변영희
30	서명숙	충북	청주시	2023-06-15	서명숙
31	서연주	경북	경상북도 구미시	2023-06-15	
32	서현정	경북	경상시청	2023-06-15	서현정
33	손지진	경북	경상북도 의성군청 환경축산과 탄소중립	2023-06-15	
34	손호영	부산	부산광역시 사상구 환경위생과	2023-06-15	손호영
35	송영석	강원	한국기후변화연구원	2023-06-15	송영석
36	신동우	경남	경상남도 장영군	2023-06-15	
37	신승환	경남	경상남도 밀양시	2023-06-15	신승환
38	심지영	경기	시흥시 환경정책과	2023-06-15	심지영

참석자 명단 [미신청자]

번호	성명	소속	이메일	서명
1	이세빈	환경기법정책발전연구원	lsb000@gmail.com	이세빈
	송진욱	전라남도 기후센터과	W.koyers@baram.go.kr	송진욱
	이거원	충청북도 영동군	kwlee0001@korea.kr	이거원
	이은현	충청북도 영동군	lsahyeon162@korea.kr	이은현
	김형환	충청북도 기후정책과	hkh@baram.go.kr	김형환
	김성정	전라남도 기후회 행정센터과	jin1818@korea.kr	김성정
	박혜은	대전광역시 서구	pkh4891@korea.kr	박혜은
	김동희	경기도 안성시	ksj1105@nrc.re.kr	김동희
	김태영	경기도 탄소중립 지원센터	kyt@kric.re.kr	김태영
	최정은	충청남도 원소팀 지원센터	cc@kric.re.kr	최정은
	고은지	경기도 수원시	enul406@korea.kr	고은지
	이성민	전남 해남	667800@korea.kr	이성민
	홍민영	전남 해남	wlsaud030@korea.kr	홍민영
	홍연비	충청도, 기후 이메일 계층 도청	ye813@korea.kr	홍연비
	김정민	전북 전주환경연구원	kimjungeon@wjtanne.kopca.kr	김정민
	서은희	전남 해남연구원		서은희
	이은희	"		이은희


교육참석일시(23.6.15.(목) 14:00~17:00

교육참석일시(23.6.15.(목) 14:00~17:00



새로운 강원! 특별 자치시대!

강원특별자치도



수신 수신자 참조 (경유)


제목 '23년 지방 기후위기 적응대책 역량강화 교육 참석자 상시학습 인정 알림

1. 환경부 기후적응과-1691(2023. 8. 2.)호와 관련입니다.

2. '23년 지방 기후위기 적응대책 역량강화 교육 참석자 명단을 붙임과 같이 알려드리오니, 해당 시·군에서는 교육 참석자들이 상시학습시간을 인정받을 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 교육명 : '23년 지방 기후위기 적응대책 역량강화 교육
 나. 일시 / 장소 : 7. 19(수) 14시~16시(2h) / ZOOM 영상회의
 7. 20(목) 14시~17시(3h) / ZOOM 영상회의
 * 교육 이수를 완료한 경우에 한하며, 이외에는 실 이수시간 적용

붙임 '23년 지방 기후위기 적응대책 역량강화 교육 참석자 명단 1부.



강원특별자치도지사

수신자 동해시청(환경과장), 철원군수(행정환경과장), 한국기후변화연구원, 한국산업연계연구원

주무관 권오준 (담당) 강영철 (장) 최영준 (장)

협조자

시행 에너지정책과-694 (2023. 8. 2.) 협수

번호	지역	소속	이름	인정 시간
74	경기도	경기도 파주시	이주원	1
75		경기 안양시	이지수	2
76		경기 안산시	이지우	5
77		의정부시(예코파이)	전규성	3
78		경기 가평군	정성호	1
79		경기도 탄소중립지원센터	정소영	3
80		가평군	정재원	2
81		경기도 파주시	조윤희	1
82		경기도 성남시	지상은	4
83		강원	한국기후변화연구원	김진영
84	철원군		박해진	2
85	한국기후변화연구원		송영석	5
86	동해시		우선형	2
87	강원도 기후변화대책팀		장병철	2
88	한국기후변화연구원		최정은	4
89	한국산업연계연구원		최형민	4
90	한국산업연계연구원		한진실	5
91	강원특별자치도 에너지과			2
92	충북		충북 음성군	고지희
93		충북 괴산군	김현태	5
94		충북도청 기후대기과	신기섭	2
95		충북 제천시	안우석	2
96		청주시	양지순	3
97		청주시	오진주	3
98		충청북도 진천군	유택상	3
99		충청북도 기후대기과	윤경배	1
100		충청북도 기후대기과	이규원	3
101		충남	충남 예산군	김기원
102	충청남도 홍성군		김미나	4
103	충남대		김재영	3
104	충청남도 청양군		김지숙	2
105	충청남도 탄소중립정책과		박성훈	2
106	단국대학교		박은하	5
107	공주 단국대		양은경	5
108	공주 단국대		유지혜	5
109	충남연구원		윤수향	1
110	충남연구원		이가혜	1
111		충남연구원	이다혜	1

교육참석인정알림(강원도 에너지과-694호)

교육참석일시(23.7.19.(수) 14:00~17:00





새로운 강원! 특별 자치시대!

강원특별자치도



수신 수신자 참조
(경유)

제목 '23년 하반기 지방 기후위기 적응대책 이행점검 관련 교육 참석자 상시학습 인정 알림

1. 환경부 기후적응과-2512(2023. 10. 24.)호와 관련입니다.
2. '23년 하반기 지방 기후위기 적응대책 이행점검 관련 교육 참석자 명단을 붙임과 같이 알려드리오니, 해당 시·군에서는 교육 참석자들이 상시학습시간을 인정받을 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 교육명 : '23년 하반기 지방 기후위기 적응대책 이행점검 관련 교육
 나. 일시 / 장소 : '23. 10. 17(화) 14시~17시(3h) / ZOOM 영상회의
 * 교육 이수를 완료한 경우에 한하며, 이외에는 실 이수시간 적용

붙임 '23년 하반기 지방 기후위기 적응대책 이행점검 교육 참석자 명단 1부. 끝.

강원특별자치도지사

수신자 강릉시장(에너지과장), 동해시장(환경과장), 삼척시장(에너지과장), 속초시장(에너지과장), 원주지방환경연구소장

주무관 **김민호** 기후변화대책 에너지정책과 차장 3020-10, 22.
 담당 **김민호** 장 **김민호**
 형조서
 시행 에너지정책과-6285 (2023. 10. 27.) 접수
 우 24266 강원특별자치도 춘천시 중앙로 1, (봉곡동) / <https://state.gwd.go.kr>
 전화번호 033-249-2936 팩스번호 033-249-3175 / pavlma11@korea.kr / 비공개16)
 2024 강원 동계청소년올림픽대회 성공 개최!

순번	시도	시군구	소속	이름
120	울산	울주군	환경자원과	김해원
121		울주군	환경자원과	박아영
122	세종	본청	환경정책과	이용진
123		경기	분청	기후환경정책과
124			아주대학교 환경안전공학과	김홍경
125		의정부시	기후에너지과	김보경
126		의정부시	기후에너지과	한승연
127		평택시	환경정책과	이현진
128		동두천시	환경보호과	이영광
129		안산시	환경정책과	이지우
130		고양시	환경정책과	이지명
131		과천시	기후환경과	이유진
132		구리시	환경과	허태이
133		오산시	생태하천과	박인우
134		오산시	환경과	이보미
135		용인시	기후대기과	성지선
136		김포시	기후에너지과	이다솔
137		김포시	기후에너지과	장문희
138	강원	본청	에너지정책과	권오준
139			탄소중립지원센터	이도형
140		KRIC		최지혜
141		강릉시	에너지과	김남혁
142		동해시	환경과	우선형
143		삼척시	사회복지과	김아영
144	충북	본청	기후대기과	박서진
145		영주시	기후대기과	양지순
146	충주시	기후에너지과	임정하	
147	제천시	자연환경과	안우식	
148	제천시	자연환경과	안우식	
149	진천군	환경에너지과	유택상	
150	괴산군	환경과	김현태	
151	단양군	환경과	김예원	
152	충남	본청	탄소중립정책과	박성훈
153		본청	대기환경과	최재호
154		충남연구원		차정우
155		충남연구원		최영남
156		단국대학교		양은경
157	공주시	환경보호과		유지혜
158	아산시	기후변화대책과		명호림
159	아산시	기후변화대책과		안지환
160	서천군	환경보호과		곽민호

교육참석인정알림(강원도 에너지과-6285호)

교육참석일시(23.10.17.(화) 14:00~17:00

<그림 3.1> 지자체 적응역량강화

제2차 원주시 기후위기 적응대책 세부시행계획(2019~2023)
이행점검보고서(5차, 2023년도)

- * 인 쇄 _ 2024년 4월
- * 발 행 _ 2024년 4월
- * 발 행 인 _ 원주시장
- * 발 행 처 _ 원주시
- * 대행기관 _ 한국기후변화연구원
- * 주 소 _ 26384 강원도 원주시 시청로 1
- * 홈페이지 _ www.wonju.go.kr
